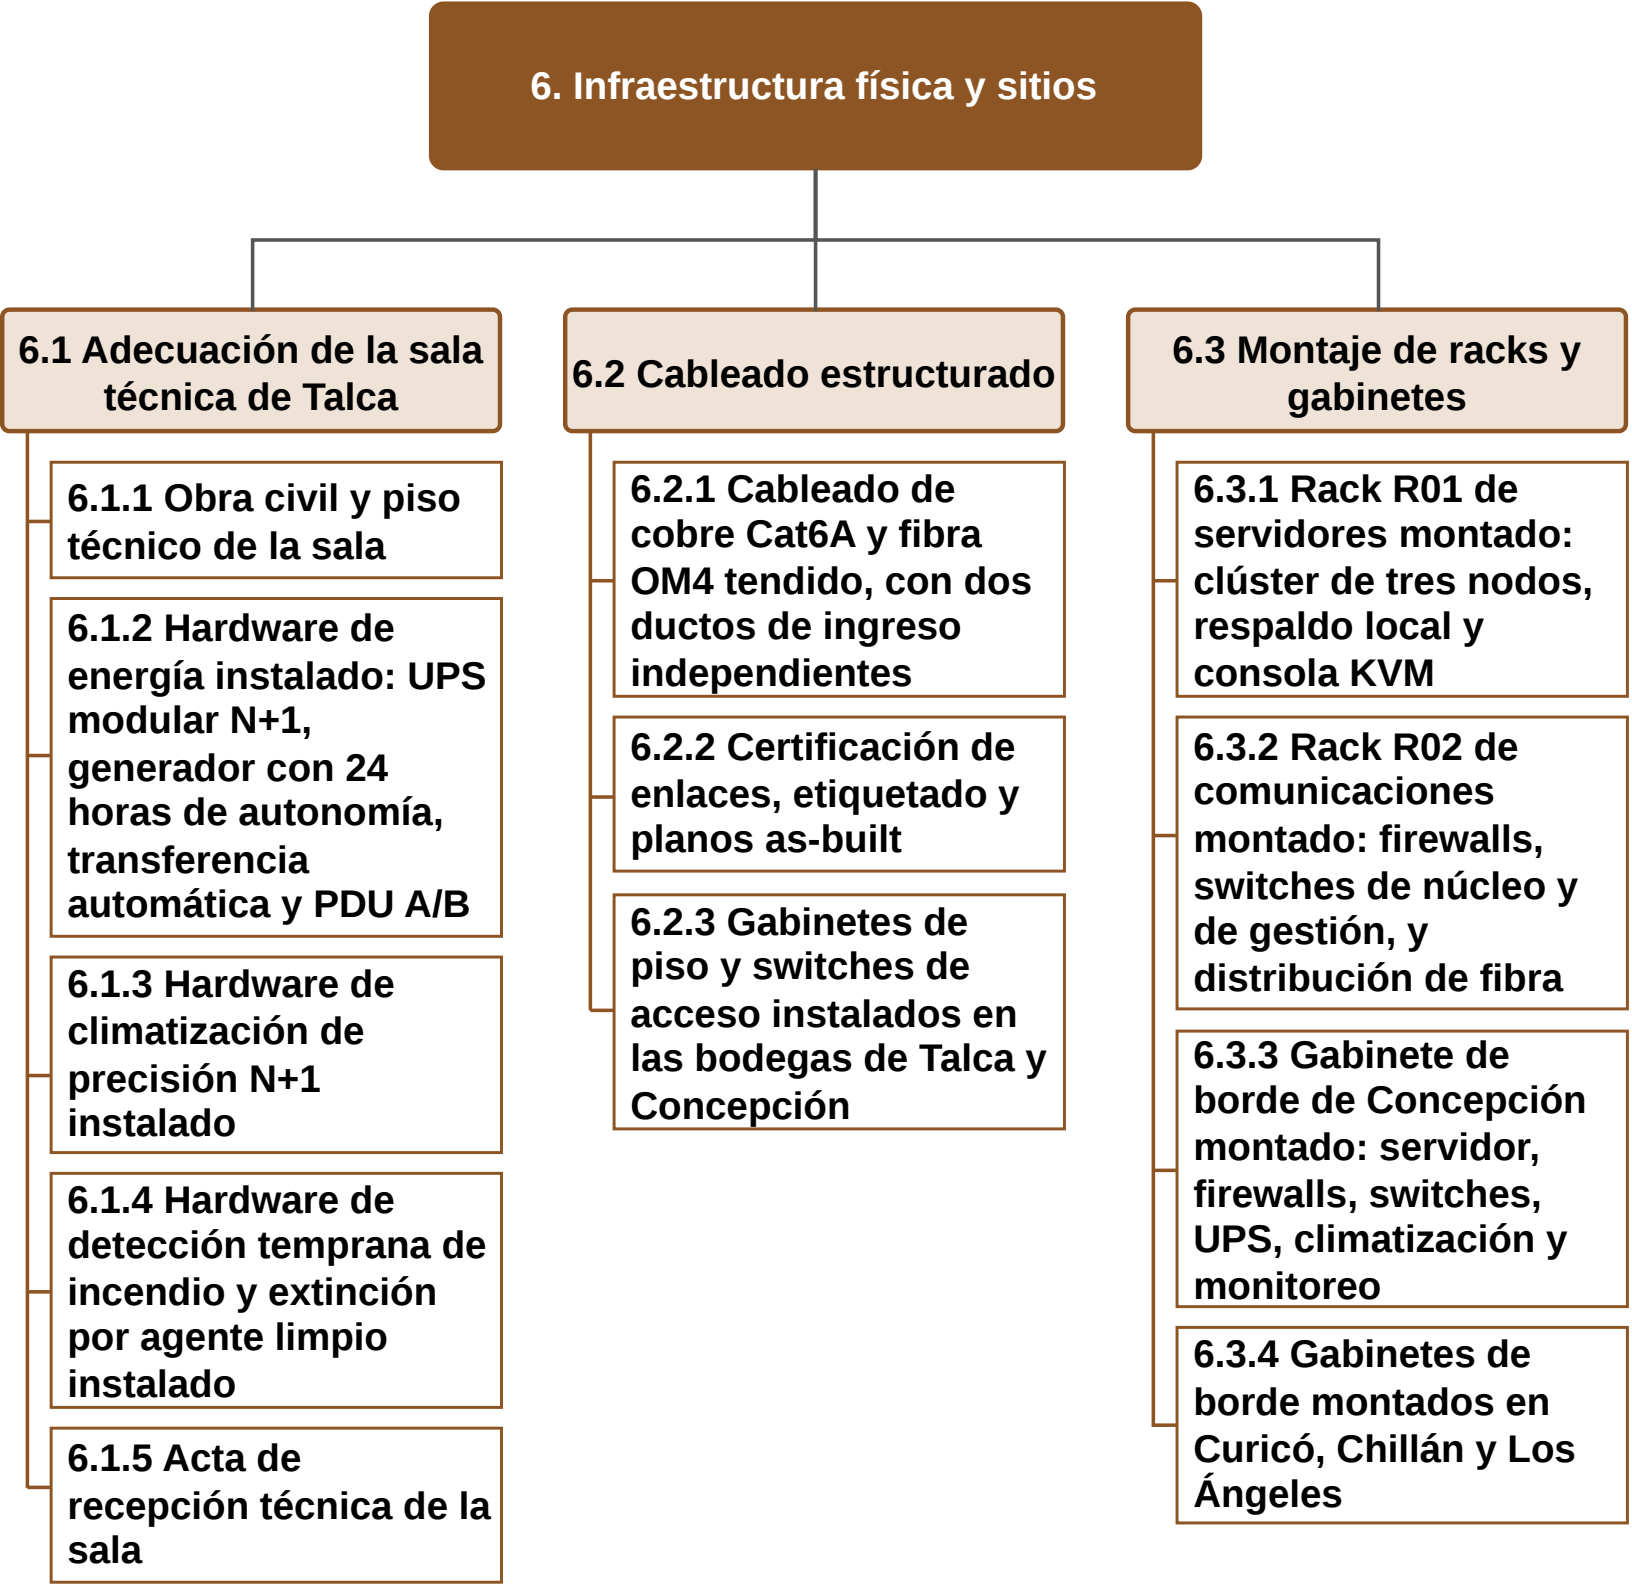
6. Infraestructura física y sitios
6.1 Adecuación de la sala técnica de Talca
6.1.1 Obra civil y piso técnico de la sala
6.1.2 Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B
6.1.3 Hardware de climatización de precisión N+1 instalado
6.1.4 Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado
6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala
6.2 Cableado estructurado
6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes
6.2.2 Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built
6.2.3 Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción
6.3 Montaje de racks y gabinetes
6.3.1 Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local y consola KVM
6.3.2 Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra
6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidor, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo
6.3.4 Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles
