LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 08 — Plan de riesgos

Subdocumento 08 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Introducción a la gestión de riesgos 5

8.1 Plan de riesgos 5

8.1.1 Enfoque y ciclo 6

8.1.2 Roles y autoridad 6

8.1.3 Escalas previas al análisis 7

8.1.4 Registro y cierre 9

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos 9

8.2.1 RBS y análisis separados 9

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos 12

8.2.3 Análisis cuantitativo 13

8.3 Plan de Acción a Riesgos 14

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico 14

8.3.2 Reservas y cronograma 15

8.3.3 Factibilidad y aceptación 16

Referencias 18

Declaración de uso de IA 18

Lista de tablas

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: LafroX (2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6), LafroX (2026-a, Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16). 6

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto 7

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto 8

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia; criterio registrado para el proyecto 9

Tabla 8.4 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 33 riesgos; criterios del procedimiento de análisis. 12

Tabla 8.5 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento. 13

Tabla 8.6 Lectura y estado de las reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación de 8.2 y supuesto heredado sujeto a validación. 15

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA 19

Lista de figuras

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 33 riesgos. Fuente: elaboración propia. 10

Introducción a la gestión de riesgos

Este subdocumento establece cómo LafroX gestionará los riesgos que podrían comprometer la ejecución y la operación de la solución propuesta para Distribuidora Puelche S.A. Su análisis parte de las necesidades de trazabilidad sanitaria, confiabilidad de las entregas y control de la información descritas en el Subdocumento 2, y considera cómo los eventos inciertos pueden afectar el alcance y los criterios de aceptación definidos en el Subdocumento 3. Así, las decisiones de arquitectura e integración del Subdocumento 4 se examinan frente a posibles interrupciones de conectividad, fallas de servicios externos o incidentes de seguridad, mientras que el modelo y la gestión de datos del Subdocumento 5 permiten reconocer la exposición asociada a antecedentes incompletos, diferencias de inventario y dificultades de migración que podrían afectar la trazabilidad o impedir una puesta en marcha aceptable. Estas condiciones también dependen de las personas y de la coordinación del proyecto: la organización presentada en el Subdocumento 1 proporciona la base para asignar responsabilidades, y los mecanismos de gobierno del Subdocumento 6 encauzan las decisiones y el escalamiento. A su vez, la EDT, las dependencias y las olas de implantación del Subdocumento 7 permiten situar los riesgos en el trabajo previsto, considerando la disponibilidad de equipos, la participación de la contraparte y la adopción de los usuarios, así como sus posibles efectos sobre los hitos y la continuidad operacional. Para abordar estas relaciones, la sección 8.1 define el ciclo de gestión, los roles, las escalas de valoración y las reglas de registro y cierre; la sección 8.2 organiza los riesgos mediante la RBS y desarrolla su análisis cualitativo y la estimación cuantitativa del esfuerzo adicional; y la sección 8.3 plantea las respuestas, la gestión de reservas y las condiciones de factibilidad y aceptación. El desarrollo se complementa con el Anexo 8.A, que detalla las respuestas propuestas, y el Anexo 8.B, que presenta las estimaciones de esfuerzo y sus valores esperados. El Formulario T-16 reúne el registro de riesgos, sus valoraciones, disparadores y responsables propuestos, y conserva los identificadores que permiten seguir cada riesgo entre el cuerpo del subdocumento y los anexos. Esta articulación vincula el análisis con las decisiones del proyecto y facilita su seguimiento, sin dar por implementadas las respuestas ni por comprobada su eficacia.

8.1 Plan de riesgos

Esta sección define cómo se gestionan los riesgos durante los 56 meses: el ciclo y sus instancias, los roles y su autoridad, las escalas con que se analizan y las reglas de registro y cierre.



8.1.1 Enfoque y ciclo

El registro vivo sigue identificación, análisis, respuesta y seguimiento conforme a la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), que exige el RT-19.04 de las Bases Técnicas Transversales (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Cada entrada distingue causa, evento incierto y consecuencia, sin convertir una inconsistencia observada en riesgo futuro. Los problemas y dependencias actuales se distinguen de los riesgos futuros y se registran como asuntos de seguimiento.

JP mantiene el registro único. Los líderes identifican riesgos al revisar interfaces, pruebas, capacidad y despliegues; verifican disparadores semanalmente y ante cada cambio. El Comité de Proyecto quincenal revisa todos los riesgos abiertos, responsables, plazos y evidencia. Los comités Ejecutivo y de Arquitectura mensuales deciden escalamiento y cambios de sus ámbitos, y desde el mes 13 el Comité de Operación mensual revisa los riesgos de servicio: niveles de atención, incidentes, capacidad y continuidad (LafroX, 2026c, Subdocumento 6, §6.1.6). Una amenaza a continuidad, seguridad o hito se escala inmediatamente. Marcha blanca exige seguimiento diario; operación mantiene vigilancia diaria de incidentes y colas y revisión en comités. En cada comité se compara la reserva restante con el riesgo remanente (análisis de reserva), y al cierre de cada etapa, en el H5 y el H10, una auditoría de riesgos comprueba que el proceso funciona (Project Management Institute [PMI], 2017, §11.7, pp. 456–457). El Comité Ejecutivo recibe cada mes un extracto con los diez riesgos de mayor exposición; el registro completo queda en el repositorio del proyecto.

8.1.2 Roles y autoridad

La Tabla 8.1 distingue al responsable del riesgo, la familia de esfuerzo y su vigencia. Los responsables dirigen equipos; no ejecutan solos las HH. Las familias del T-15 se conservan al relevar liderazgo.

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: LafroX (2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6), LafroX (2026-a, Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16).

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
JP	Alex Aravena	Alex Aravena, dirección de contrato	Registro/escalamiento
ARQ	Bastián Trejo	Trejo, Comité Arquitectura	Diseño/frontera DR
SEG	Álvaro Catalán	Álvaro Catalán	Seguridad/privacidad
DAT	Leandro Chamorro	Guillermo Castillo; equipo DAT	Miño/Calidad: parámetros

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
DES	Tomás Pérez	Guillermo Castillo; equipo DES	CAL: verifica cambios
CAL	Maximiliano Miño	Maximiliano Miño	Evidencia/eficacia
SRE	Guillermo Castillo	Guillermo Castillo	Capacidad/continuidad
IMP	Patricio Henríquez	Guillermo Castillo; equipo IMP	CAL: usuarios; SEG: privacidad

Las responsabilidades de DAT e IMP se transfieren al frente F8 de Operación, como establece el Subdocumento 13 (LafroX, 2026-a). Para que no dependan de una sola persona, desde el mes 22 Bastián Trejo, que sigue en el Comité de Arquitectura, es suplente de Guillermo Castillo en DAT y DES, y Maximiliano Miño lo es en IMP; ambos continúan hasta el mes 56 (LafroX, 2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6; LafroX, 2026-a, Subdocumento 13, transferencia desde el mes 22). Las decisiones sanitarias requieren aprobación de Calidad y las de privacidad, de Seguridad. La Contraparte Técnica acepta con acta; Operaciones autoriza cortes y Calidad del CLIENTE decide sobre los aspectos sanitarios. La agenda de decisiones se fija en mes 1 y se sigue en el registro. Los cambios físicos siguen el gobierno de arquitectura.

8.1.3 Escalas previas al análisis

Para poder realizar un buen análisis de riegos, debemos de definir la probabilidad (P), el impacto (I) y la prioridad (P x I).

La probabilidad cualitativa (P) expresa el juicio ordinal sobre la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se asigna en una escala de **1 a 5** mediante las bandas de ponderación cualitativa q de la tabla 8.2. Estas bandas no se aplican a p_0, la estimación inicial porcentual de ocurrencia usada en el análisis cuantitativo de 8.2.3 para calcular el valor esperado en HH.

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto

Valor	Banda cualitativa (q)	Descripción	Criterio cualitativo
1	$1\,\% \le q \le 10\,\%$	Muy baja	Poco probable que ocurra; condiciones excepcionales

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

Valor	Banda cualitativa (q)	Descripción	Criterio cualitativo
2	$11\,\% \le q \le 30\,\%$	Baja	Puede ocurrir en casos aislados
3	$31\,\% \le q \le 50\,\%$	Media	Podría ocurrir algunas veces durante el proyecto
4	$51\,\% \le q \le 70\,\%$	Alta	Ocurrirá con frecuencia si no se mitiga
5	$q \ge 70\,\%$	Muy alta	Casi seguro de que ocurra

Por otro lado, el impacto (I) representa el nivel de afectación que tendria el riesgo si llegara a materializarse. Se evalúa también en una escala de **1 a 5**, donde 1 representa un impacto insignificante y 5 un impacto muy alto.

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto

Valor	Descripción	Criterio cualitativo
1	Insignificante	Impacto imperceptible en el proyecto
2	Menor	Afectación leve, fácil de controlar
3	Moderado	Impacto parcial en entregables o plazos
4	Alto	Afecta hitos principales o desempeño general
5	Muy alto	Compromete el éxito total del proyecto

La ponderación decimal cualitativa de probabilidad e impacto produce la exposición $q_P \times q_I$. Las escalas y bandas son definiciones del proyecto contextualizadas para este registro; no son umbrales numéricos prescritos por Project Management Institute (PMI, 2017, cap. 11, §11.3, Tabla 11-1, p. 407), que ofrece un ejemplo y no prescribe las bandas numéricas específicas de este proyecto. La banda cualitativa de probabilidad presenta un solapamiento en 70 %, que se conserva sin reclasificar riesgos.



Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia; criterio registrado para el proyecto

Exposición decimal	Zona registrada
$q_P \times q_I < 0{,}08$	Baja
$0{,}08 \le q_P \times q_I < 0{,}20$	Media
$0{,}20 \le q_P \times q_I < 0{,}40$	Alta
$q_P \times q_I \ge 0{,}40$	Crítica

La zona de prioridad de cada riesgo es la zona registrada y adoptada del registro vigente; no se infiere a partir de umbrales sobre la exposición decimal. Los niveles ordinales de P e I se conservan junto con sus ponderaciones decimales. p_0 y las HH permanecen separados.

8.1.4 Registro y cierre

El responsable actualiza fuente, estado, disparador, tratamiento, consumo de HH y evidencia. Estados: identificado, en tratamiento, control verificado o materializado. Materializar el evento abre un problema y conserva su ID. CAL verifica cierre técnico; JP registra la decisión; la aceptación contractual corresponde al CLIENTE. La puntuación residual efectiva exige eficacia comprobada; C.5 sólo compara hipótesis. Verificar un control no libera reserva automáticamente. Ninguna aceptación de riesgo exime requisitos obligatorios.

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos con una RBS y los analiza cualitativamente mediante la exposición decimal ($q_P \times q_I$), junto con los niveles ordinales de P e I y la zona registrada para cada riesgo, y cuantitativamente mediante el valor esperado de cada riesgo en horas-hombre. No se presentan resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento.

8.2.1 RBS y análisis separados

La estructura de desglose de riesgos (EDR o RBS, por sus siglas en inglés) organiza los **33 riesgos** representados en la Figura 8.1 en seis ramas, según su fuente predominante: **Solución y tecnología** (5), **Integración y legado** (7), **Operación del cliente** (13), **Personas y adopción** (5), **Contrato y licitación** (1) y **Regulatorio y externo** (2). La figura agrupa los riesgos por origen principal y conserva para cada uno su identificador, descripción y zona registrada. La clasificación facilita localizar y revisar los riesgos; no determina por sí sola su prioridad ni limita las áreas del proyecto que puedan verse afectadas.

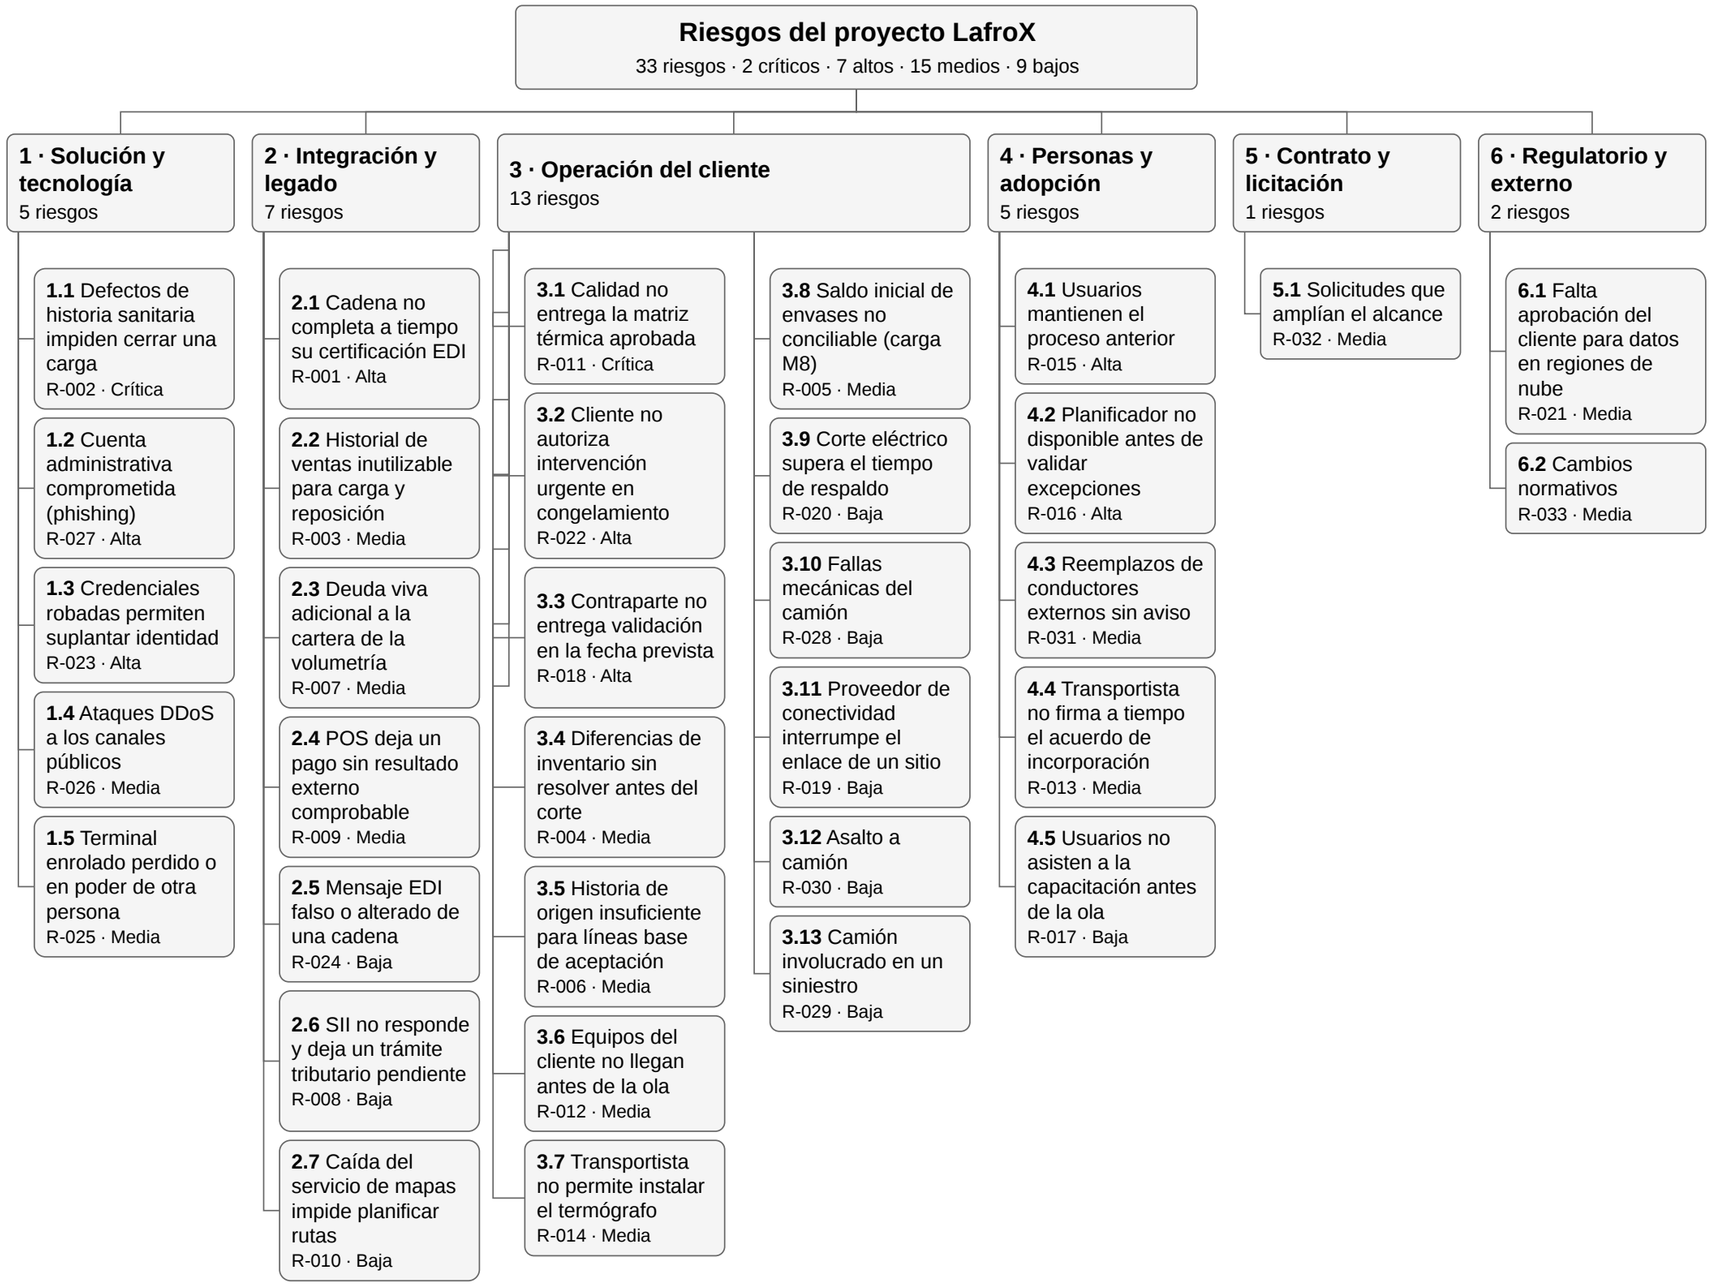


Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 33 riesgos. Fuente: elaboración propia.

Solución y tecnología reúne riesgos propios del producto, su seguridad y su funcionamiento: defectos de historia sanitaria que impiden cerrar una carga (R-002), cuentas comprometidas o credenciales robadas (R-027 y R-023), ataques DDoS a canales públicos (R-026) y terminales enrolados perdidos o en poder de terceros (R-025). Esta rama contiene cinco riesgos.

Integración y legado comprende fallas o dependencias de servicios, plataformas y procesos conectados: certificación EDI incompleta de una cadena (R-001), historial de ventas inutilizable (R-003), deuda viva adicional a la volumetría (R-007), pagos sin resultado comprobable (R-009), mensajes EDI falsos o alterados (R-024), indisponibilidad del SII (R-008) y caída del servicio de mapas (R-010). Agrupa siete riesgos.

Operación del cliente concentra las condiciones de ejecución cotidiana y preparación del cliente: calidad de la matriz térmica y autorización de intervenciones urgentes (R-011 y R-022), validaciones y diferencias de inventario (R-018 y R-004), suficiencia de la historia de origen para aceptación (R-006), disponibilidad de equipos e instalación de termógrafos (R-012 y R-014), conciliación de envases (R-005), respaldo eléctrico y conectividad de sitios (R-020 y R-019), y eventos de transporte como asaltos o siniestros (R-030 y R-029), además de fallas mecánicas (R-028). Es la rama más numerosa, con trece riesgos; el tamaño de la rama refleja la composición de este registro, no un nivel mayor de prioridad.

Personas y adopción agrupa riesgos asociados a la participación y disponibilidad de usuarios, planificadores, conductores y transportistas: continuidad de procesos anteriores (R-015), disponibilidad del planificador para validar excepciones (R-016), reemplazos de conductores externos sin aviso (R-031), firma tardía del acuerdo de incorporación (R-013) y ausencia de usuarios a la capacitación (R-017). La rama contiene cinco riesgos.

Contrato y licitación contiene un riesgo: solicitudes que amplían el alcance (R-032). **Regulatorio y externo** reúne la falta de aprobación para alojar datos en regiones de nube (R-021) y posibles cambios normativos (R-033). Estas dos ramas contienen uno y dos riesgos, respectivamente.

La RBS es una clasificación por fuente predominante, no una evaluación completa de cada riesgo. De acuerdo con el procedimiento de análisis, para cada registro se distingue la condición que origina el riesgo, el evento posible y el efecto sobre los objetivos; luego se conservan su ID y su categoría para mantener la trazabilidad. Un riesgo puede afectar varias áreas, pero se presenta una sola vez en la rama principal para evitar duplicarlo. La probabilidad, el impacto, la exposición y la zona se analizan por separado y no se deducen de la rama RBS.

Esta figura y su explicación corresponden a los 33 riesgos que muestra la nueva RBS. El procedimiento del análisis cualitativo y cuantitativo documenta una versión distinta de 34 registros R-001–R-034 y señala que se mantuvo la clasificación RBS de origen; por ello, sus cantidades, códigos y resultados no se trasladan automáticamente a esta clasificación. Las valoraciones de esta sección se deben vincular a los registros que correspondan a la versión de 33 riesgos.

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo asigna a probabilidad e impacto niveles ordinales de 1 a 5 y sus ponderaciones decimales (q_P y q_I). La exposición se calcula como $q_P \times q_I$ y sirve para priorizar; no es un porcentaje de probabilidad ni una estimación de pérdida. La probabilidad porcentual estimada para el análisis cuantitativo (p_0) se mantiene separada de q_P, como establece el procedimiento. La Tabla 8.4 presenta los diez riesgos de mayor exposición entre los 33, ordenados de mayor a menor producto y, en caso de empate, por ID ascendente. La zona se transcribe del análisis cualitativo; no se utiliza como sustituto del producto ni se confunde con el impacto en HH.

Tabla 8.4 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 33 riesgos; criterios del procedimiento de análisis.

ID	q_P	q_I	Exposición ($q_P \times q_I$)	Zona registrada
R-002	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-011	0,50	0,80	0,40	Crítica
R-015	0,70	0,40	0,28	Alta
R-016	0,30	0,80	0,24	Alta
R-022	0,30	0,80	0,24	Alta
R-023	0,30	0,80	0,24	Alta
R-027	0,30	0,80	0,24	Alta
R-001	0,50	0,40	0,20	Alta
R-018	0,50	0,40	0,20	Alta
R-004	0,70	0,20	0,14	Media

R-002 y R-011 encabezan la selección con exposiciones de 0,56 y 0,40, ambas en zona Crítica. R-015 sigue con 0,28; cuatro riesgos empatan en 0,24, y R-001 y R-018 empatan en 0,20. Para completar diez filas, se incluye R-004, con 0,14; en empates se aplica ID ascendente. Los factores y la exposición son ponderaciones para priorizar, no porcentajes de ocurrencia ni horas-hombre. Las probabilidades porcentuales y los valores esperados se tratan por separado en el análisis cuantitativo.



8.2.3 Análisis cuantitativo

El análisis estima las horas-hombre (HH) adicionales atribuibles a cada riesgo, separando el trabajo extraordinario del trabajo ordinario del proyecto. Para cada perfil y riesgo se estimaron tres valores por episodio: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Las horas de los dos perfiles se suman dentro de cada escenario; cuando el modelo supone episodios repetidos, se multiplica por el número de episodios condicionado a que ocurra al menos uno. Así se obtienen las HH condicionales acumuladas O_i, M_i y P_i.

El valor central condicional se calcula con PERT: $H_i^{\text{cond}} = (O_i + 4M_i + P_i)/6$. El escenario más probable recibe cuatro veces el peso de cada extremo. Luego se calcula el valor esperado de esfuerzo $VE_i = p_{0,i} \times H_i^{\text{cond}}$, donde p_0 es la probabilidad estimada de al menos un episodio en toda la ventana del riesgo. La Tabla 8.5 ordena por VE descendente los diez riesgos de mayor esfuerzo esperado entre los 33 riesgos; los valores O/M/P muestran el esfuerzo condicional, no la probabilidad. Se desempata por ID ascendente. Las estimaciones son supuestos de planificación, no frecuencias históricas, compromisos de horas ni resultados de simulación.

Tabla 8.5 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento.

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	O (HH)	M (HH)	P (HH)	VE (HH)
R-002	Defectos de historia sanitaria de origen impiden cerrar una carga	60 %	72,0	184,0	360,0	116,80
R-015	Usuarios mantienen el proceso anterior sin registrar en la solución	55 %	48,0	120,0	240,0	70,40
R-003	Historial de ventas no utilizable para carga y reposición	50 %	48,0	120,0	240,0	64,00
R-004	Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	55 %	40,0	104,0	208,0	60,87
R-006	Historia de origen insuficiente para las líneas base de aceptación	55 %	40,0	96,0	184,0	55,73
R-005	Saldo inicial de envases no conciliable para la carga de M8	50 %	40,0	88,0	184,0	48,00

continúa en la página siguiente



Tabla 8.5 — continuación

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	O (HH)	M (HH)	P (HH)	VE (HH)
R-001	Cadena comercial no completa a tiempo la certificación EDI	45 %	40,0	96,0	200,0	46,80
R-018	Contraparte no entrega una validación en la fecha prevista	45 %	32,0	80,0	160,0	38,40
R-032	Solicitudes que amplían el alcance (dos evaluaciones)	35 %	32,0	80,0	160,0	29,87
R-007	Deuda viva adicional a la cartera incluida en la volumetría	35 %	24,0	72,0	176,0	28,47

Los diez riesgos aportan aproximadamente **559,33 HH de valor esperado**, el 67,8 % de las 825,34 HH esperadas para los 33 riesgos, bajo las mismas probabilidades y supuestos. El valor central PERT de cada riesgo representa esfuerzo condicional si ocurre; VE pondera ese esfuerzo por su probabilidad y no equivale a una asignación cierta de trabajo. Las HH no se convierten directamente en días de atraso: el efecto calendario depende de secuencia, concurrencia, disponibilidad de perfiles y holguras. No se presenta simulación Monte Carlo ni percentil de confianza.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Este plan establece respuestas propuestas para los 33 riesgos del registro vigente (R-001–R-033), relaciona su prioridad con los resultados de 8.2 y fija cómo gobernar la reserva de esfuerzo y verificar la factibilidad. Las respuestas de la matriz del Anexo 8.A son propuestas de tratamiento derivadas del evento, los disparadores y los responsables consignados en T-16; no certifican controles ya implementados ni eficacia residual. Los responsables son los dueños propuestos del riesgo y coordinan a las áreas pertinentes; no se presume que ejecuten individualmente todo el esfuerzo.

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico

La selección debe privilegiar evitar pérdida de trazabilidad o aceptación sin evidencia, proteger la continuidad y resolver temprano las dependencias externas o del CLIENTE. En la programación detallada se estimarán las HH de cada acción, se identificarán controles compartidos para prevenir doble conteo y se comparará el esfuerzo de respuesta con la reducción de



exposición que pueda demostrarse. El valor esperado de riesgo no es el costo de una respuesta. No hay antecedentes suficientes para asignar costo, duración, fecha de ejecución ni eficacia a estas propuestas; esos campos deberán ser estimados y aprobados por sus responsables antes de incorporarlos a la línea base. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

La eficacia no se presume: CAL verifica resultados y evidencia; JP registra decisión, cambio aprobado, esfuerzo consumido y remanente. Sólo después de verificar el control podrá reevaluarse el riesgo residual. Un control compartido se registra una sola vez en el plan de trabajo, aunque atienda varios riesgos.

8.3.2 Reservas y cronograma

El análisis cuantitativo de 8.2 estima para los 33 registros un total de **825,34 HH esperadas**, calculadas como $\sum_i p_{0,i} H_i^{\text{cond}}$, donde H_i^{cond} es el esfuerzo condicional estimado mediante tres valores y PERT. Los diez mayores riesgos suman **559,33 HH** (aproximadamente 67,8 %); son un subconjunto del total y no se suman nuevamente. Estos valores expresan exposición de esfuerzo del portafolio, no esfuerzo cierto, capacidad disponible, presupuesto aprobado ni resultado de simulación. Tampoco permiten derivar directamente días de atraso: para ello se requiere modelar secuencia, concurrencia, perfiles, holguras y ruta crítica.

Tabla 8.6 Lectura y estado de las reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación de 8.2 y supuesto heredado sujeto a validación.

Concepto	HH	Interpretación y tratamiento
Valor esperado de los 33 riesgos	825,34	Estimación agregada de exposición en HH; no se afirma que esté asignada o financiada como reserva disponible. Distribuirla entre períodos, perfiles y paquetes requiere estimar las respuestas y nivelar la capacidad.
Diez mayores valores esperados	559,33	Subconjunto de las 825,34 HH (67,8 %); indicador de focalización, no una reserva adicional.
Reserva de gestión mencionada en una versión previa	1.600	Supuesto heredado: no se ha verificado aquí su fundamento, aprobación ni disponibilidad. Mantenerla separada y no sumar, comprometer ni cargar costos contra ella hasta reconciliar su autorización y gobernanza.

La versión previa consignaba 2.058,480 HH para 45 riesgos y una reserva de gestión de 1.600 HH. Ese registro no corresponde al universo vigente R-001–R-033; por tanto, se retira el total de 45 riesgos como cifra adoptada en esta sección. La reserva de gestión sólo podrá tratarse como disponible tras confirmación del Comité Ejecutivo y registro de fuente, autorización,



saldo y reglas de uso. Las contingencias de respuesta por riesgo, sus HH O/M/P, responsables de ejecución y fechas siguen pendientes de estimación y aprobación; la matriz del Anexo 8.A no crea compromisos de capacidad ni reemplaza esa planificación.

No se cuenta con una holgura calendario verificable por hito que pueda atribuirse a estos riesgos. Debe determinarse al reconciliar la línea base vigente del T-15 con las fechas contractuales, dependencias, nivelación de recursos y ruta crítica. La duración exigida de al menos las cuatro semanas finales de evidencia en cada marcha blanca no es holgura consumible. Las actividades en paralelo de las etapas y el paso a producción no deben desplazar hitos contractuales (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.3).

8.3.3 Factibilidad y aceptación

La factibilidad de la respuesta depende de recursos y decisiones compartidas. Antes de comprometer cada acción se debe confirmar productividad/dotación, calendario y secuencia diaria, responsable con autoridad, dependencia externa, esfuerzo de implementación y evidencia de eficacia. El T-15 deberá nivelar los frentes que coinciden entre los meses 13–15 y 19–20, proteger la operación de Etapa 1 durante la salida de Etapa 2 y cubrir ambos alcances desde el inicio de operación (Bases Administrativas, art. 17.2). Sin esa conciliación no se afirma que la reserva estimada quepa en la capacidad propuesta ni que exista atraso o capacidad adicional cuantificada.

La aceptación no se basa sólo en completar tareas: cada hito se cumple con acta de la Contraparte Técnica; cada entregable incluye artefacto, evidencia objetiva de verificación, trazabilidad a requisitos y registro de observaciones resueltas (Bases Administrativas, arts. 18.1–18.2). El CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar y LafroX de diez días hábiles para subsanar; una segunda presentación observada por la misma naturaleza se considera atraso imputable (art. 18.3). La aceptación no libera responsabilidad por defectos posteriores (art. 18.4). En cada marcha blanca, las seis condiciones del artículo 17.3 son acumulativas: no tener incidentes críticos/altos atribuibles abiertos; alcanzar el volumen real comprometido durante las cuatro últimas semanas; sostener disponibilidad y tiempos de respuesta comprometidos; no tener diferencias de conciliación inexplicadas; contar con personal del CLIENTE capacitado y certificado; y obtener el acta de aceptación. Si no se cumplen al cierre, la marcha blanca debe extenderse a costo del adjudicatario, sin cargo adicional al CLIENTE ni desplazamiento de fases posteriores, sin perjuicio de las multas contractuales. RT-20.04 exige definir indicadores diarios y umbrales de avance, y RT-20.02 exige una salida gradual y reversible (Bases Técnicas Transversales).

Para continuidad, el requisito RT-07.04 fija RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para servicios críticos, salvo exigencia superior del caso; cumplirlo requiere prueba y evidencia, no sólo diseño. La propuesta de recuperación debe demostrar qué copia remota sobrevive ante pérdida del sitio y dónde se satisface el RPO, además de medir RTO/RPO en la conmutación. Destruir el sitio que alberga el NAS puede dejar únicamente la última copia remota consistente; respaldos o retenciones locales no prueban por sí mismos un RPO de 15 minutos. Los escenarios de pérdida simultánea de enlaces y sitio, recuperación de conectividad,



conciliación de datos y continuidad de los 96 despachos deben validarse en AL-DR-01 y con responsables antes de aceptar el corte. Los 85 minutos de diseño para retiro sanitario tampoco constituyen un ensayo aprobado: debe demostrarse la identificación de clientes afectados con evidencia en menos de dos horas, según las condiciones operativas registradas en el plan.

La suspensión del proveedor de lácteos entre marzo y septiembre de 2026 es un antecedente ocurrido y se gestiona como dependencia/asunto, no como riesgo futuro. Corresponde obtener con el CLIENTE y el proveedor evidencia de restitución de la trazabilidad antes de depender de ella para aceptar la etapa correspondiente; la fecha y evidencia de restitución no se presumen. En general, cada condición pendiente debe tener responsable, hito, evidencia requerida y decisión documentada. Hasta que existan pruebas satisfactorias y actas exigidas, se mantiene como pendiente la factibilidad de las respuestas afectadas y no se declara aceptado el hito.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

LafroX. (2026a). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa* (Formulario T-7), Tabla 1.6.

LafroX. (2026a). *Subdocumento 13: Innovaciones*, transferencia operativa desde el mes 22.

LafroX. (2026). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*, §§4.1.4.4, 4.2.5.1 y 4.3.2.4; Anexos 4-G, 4-I y 4-W.

LafroX. (2026). *Subdocumento 5: Modelo y gestión de datos*.

LafroX. (2026). *Subdocumento 3: Introducción al alcance de la solución*, Anexo 3.H, consulta V-13.

LafroX. (2026). *Subdocumento 6: Metodología de gestión de proyectos y desarrollo de software*.

LafroX. (2026). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*.

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.).

Declaración de uso de IA

La declaración de uso de IA responde al artículo 13.5 de las Bases Administrativas y al Formulario A-6. La Tabla 8.IA.1 indica, para cada sección, qué herramienta se usó, con qué finalidad y qué revisó Maximiliano Miño, Líder de Calidad, antes de dar esa parte por cerrada.



Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Gentle-Shell y ChatGPT	Conexión con operación, alcance y formularios	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se lee introducción, se revisa las exigencias del contenido de introducción y se valida apropiadamente.
8.1 Plan de riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Roles, escalas, ciclo y cierre	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se realiza revisión de primera entrega de contenido de IA, al no ser lo que se espera, se realiza revisión de contenido academico para pulir y mejorar el contenido que entrega .

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.2 Identificación y Análisis de Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	RBS, exposición cualitativa y valor esperado en HH	Alto	Medio	Maximiliano Miño: Para los 2 análisis, y la RBS, confección de riesgos asociados al proyecto, una vez generado el contenido, se realiza una revisión del enunciado de los riesgos, asegurandose de que cumplan con criterios internos de LafroX, se revisan datos, se valida, se crea RBS, se valida datos como Probabilidad, Impacto y Exposición parte cualitativa, parte cuantitativa, se ve contenido academico y se realiza estmación 3 valores y se valida contenido.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.3 Plan de Acción a Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Respuestas, contingencia y gestión	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se toma datos de secciones 8.2 mas la revisión de contenido generado, se realiza una revisión de que las respuestas sean acordes y se implementan tanto en los anexos como en el subdocumento
Anexo 8.A	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer respuestas y estrategias para los riesgos, junto con un responsable para cada uno	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se revisa contenido generado, se lee y se valida consistencia con los riesgos asociados .
Anexo 8.B	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer y validar los cálculos relacionados con la estimación de tres valores	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Antes de implementarlo en el anexo, se genera un archivo que contiene los datos cuantitativos, se revisa y se implementa en la tabla de anexos.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Gentle-Shell y ChatGPT	Mejorar la redacción de las descripciones de riesgos y proponer valores de probabilidad e impacto, y estrategias o respuestas	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se crean los riesgos generados por ia, se validan (lo mismo que se realiza en sección 8.2) y se le pide a la IA que se cree la tabla.
