LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 7

Plan de Trabajo, EDT, Cronograma e Implantación

Subdocumento 7 · Formulario T-14

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

7 Introducción al Plan de trabajo 3

7.1 EDT 3

7.1.1 Criterio de descomposición 3

7.1.2 Estructura general 6

7.1.2.1 Fase 1. Inicio 6

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración 8

7.1.2.3 Fase 3. Construcción 10

7.1.2.4 Fase 4. Transición 15

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones 16

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios 17

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio 19

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte 20

7.1.2.9 Fase 9. Cierre 22

7.1.3 Cobertura del alcance 23

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables 26

7.2 Plan de trabajo 27

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias 27

7.2.2 Estimación 30

7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización 32

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20 34

7.3 Cronograma e implantación 34

7.3.1 Ruta crítica y holguras 34

7.3.2 Carta Gantt y calendario 39

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha 50

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1 54

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia 57

7.3.6 Estabilización y transferencia 58

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos 59

7.3.8 Base de planificación y recursos 61

Referencias 63

Declaración de uso de IA 63



Introducción al Plan de trabajo

Este capítulo presenta cómo LafroX ejecutará el proyecto de Distribuidora Puelche dentro del cronograma contractual obligatorio de 56 meses (BA, art. 17, pp. 12–13): qué trabajo se hace, en qué orden, con qué esfuerzo y cómo la solución entra en operación sin detener la venta, la bodega ni el reparto.

La sección 7.1 descompone el 100 % del alcance en una estructura de descomposición del trabajo (EDT) con paquetes estimables y asignables. La sección 7.2 secuencia ese trabajo y lo organiza en frentes paralelos, con especial atención a los meses 13 a 15 y 19 a 20, en que dos esfuerzos coexisten. La sección 7.3 presenta la ruta crítica, la carta Gantt con los hitos del Formulario E-25 y el plan de implantación y de marcha blanca de cada etapa.

El capítulo se apoya en otros tres capítulos de la oferta: el Capítulo 3 (LafroX, 2026k) fija el alcance de cada etapa y los criterios de olas y estabilización; el Capítulo 4 (LafroX, 2026m) define los módulos M1 a M12 y las interfaces que la EDT construye; y el Capítulo 6 (LafroX, 2026o) establece el proceso de desarrollo cuyas fases organizan la EDT y la gestión del proyecto que la controla. El detalle va en tres formularios y un archivo de anexos: el Formulario T-14 contiene la EDT completa, su diccionario y la carta Gantt; el Formulario T-15, el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo; el Formulario T-18, la implantación y la puesta en marcha controlada, con una propuesta de calendario, dotación y decisiones en su sección 6; y los Anexos 7.A a 7.F, los listados de apoyo y la preparación de riesgos.

En este capítulo, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso Logística (2026c).

7.1 EDT

La EDT es la base común del plan: el cronograma, la estimación y la asignación de responsables se construyen sobre sus paquetes, y su diccionario fija qué se entrega y cómo se acepta cada uno. Esta sección explica cómo se descompuso el trabajo, cómo queda la estructura, cómo cubre el alcance y cómo se asignan los responsables.

7.1.1 Criterio de descomposición

La EDT de Puelche se organiza en nueve fases. Las cuatro primeras son las fases del proceso de desarrollo del Capítulo 6 (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y se recorren una vez por cada etapa del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El primer recorrido produce la Etapa 1, con la trazabilidad de recepción, la bodega, la cadena de frío, la preventa,

las rutas, el reparto y la rendición, y termina con el paso a producción del mes 16. El segundo produce la Etapa 2, con el canal moderno, los portales y el costo de servir, y termina con el paso a producción del mes 21.

Las otras cinco fases agrupan el trabajo que no es desarrollo de software, pero sin el cual la solución no entra en operación: adquisiciones y contrataciones; infraestructura física y sitios; capacitación y gestión del cambio; operación y soporte durante 36 meses; y cierre.

La descomposición sigue la regla del 100 %: la suma del trabajo de los niveles inferiores reproduce el trabajo del nivel superior, sin omitir ni agregar alcance (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 161). El segundo nivel son 49 cuentas de control, puntos de gestión donde se integran el alcance, el cronograma y el esfuerzo para medir el desempeño. El nivel inferior son 227 paquetes de trabajo, cada uno con un entregable verificable, un criterio de aceptación y un único responsable (PMI, 2017, pp. 161–162). En la cuenta de las innovaciones, cada innovación agrupa sus paquetes en un cuarto nivel.

El último nivel de la EDT es el paquete de trabajo, con su entregable, su responsable y su criterio de aceptación. Fuera de la EDT, cada paquete se descompone en actividades que cumplen la regla del 8/80, entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo, y la regla del período de reporte: ninguna actividad dura más de una quincena, el período con que informa el Comité de Proyecto (PMI, 2017, pp. 183–185). Los paquetes de producto se dividen con una plantilla por clase; por ejemplo, un módulo de 960 HH se divide en 12 actividades de 80 HH, desde el análisis de sus requerimientos hasta su entrega en QA. Los 168 paquetes con entregable se programan con fecha, personas y predecesoras; sus actividades se detallan hasta el H2 y, después, por planificación gradual antes de cada fase, cuando el equipo conoce el trabajo (PMI, 2017, p. 185). Así el cronograma no fija hoy el día de una actividad que ocurrirá en 2028, y cada fase se planifica como las iteraciones del proceso RUP del Capítulo 6. El Formulario T-15, Figura 7.3, muestra los puntos de replanificación (antes del H2, el H4, el H8 y el H9). Los 59 paquetes de esfuerzo continuo, como la cobertura del NOC, las reuniones periódicas o la mentoría posterior al H12, no se descomponen en actividades distintas: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La lista de actividades y las reglas de programación están en el Formulario T-15, sección 6.

Los paquetes de la fase de Operación son paquetes de esfuerzo continuo. Cada uno cubre un servicio durante los 36 meses y se controla con entregables periódicos, como los informes mensuales de servicio, los informes de pruebas y las actualizaciones anuales, que funcionan como sus puntos de verificación.

La Tabla 7.1 muestra el tamaño de cada fase y los hitos que produce.



Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes por fase. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y el Formulario E-25.

Fase	CC	PT	Etapa	Hitos
1 Inicio	9	35	E1 y E2	H1, H8
2 Elaboración	6	20	E1 y E2	H2, H8
3 Construcción	11	79	E1 y E2	H3, H4, H5, H9, H10
4 Transición	3	11	E1 y E2	H6, H7, H11, H12
5 Adquisiciones y contrataciones	4	15	E1 y E2	Habilita H3
6 Infraestructura física y sitios	6	24	E1	Habilita H3 y H6
7 Capacitación y gestión del cambio	3	13	E1, E2 y Operación	Condición de H7 y H12
8 Operación y soporte (36 meses)	5	26	Operación	Hito mensual
9 Cierre	2	4	Meses 21 y 56	Después de H12
Total	**49**	**227**		

La construcción concentra el 35 % de los paquetes (79 de 227), porque contiene los quince desarrollos de módulos, las integraciones, la migración, las pruebas de ambas etapas y las innovaciones. Las fases 5 a 7, que no producen software, suman 52 paquetes (23 %). Ese peso muestra que, en Puelche, la compra y la instalación del equipamiento de cinco sitios, los acuerdos con diez transportistas y con el sindicato y la capacitación de una operación que no puede detenerse son trabajo planificado y controlado, no supuestos.

La Figura 7.1 resume el primer nivel de la EDT: la raíz del proyecto y sus nueve fases.





Figura 7.1 Vista del primer nivel de la EDT: raíz del proyecto y sus nueve fases. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Las fases de desarrollo (1 a 4) se recorren una vez por etapa; las fases 5 a 7 las habilitan en paralelo, y las fases 8 y 9 cubren la operación y el cierre. La figura muestra la estructura, no la secuencia temporal: el número de una fase no indica cuándo ocurre; sus fechas están en la carta Gantt de la sección 7.3.2.

7.1.2 Estructura general

Las láminas siguientes desglosan las cuentas de control y los paquetes por fase. Cada imagen se presenta inmediatamente después de su descripción. La fase 3 se divide en cinco láminas para facilitar la lectura: las dos primeras separan la base técnica de los módulos de la Etapa 1; las tres restantes muestran las cuentas 3.5 a 3.11, con una lámina adicional para ampliar los paquetes de innovación de la cuenta 3.10.

7.1.2.1 Fase 1. Inicio

La fase de Inicio define el proyecto, fija su alcance y planificación y establece cómo se gobierna y controla. Sus cuentas 1.1 a 1.5 abarcan el acta, la línea base, la planificación, los interesados y la calidad.

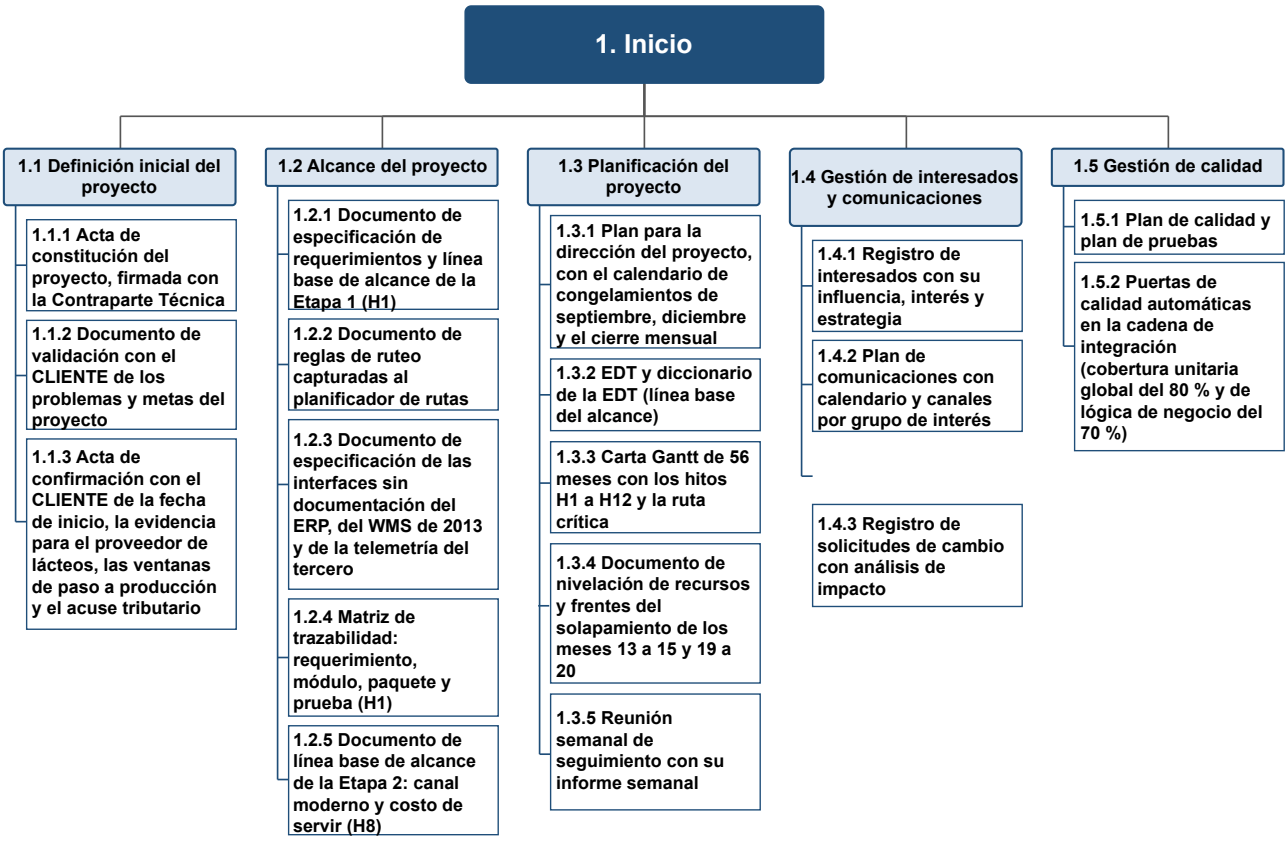


Figura 7.2 Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La segunda lámina completa Inicio con gestión de riesgos, reversibilidad, gobierno, control y cumplimiento normativo. Incluye los paquetes 1.2.2 y 1.2.3, que capturan las reglas de ruteo cuya fuente experta se jubila y las interfaces del sistema de gestión que el CLIENTE reconoce no tener documentadas; también incluye los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), el informe de valor ganado y el tablero (RT-19.06 a RT-19.09).

Alex

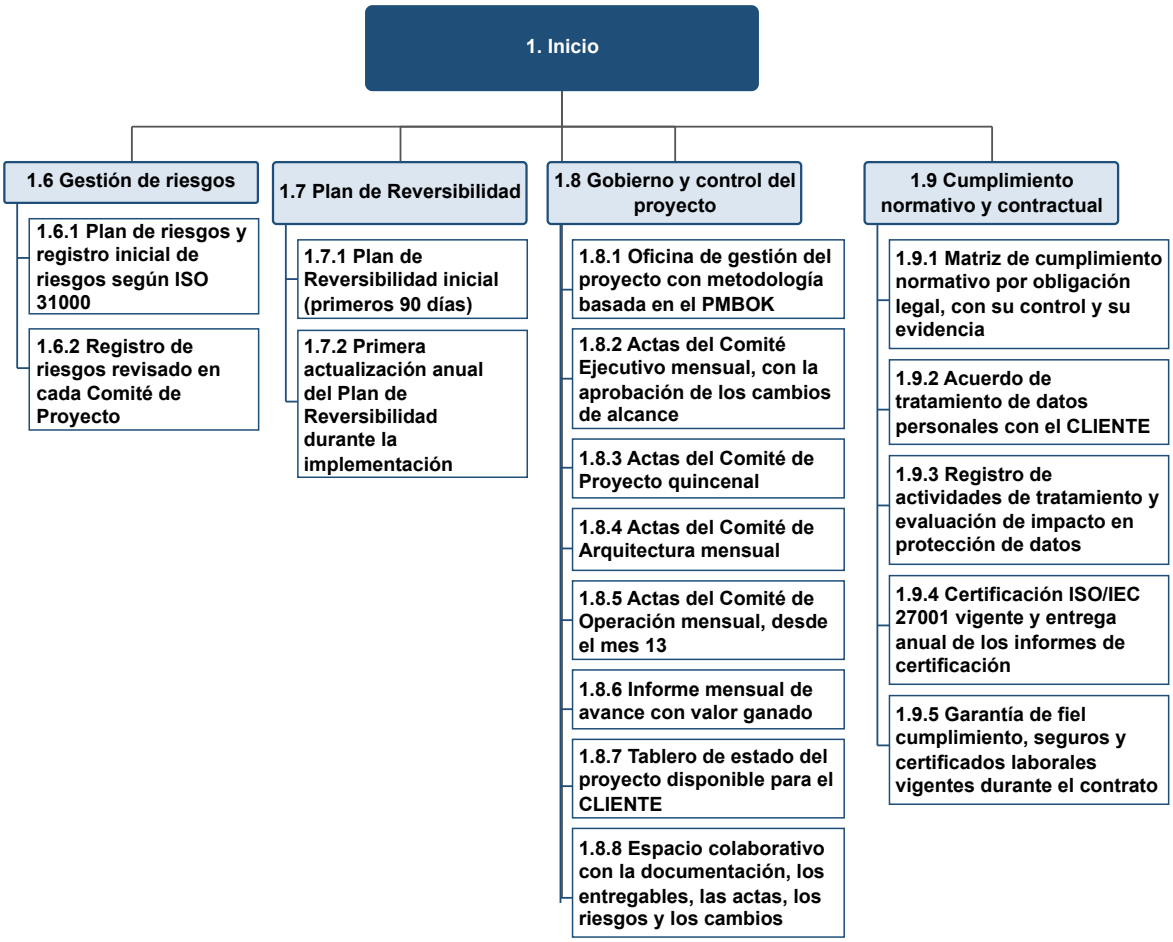


Figura 7.3 Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Estas cuentas completan Inicio: identifican los riesgos y la reversibilidad, establecen el gobierno y control del proyecto y cierran con el cumplimiento normativo y contractual.

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración

Elaboración diseña la solución antes de programar: arquitectura lógica y física, datos trazables por lote, seguridad, sala técnica de Talca, continuidad y experiencia de usuario. La aprobación de arquitectura, seguridad y modelo de datos corresponde al H2 del mes 4. La primera lámina muestra las cuentas 2.1 a 2.3.

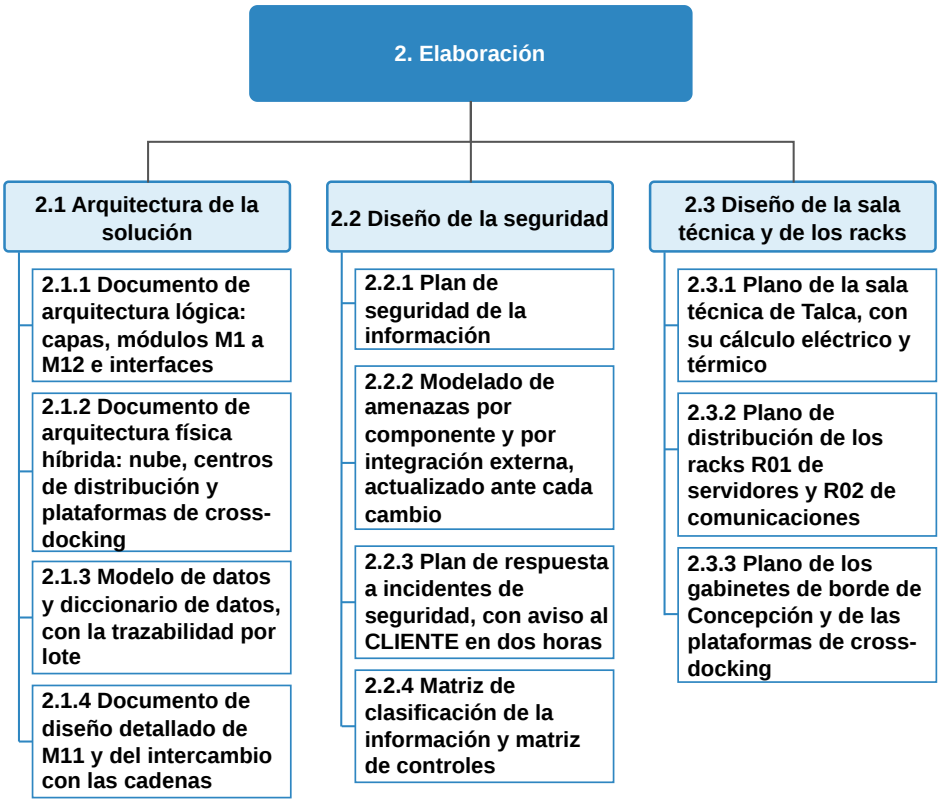


Figura 7.4 Fase 2 — Elaboración, primera parte: arquitectura, seguridad y sala técnica, cuentas 2.1 a 2.3. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La continuación cubre la validación de diseños, continuidad del negocio y experiencia de usuario (cuentas 2.4 a 2.6), incluidos los procedimientos manuales y la recuperación ante desastres.

Alex

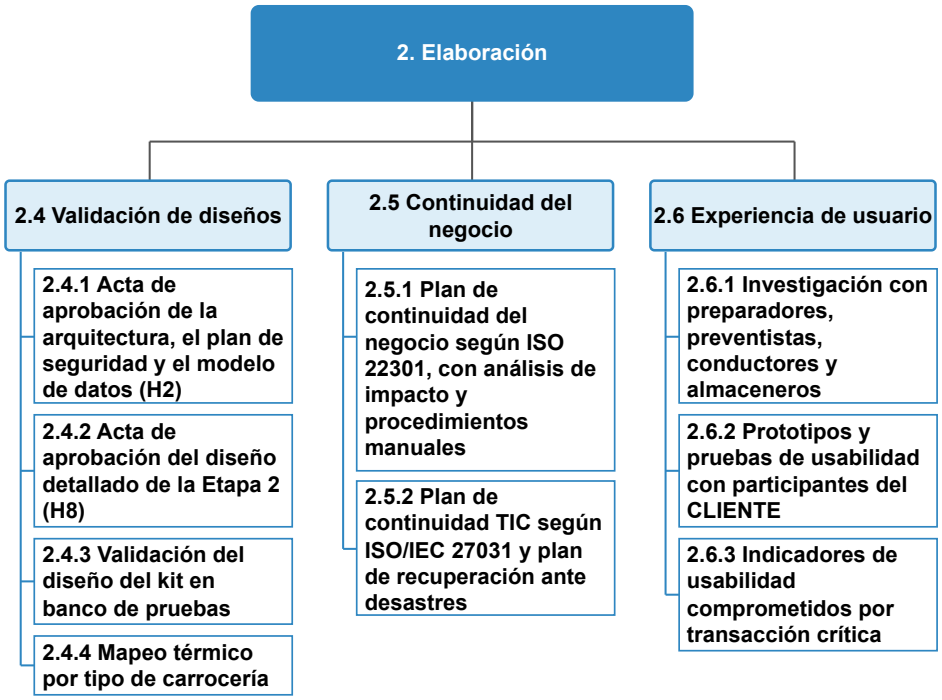


Figura 7.5 Fase 2 — Elaboración, segunda parte: validación, continuidad y experiencia de usuario, cuentas 2.4 a 2.6. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Con estas cuentas, los diseños quedan sometidos a validación y se completan los planes de continuidad y experiencia de usuario que orientan la fase de Construcción.

7.1.2.3 Fase 3. Construcción

Construcción produce los ambientes y servicios de nube, la base compartida, los módulos de ambas etapas, las integraciones, la migración, las pruebas, las innovaciones y la documentación. La primera lámina reúne los ambientes de desarrollo, los servicios de nube y la base compartida (cuentas 3.1 a 3.3).

Alex

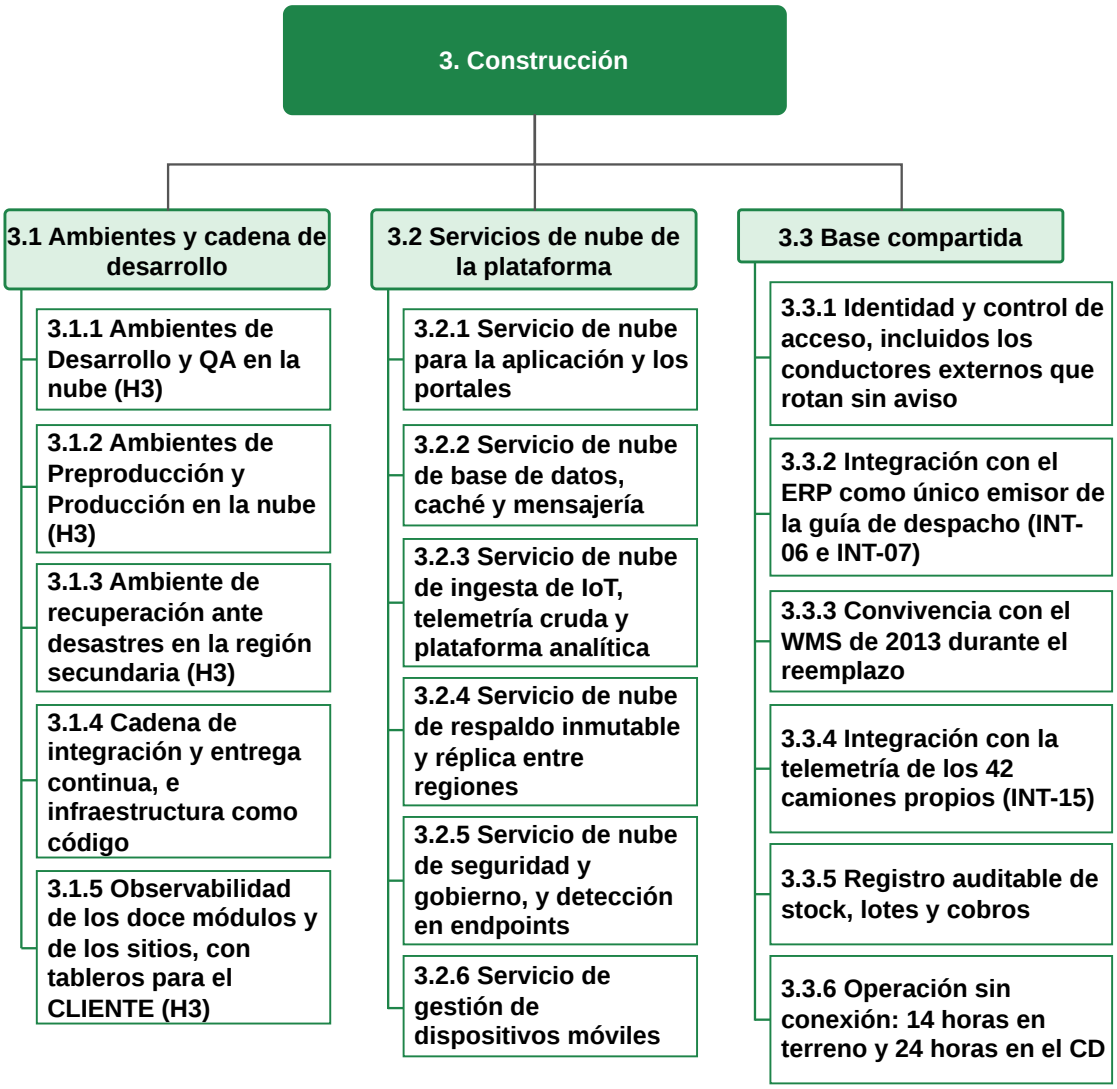


Figura 7.6 Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La segunda lámina desglosa los módulos de la Etapa 1 (cuenta 3.4), con los componentes de recepción, inventario, preparación de pedidos, cadena de frío, aplicaciones y operación de tiendas.

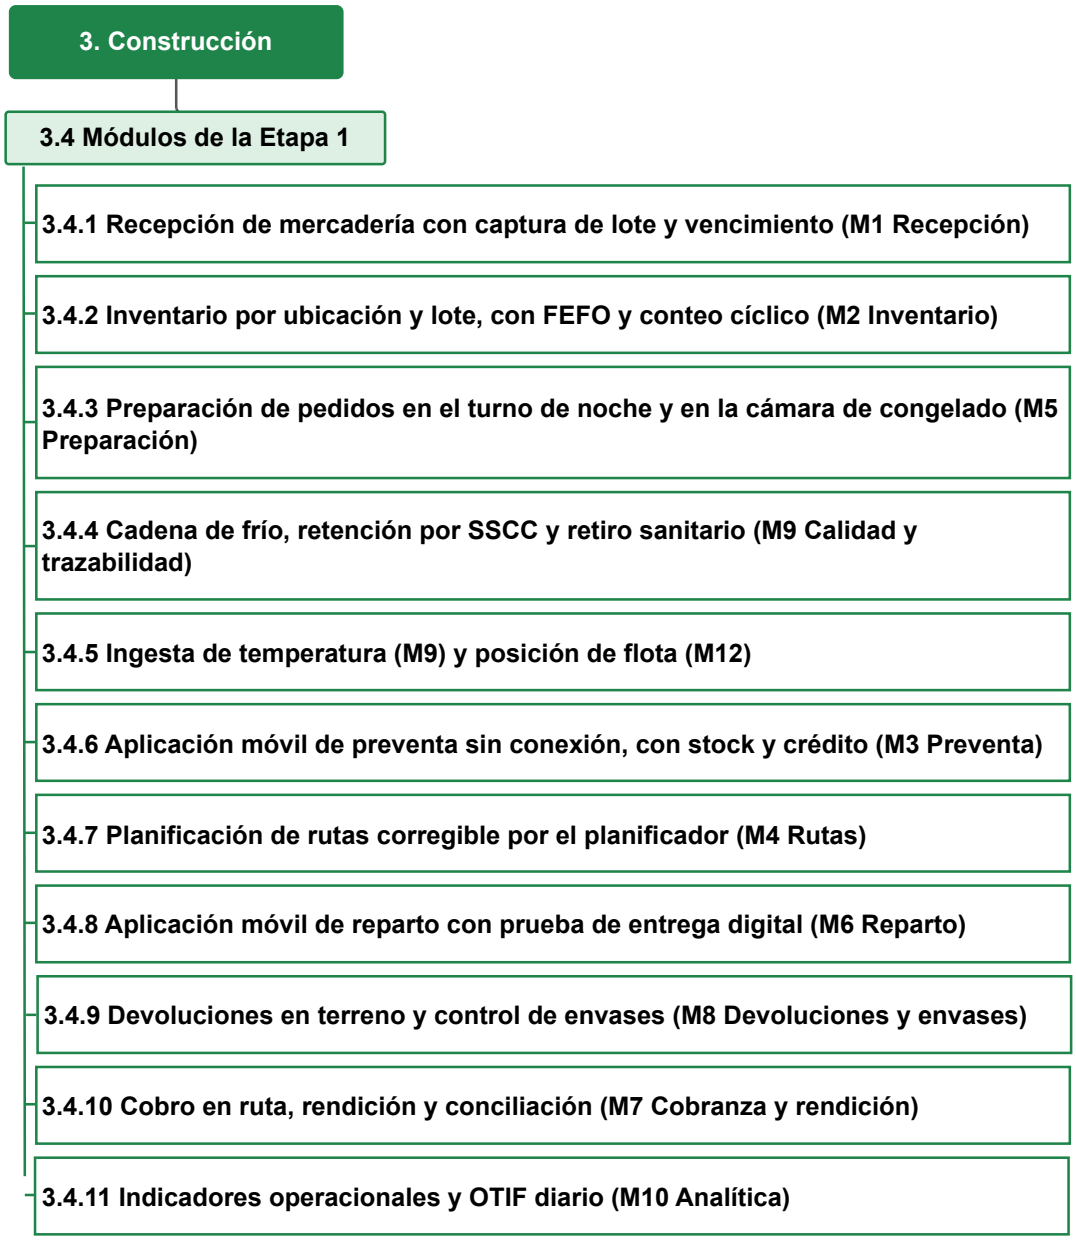


Figura 7.7 Fase 3 — Construcción, segunda parte: módulos de la Etapa 1, cuenta 3.4. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La tercera lámina presenta los módulos de la Etapa 2, las integraciones externas, la migración y las pruebas de la Etapa 1 (cuentas 3.5 a 3.8). La integración con el ERP conserva su función de emisor único de la guía de despacho.

Alex

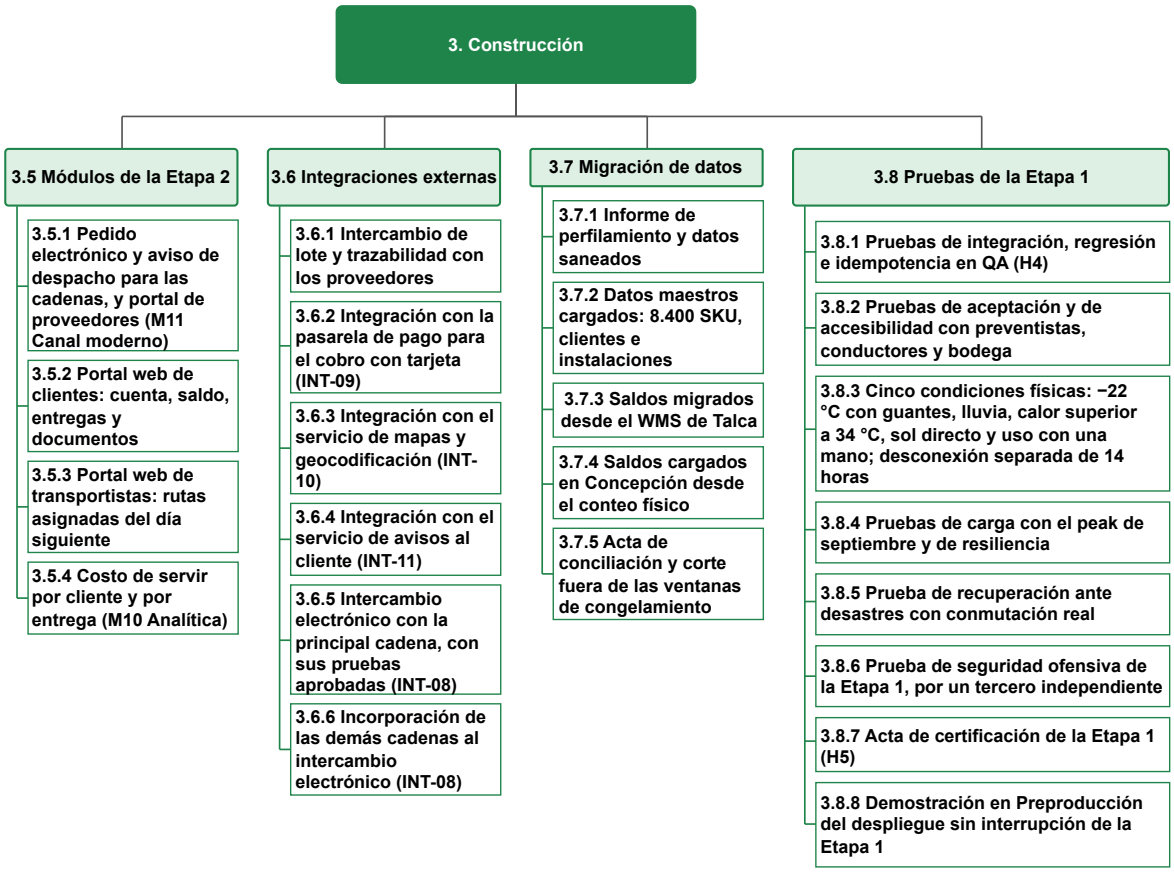


Figura 7.8 Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La cuarta lámina reúne las pruebas de la Etapa 2, las innovaciones y la documentación técnica (cuentas 3.9 a 3.11).

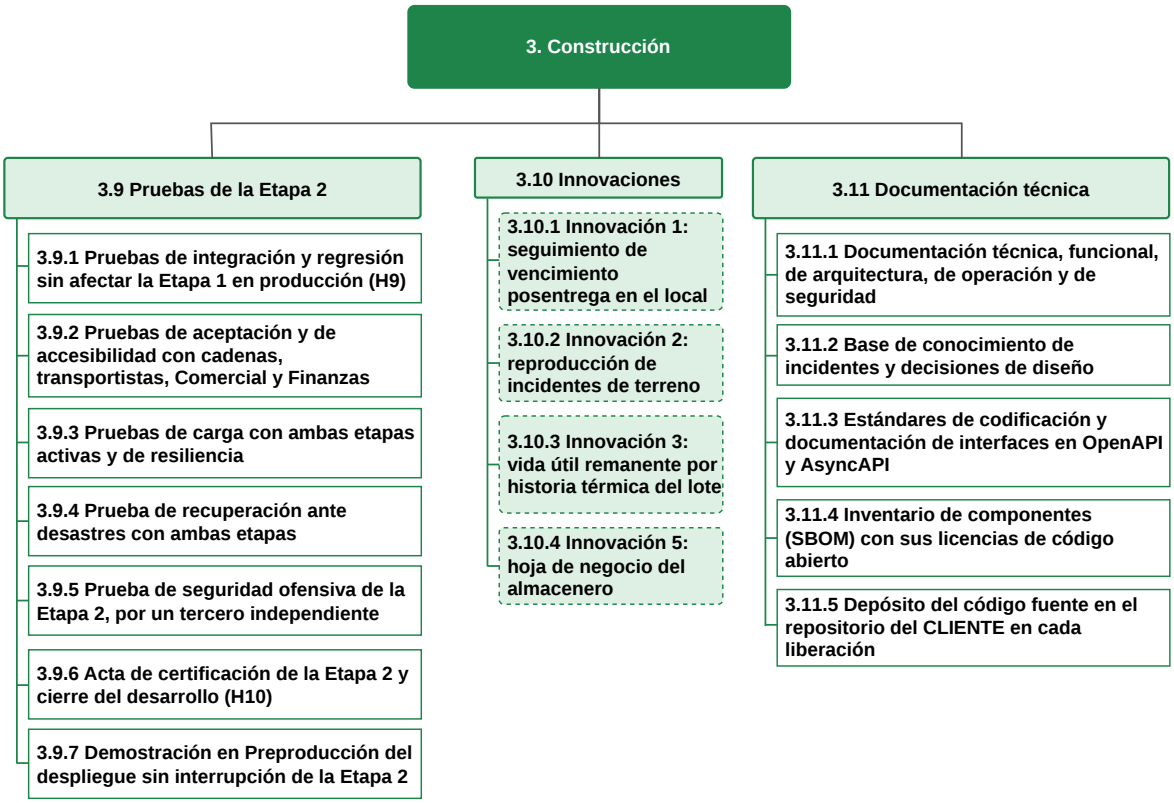


Figura 7.9 Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La quinta lámina amplía la cuenta 3.10 para que se lean sus paquetes de innovación: seguimiento de vencimientos, reproducción de incidentes, vida útil remanente y hoja de negocio del almacenero.

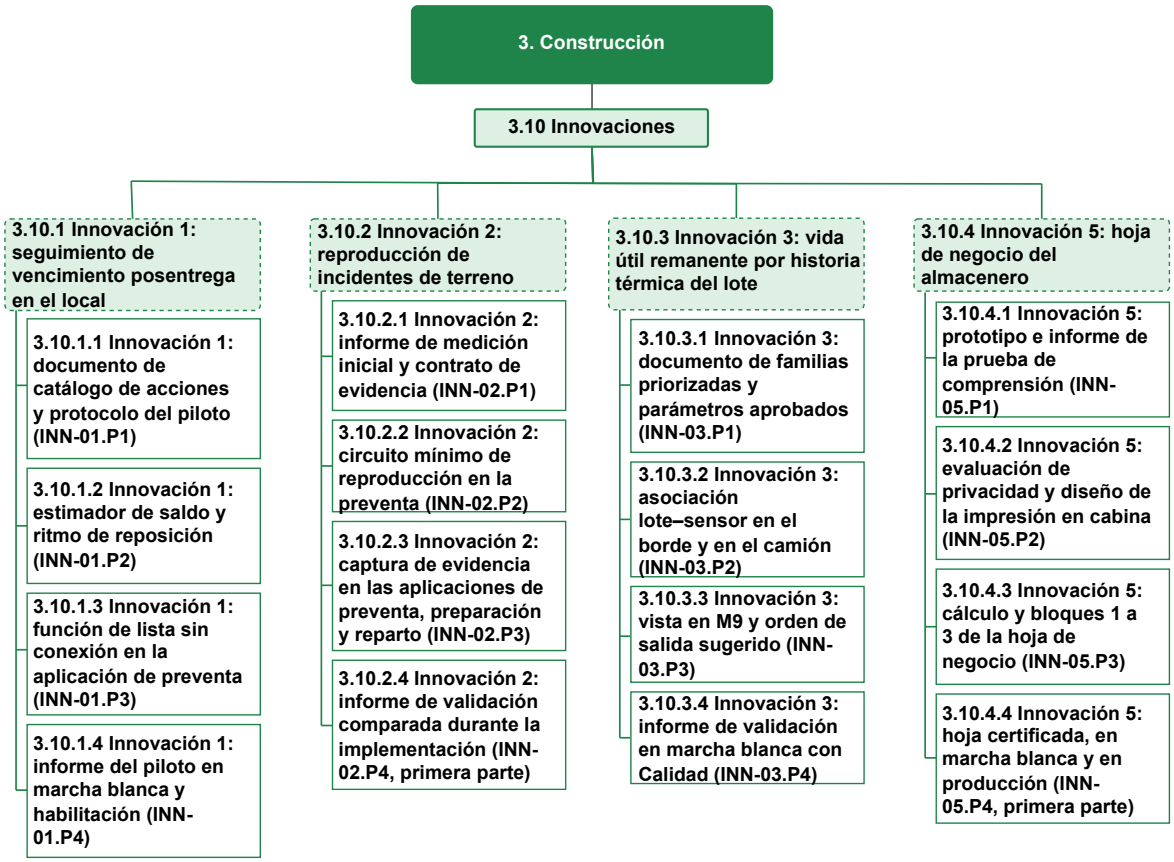


Figura 7.10 Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

El detalle identifica los paquetes de INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 dentro de 3.10. INN-04 conserva su tratamiento distinto: su fórmula contractual se acuerda en la cuenta 5.4, como muestra la fase de Adquisiciones y contrataciones.

7.1.2.4 Fase 4. Transición

Transición convierte la solución probada en el registro oficial. Su plan contempla las olas y la reversión; luego coordina las marchas blancas, la estabilización y las actas de aceptación de ambas etapas (H7 y H12).

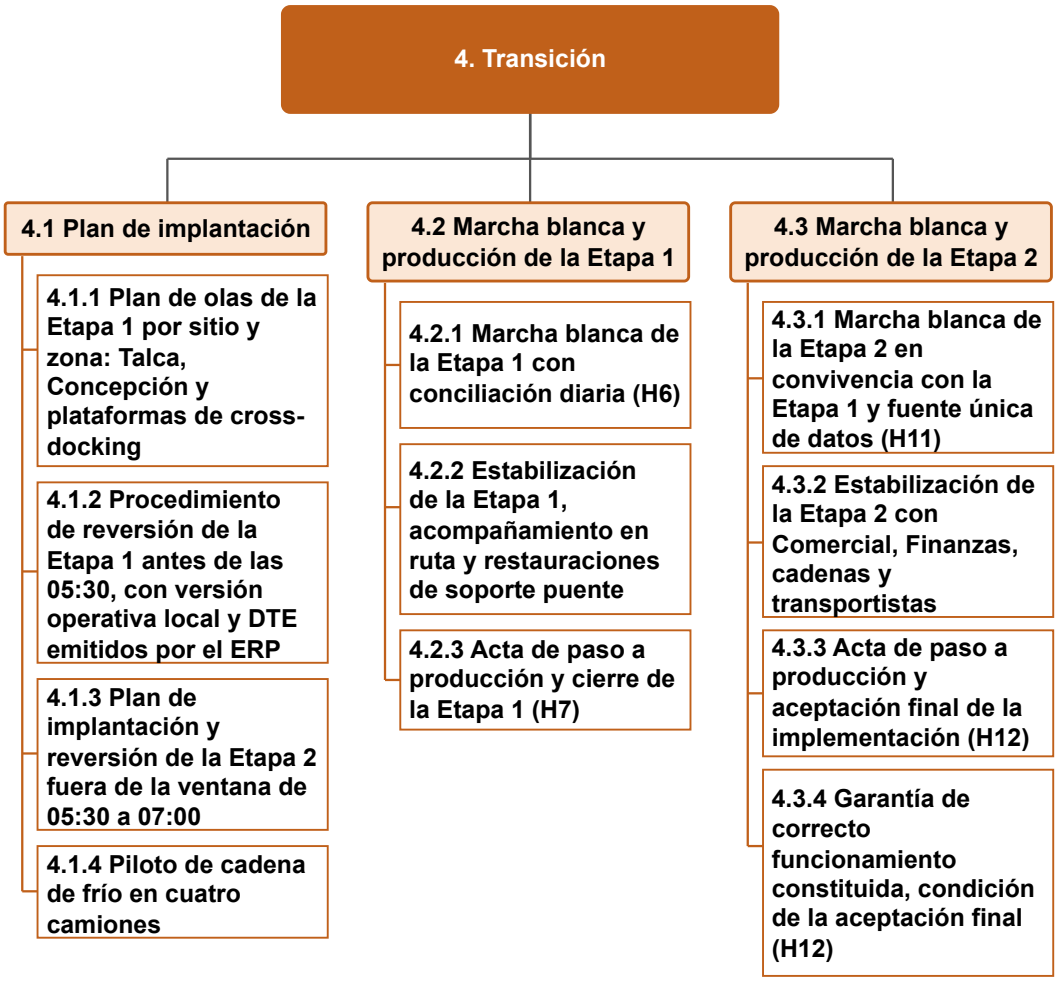


Figura 7.11 Fase 4 — Transición: plan de implantación y marchas blancas de las etapas 1 y 2, cuentas 4.1 a 4.3. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La cuenta 4.1 prepara las olas y la reversión; las cuentas 4.2 y 4.3 separan la marcha blanca y producción de cada etapa, asociadas a los hitos H7 y H12.

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones

Esta fase distingue el equipamiento de terreno, que el CLIENTE compra según la especificación de LafroX, de la infraestructura de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde, que LafroX especifica, compra y provee. LafroX incorpora el costo de esta infraestructura en su Oferta Económica; el CLIENTE no la adquiere mediante una compra separada. LafroX también contrata nube, enlaces y licencias. La fase formaliza, además, los acuerdos con transportistas y sindicato y la fórmula contractual de la innovación 4.

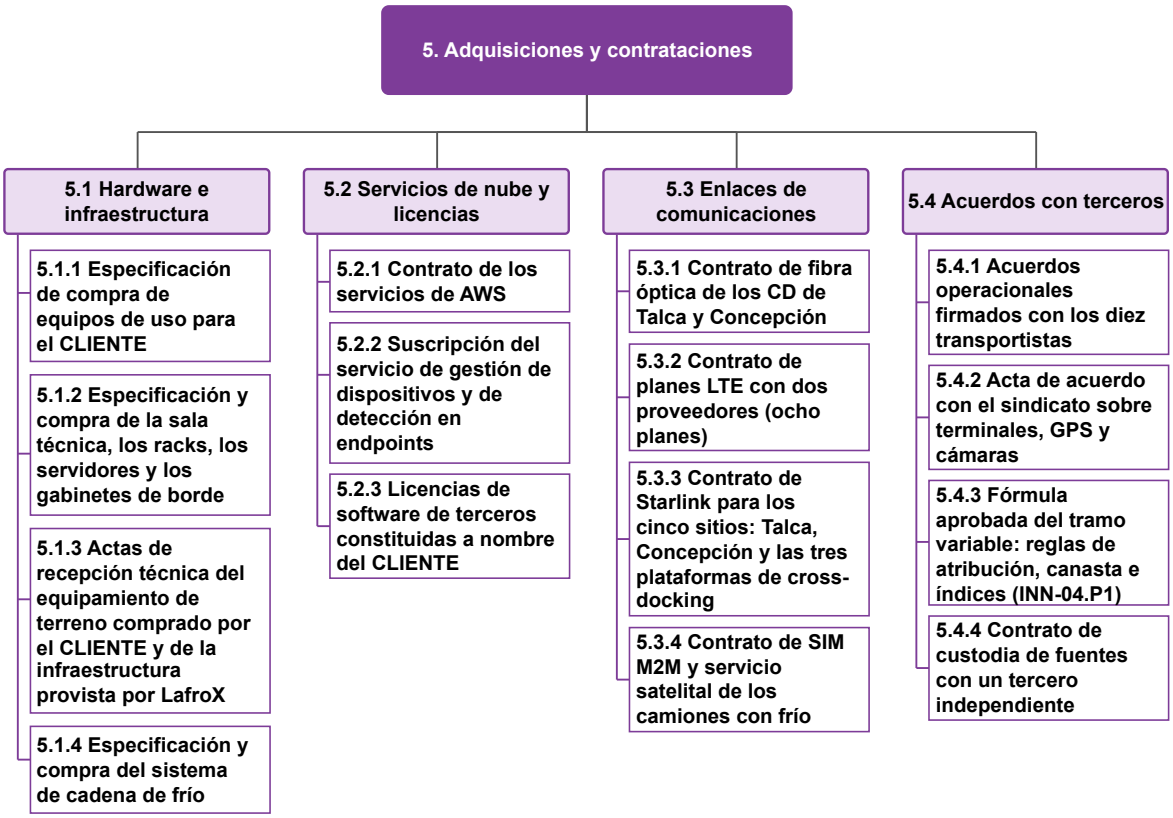


Figura 7.12 Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La cuenta 5.1 reúne las adquisiciones de hardware, manteniendo la distinción anterior: el CLIENTE compra el equipamiento de terreno y LafroX compra y provee la infraestructura de sala, incluida en su Oferta Económica. Las cuentas 5.2 a 5.4 organizan nube y licencias, enlaces y acuerdos con terceros.

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios

La fase instala la sala técnica de Talca, con energía, climatización y extinción; el cableado, los racks y gabinetes de borde; y la infraestructura de los sitios. La primera lámina cubre la sala, el cableado y el montaje de racks (cuentas 6.1 a 6.3).



Figura 7.13 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La segunda lámina incluye seguridad física, equipamiento de campo y configuración de la infraestructura distribuida en los sitios (cuentas 6.4 a 6.6), incluidos los termógrafos de los camiones con frío y la prueba de autonomía de 24 horas.

Alex

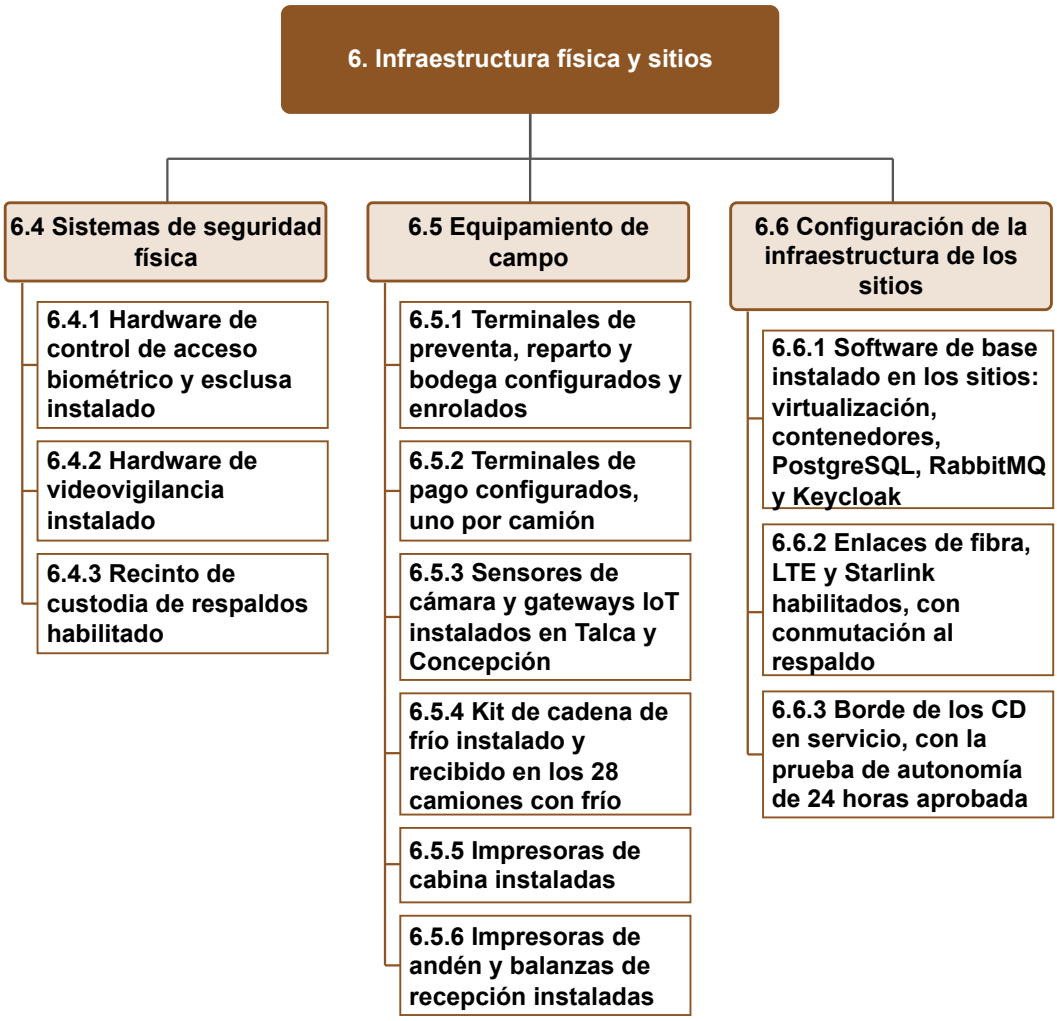


Figura 7.14 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, segunda parte: seguridad física, equipamiento de campo y configuración, cuentas 6.4 a 6.6. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Con seguridad física, equipamiento de campo y configuración de los sitios, estas cuentas completan la infraestructura distribuida que habilita la operación en terreno.

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio

La fase atiende la rotación del 38 % en preparación con capacitación continua del turno de noche; acompaña individualmente al personal con veinte o treinta años en la compañía; incorpora a los conductores externos en el andén; y transfiere conocimiento al equipo de TI del CLIENTE. La certificación de usuarios (cuenta 7.3) es una de las condiciones de cierre de cada marcha blanca.

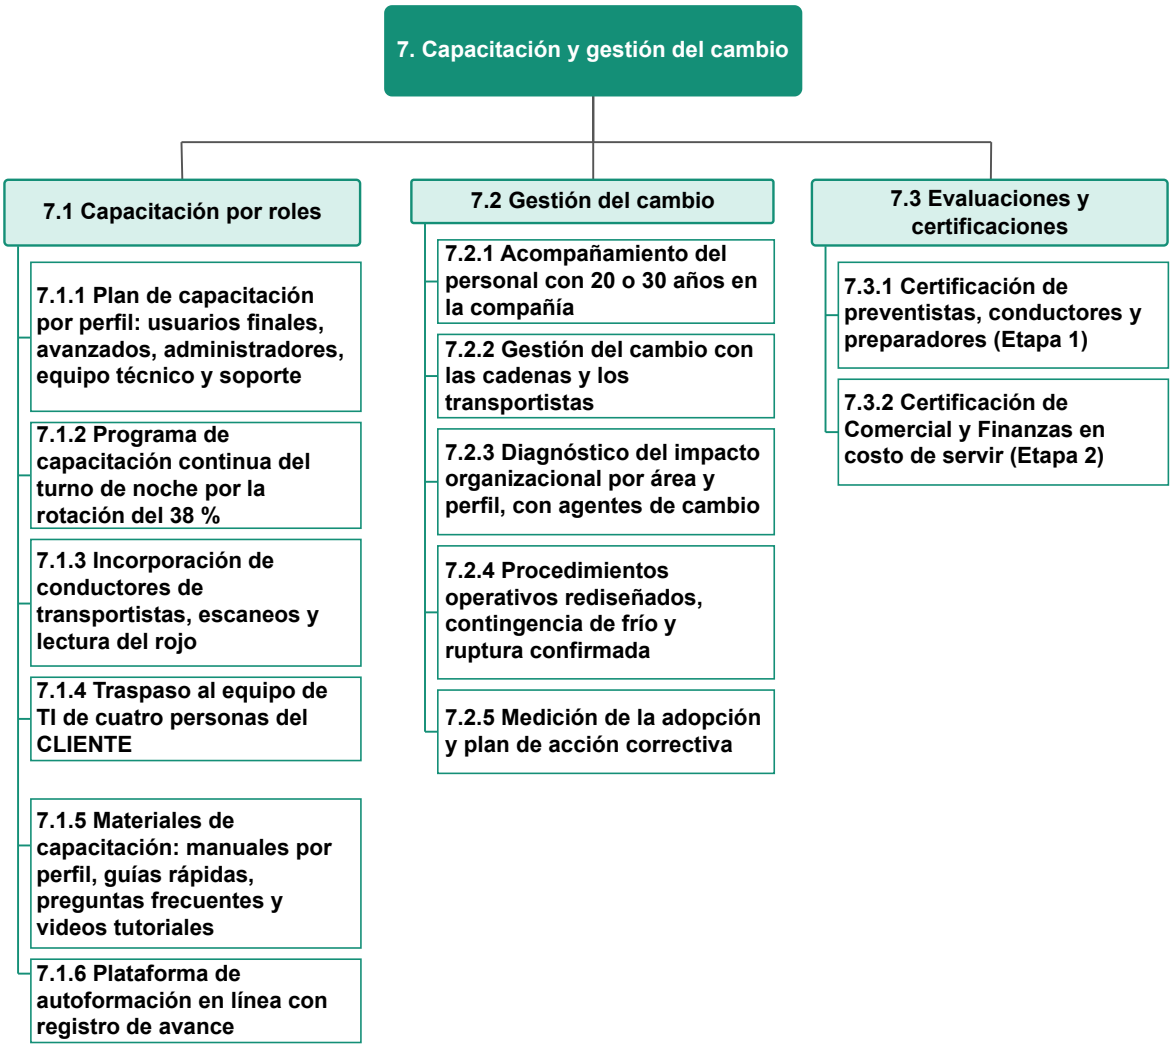


Figura 7.15 Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La lámina muestra que la adopción combina formación por perfil, acompañamiento del personal y certificaciones antes de los cierres de marcha blanca.

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte

La fase presta servicios durante los meses 21 a 56: centro de operaciones, gestión de incidentes, continuidad, mantenimiento, innovaciones, informes y transferencia al equipo del CLIENTE. La primera lámina presenta las cuentas 8.1 y 8.2, que reúnen los servicios de operación y el mantenimiento de la solución.

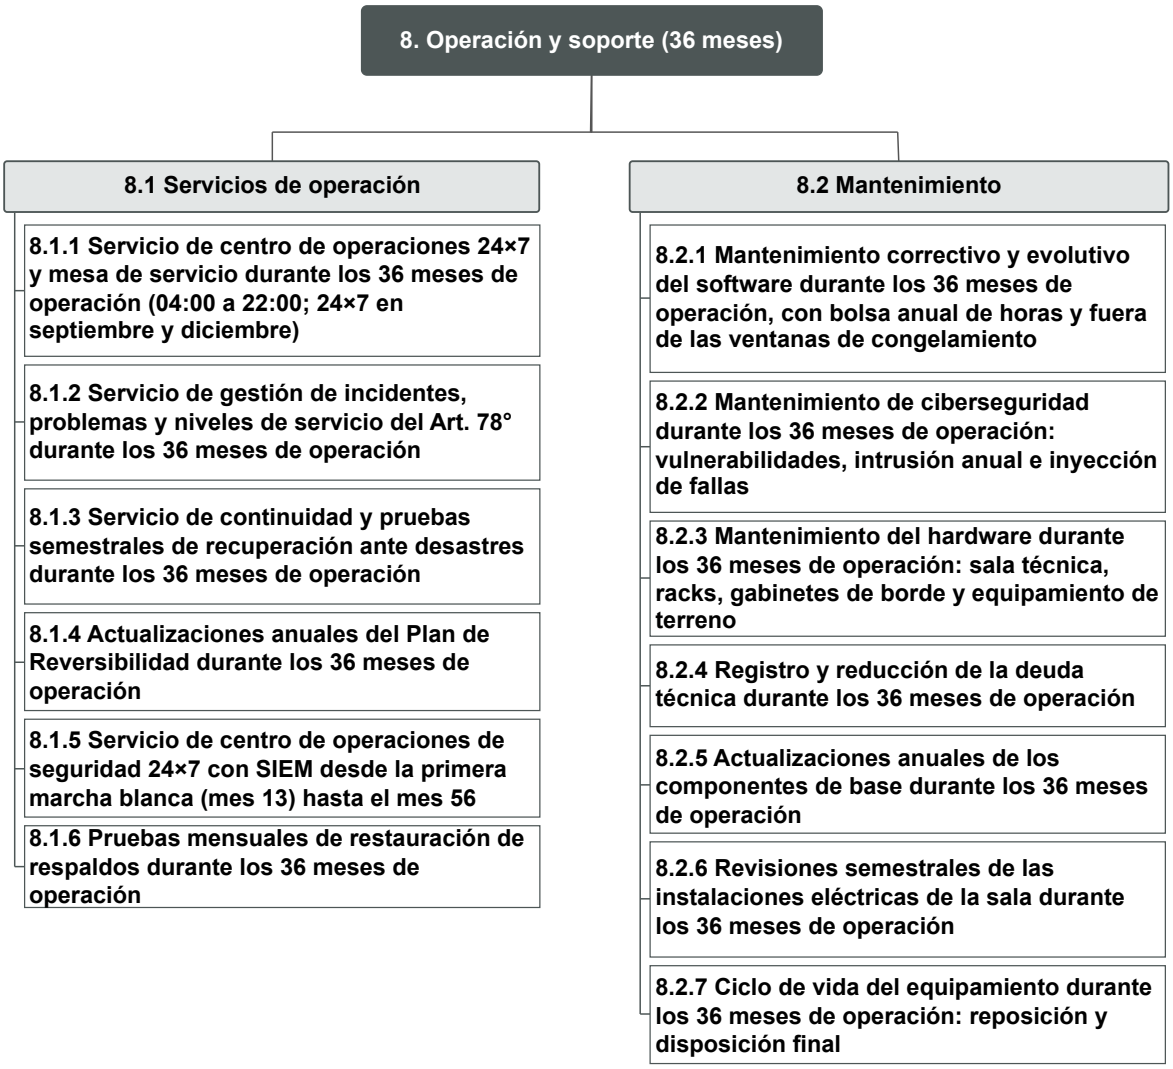


Figura 7.16 Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La primera parte concentra la continuidad del servicio y el mantenimiento del software, la infraestructura y la ciberseguridad. Sus paquetes conservan las frecuencias, horarios y ventanas que condicionan la operación durante los 36 meses.

La segunda lámina completa la fase con las cuentas 8.3 a 8.5: innovaciones en operación, informes y obligaciones periódicas, y capacitación y transferencia. También distingue los períodos particulares de las innovaciones y la mentoría al equipo del CLIENTE.

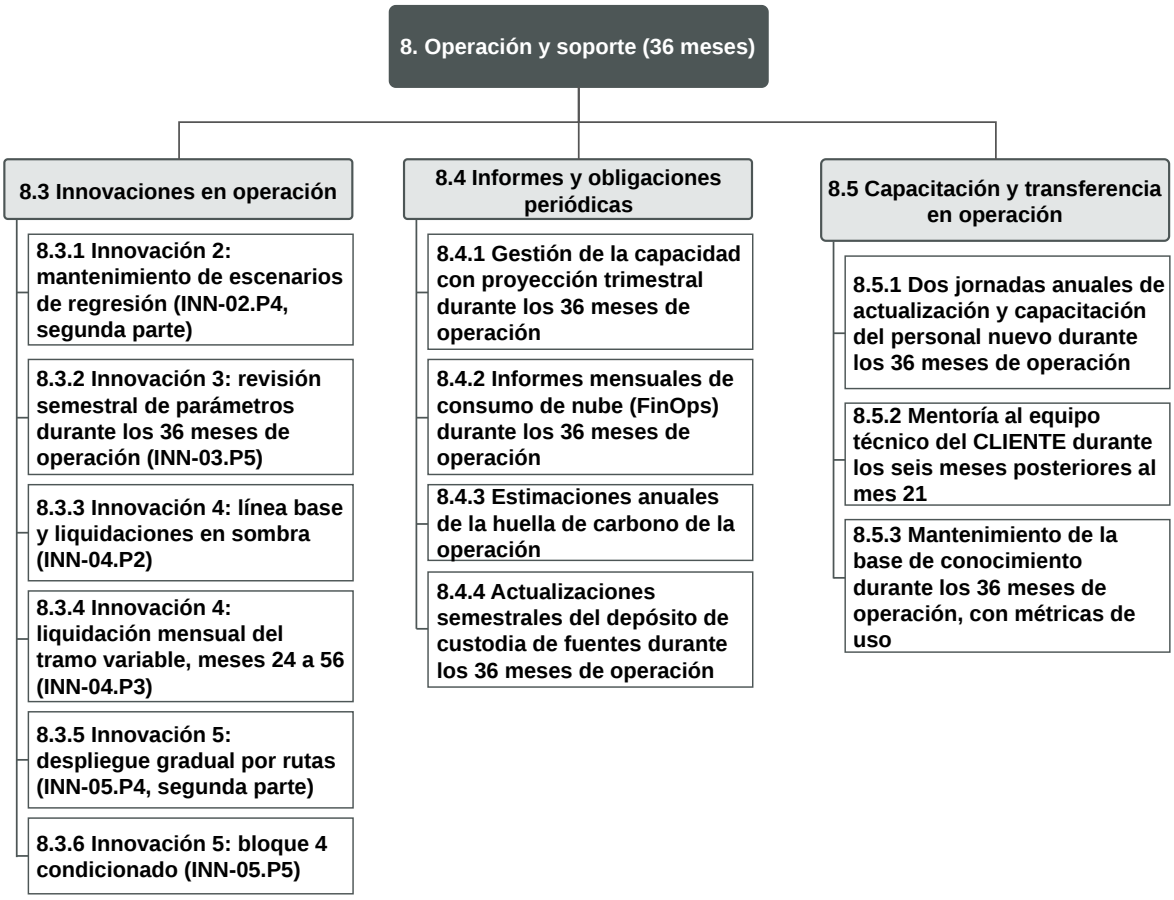


Figura 7.17 Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Estas cuentas completan la operación con la continuidad de las innovaciones, los informes recurrentes y la transferencia de conocimiento. La mentoría al equipo técnico del CLIENTE se extiende durante los seis meses posteriores al mes 21, mientras que el tramo variable de INN-04 se liquida entre los meses 24 y 56.

7.1.2.9 Fase 9. Cierre

Cierre comprende dos momentos: completar la implementación en el mes 21, con entrega de código, infraestructura como código y lecciones aprendidas; y ejecutar la salida al término del contrato, con el Plan de Reversibilidad y el tratamiento final de los datos.

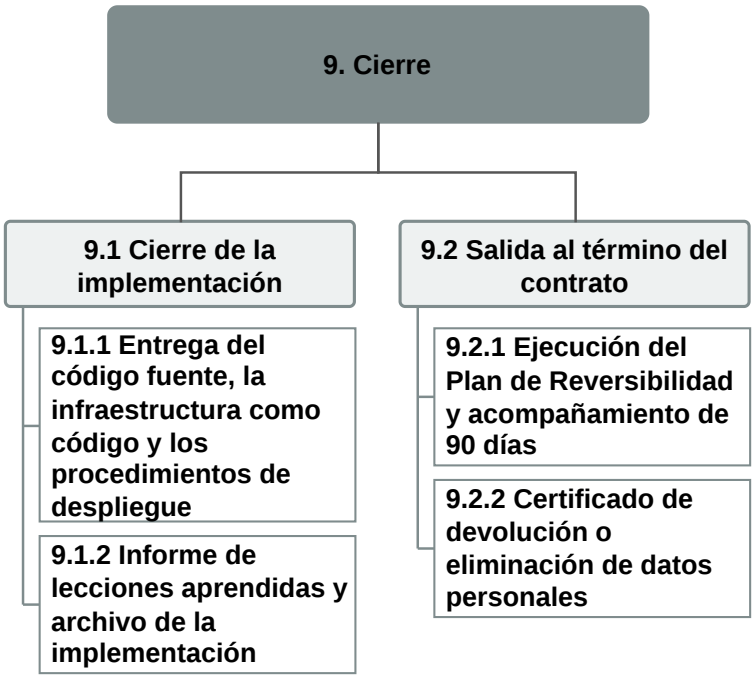


Figura 7.18 Fase 9 — Cierre: cierre de implementación y salida al término del contrato, cuentas 9.1 y 9.2. Fuente: Elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La EDT distingue así el cierre de implementación del mes 21 de la salida al término del contrato, que incluye la ejecución del Plan de Reversibilidad y el tratamiento final de los datos.

7.1.3 Cobertura del alcance

Las Aclaraciones de la licitación exigen que la EDT contenga explícitamente las innovaciones y las actividades de seguridad, calidad, migración e implantación (sección 11, Capítulo 7), y el Caso logística exige que contenga la arquitectura (Caso, cap. 19, p. 35). La Tabla 7.2 comprueba que cada uno de esos componentes tiene paquetes propios.

Tabla 7.2 Cobertura del alcance en la EDT. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14); LafroX (2026m, SD4); y Distribuidora Puelche S.A. (2026d, Aclaraciones).

Componente	Elementos	PT	Cuentas de control	Exigencia
Módulos	M1–M12 y los portales de clientes y de transportistas; el portal de proveedores se construye con M11 Canal moderno (3.5.1)	15	3.4, 3.5	Caso logística, Capítulo 19
Interfaces	INT-01 a INT-15	21	3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 6.3, 6.5	Caso logística, Capítulo 19
Innovaciones	INN-01 a INN-05	23	3.10, 5.4, 8.3	Aclaraciones; BA, Art. 29°
Seguridad	Diseño, construcción, pruebas y operación	17	1.9, 2.2, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.11, 6.4, 8.1, 8.2	Aclaraciones
Calidad	Planes, puertas, pruebas y deuda técnica	19	1.5, 3.8, 3.9, 3.11, 8.2	Aclaraciones
Migración	Perfilamiento, carga, ensayos y conciliación	6	3.3, 3.7	Aclaraciones; BTT, numeral 20.1
Implantación	Olas, marchas blancas, capacitación y cambio	24	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	Aclaraciones; RT-20.01 a 20.08

La tabla muestra que ninguna exigencia descansa en un paquete genérico. La seguridad, por ejemplo, aparece en las cinco fases donde ocurre: el diseño de la Elaboración, la identidad y las pruebas de seguridad ofensiva de la Construcción, la seguridad física de la sala y el centro de operaciones de seguridad durante la Operación. Las pruebas de seguridad ofensiva 3.8.6 y 3.9.5 se cuentan en la fila de seguridad y en la de calidad, porque son a la vez control de seguridad y prueba de certificación. Las pruebas de la Etapa 2 repiten las de la Etapa 1 con una exigencia adicional: demostrar que la Etapa 1 en producción no se degrada.

La Figura 7.19 ubica esos paquetes por fase y muestra en qué parte de la EDT y, por lo tanto, del cronograma quedan las actividades de cada categoría.



Media firma: Alex Aravena

Fase de la EDT	Innovaciones 23 PaqueteTrabajo	Seguridad 17 PaqueteTrabajo	Calidad 19 PaqueteTrabajo	Migración 6 PaqueteTrabajo	Implantación 23 PaqueteTrabajo
1 Inicio	—	1.9.2, 1.9.3, 1.9.4	1.5.1, 1.5.2	—	—
2 Elaboración	—	2.2.1–2.2.4	—	—	—
3 Construcción	3.10.1 INN-01 3.10.2 INN-02 3.10.3 INN-03 3.10.4 INN-05	3.2.5, 3.3.1 3.8.6, 3.9.5 3.11.4	3.8.1–3.8.8 3.9.1–3.9.7 3.11.3	3.3.3 3.7.1–3.7.5	—
4 Transición	—	—	—	—	4.1.1–4.1.3 4.2.1–4.2.3 4.3.1–4.3.4
5 Adquisiciones	5.4.3 INN-04	—	—	—	—
6 Infraestructura	—	6.4.1–6.4.3	—	—	—
7 Capacitación	—	—	—	—	7.1.1–7.1.6 7.2.1–7.2.5 7.3.1, 7.3.2
8 Operación	8.3.1–8.3.6 (INN-02 a INN-05)	8.1.5, 8.2.2	8.2.4	—	—
9 Cierre	—	—	—	—	—

Figura 7.19 Ubicación en la EDT de las innovaciones y la seguridad, la calidad, la migración y la implantación. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y Distribuidora Puelche S.A. (2026d, sec. 11).

La matriz confirma que las cinco categorías se distribuyen desde el diseño hasta la operación. Las innovaciones tienen paquetes en las fases donde se construyen, se contratan y se operan: INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 se construyen en la cuenta 3.10; la fórmula contractual de INN-04 se aprueba en la cuenta 5.4, porque es una innovación de modelo de contratación y no tiene paquete de construcción; e INN-02 a INN-05 tienen su parte de operación en la cuenta 8.3. Cada innovación tiene sus meses en el Anexo 7.D (BA, art. 29, p. 19, punto 4).

Los anexos completan la cobertura. El Anexo 7.E relaciona los doce módulos y las quince interfaces del Capítulo 4 con el paquete que los construye y prueba, y el Anexo 7.C ubica los dieciséis resultados de aceptación del caso en su paquete y su momento. Los requerimientos del Formulario T-12 se trazan a los paquetes mediante la matriz de trazabilidad del paquete 1.2.4, que se aprueba con el H1.

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables

El diccionario de la EDT, en el Formulario T-14, describe cada paquete con su entregable, su criterio de aceptación, su responsable y el período del cronograma en que se ejecuta, junto con el hito del Formulario E-25 que habilita. Todo entregable se recibe con el acta de la Contraparte Técnica, acompañada de su evidencia de verificación, su trazabilidad hacia los requerimientos y las observaciones resueltas (BA, arts. 18.1 y 18.2, p. 13). Los criterios del diccionario se suman a esa regla común. Por ejemplo, el paquete 3.4.1 (M1 Recepción) se acepta solo si ningún producto con trazabilidad obligatoria se recibe sin lote, y el 4.1.2 (reversión de la Etapa 1) se acepta solo si su ensayo termina antes de las 05:30, sostiene 96 despachos sin interrupción con DTE válidos del ERP y no pierde ni duplica registros.

Los responsables son los ocho roles de la estructura para el proyecto del Capítulo 1, sección 1.5 (LafroX, 2026i). La Tabla 7.3 muestra cómo se reparten los paquetes.

Tabla 7.3 Paquetes por responsable. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Líder de Operación / SRE	60	26 %	6 (21), 3 (13), 8 (12)
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	35	15 %	7 (13), 4 (8)
Jefe de Proyecto	33	15 %	1 (22)
Líder de Desarrollo	24	11 %	3 (21)
Líder de Calidad	19	8 %	3 (15)
Arquitecto de Solución	20	9 %	2 (6), 3 (6)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Encargado de Seguridad de la Información	18	8 %	1 (4), 2 (4), 3 (4)
Líder de Datos	18	8 %	3 (16)
Total	**227**	**100 %**	

Todos los paquetes tienen un responsable único, de modo que son asignables. La distribución sigue la naturaleza del trabajo: el Jefe de Proyecto concentra la gestión y el gobierno; el Líder de Desarrollo, la construcción; y el Líder de Implantación, la capacitación y la transición. El Líder de Operación / SRE responde por un cuarto de los paquetes, porque reúne la nube, la infraestructura de los cinco sitios y la operación, y sus paquetes de las fases 3 y 6 ocurren a la vez. Responder por un paquete no significa ejecutarlo en persona: la sección 7.2.3 y el Formulario T-15 muestran qué frente ejecuta el trabajo bajo cada rol.

7.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo aplica las metodologías del Capítulo 6. La gestión del proyecto se basa en el PMBOK: los alcances aprobados (H1 y H8) y el cronograma son las líneas base contra las que se mide el avance; el avance se mide con valor ganado en el informe mensual (RT-19.06 y RT-19.07); y todo cambio de alcance, plazo o criterio de aceptación se aprueba antes de incorporarse al plan, conforme al artículo 72 de las Bases Administrativas (p. 38) (paquete 1.4.3).

El desarrollo sigue las cuatro fases del proceso iterativo del Capítulo 6, que la EDT recorre una vez por etapa. Dentro de la Construcción, cada módulo avanza por iteraciones que producen resultados verificables, mientras que la marcha blanca y la aceptación formal ocurren solo en los meses que fija el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El tablero de flujo del equipo coordina las tareas diarias, pero no reemplaza el cronograma ni la aceptación formal de los entregables, como establece la metodología de gestión de proyectos del Capítulo 6.

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias

El orden del trabajo sigue las dependencias de datos y de infraestructura de Puelche (Capítulo 3, sección 3.4.3). Primero se aprueban el alcance (H1, mes 2) y el diseño (H2, mes 4). En paralelo, se especifica y compra el equipamiento de la sala y de los sitios, y se contratan la nube y los enlaces, de modo que la infraestructura híbrida y los ambientes queden habilitados en el H3 del mes 6.



La construcción de la Etapa 1 parte por la base compartida, porque si falla, fallan todos los módulos. Sigue con recepción e inventario, que alimentan la preparación y el retiro sanitario, mientras la preventa avanza en paralelo porque necesita stock y crédito. Las rutas y el reparto se integran cuando existen el pedido confirmado y la preparación, y la rendición, cuando existe la entrega registrada. La Etapa 2 se diseña en los meses 13 y 14 (H8), reutiliza los pedidos, las guías y las evidencias ya probadas, y calcula el costo de servir con los hechos acumulados desde la marcha blanca de la Etapa 1.

La Figura 7.20 presenta esa red de precedencias entre cuentas de control. El Anexo 7.B lista las 34 dependencias entre paquetes con su fundamento.

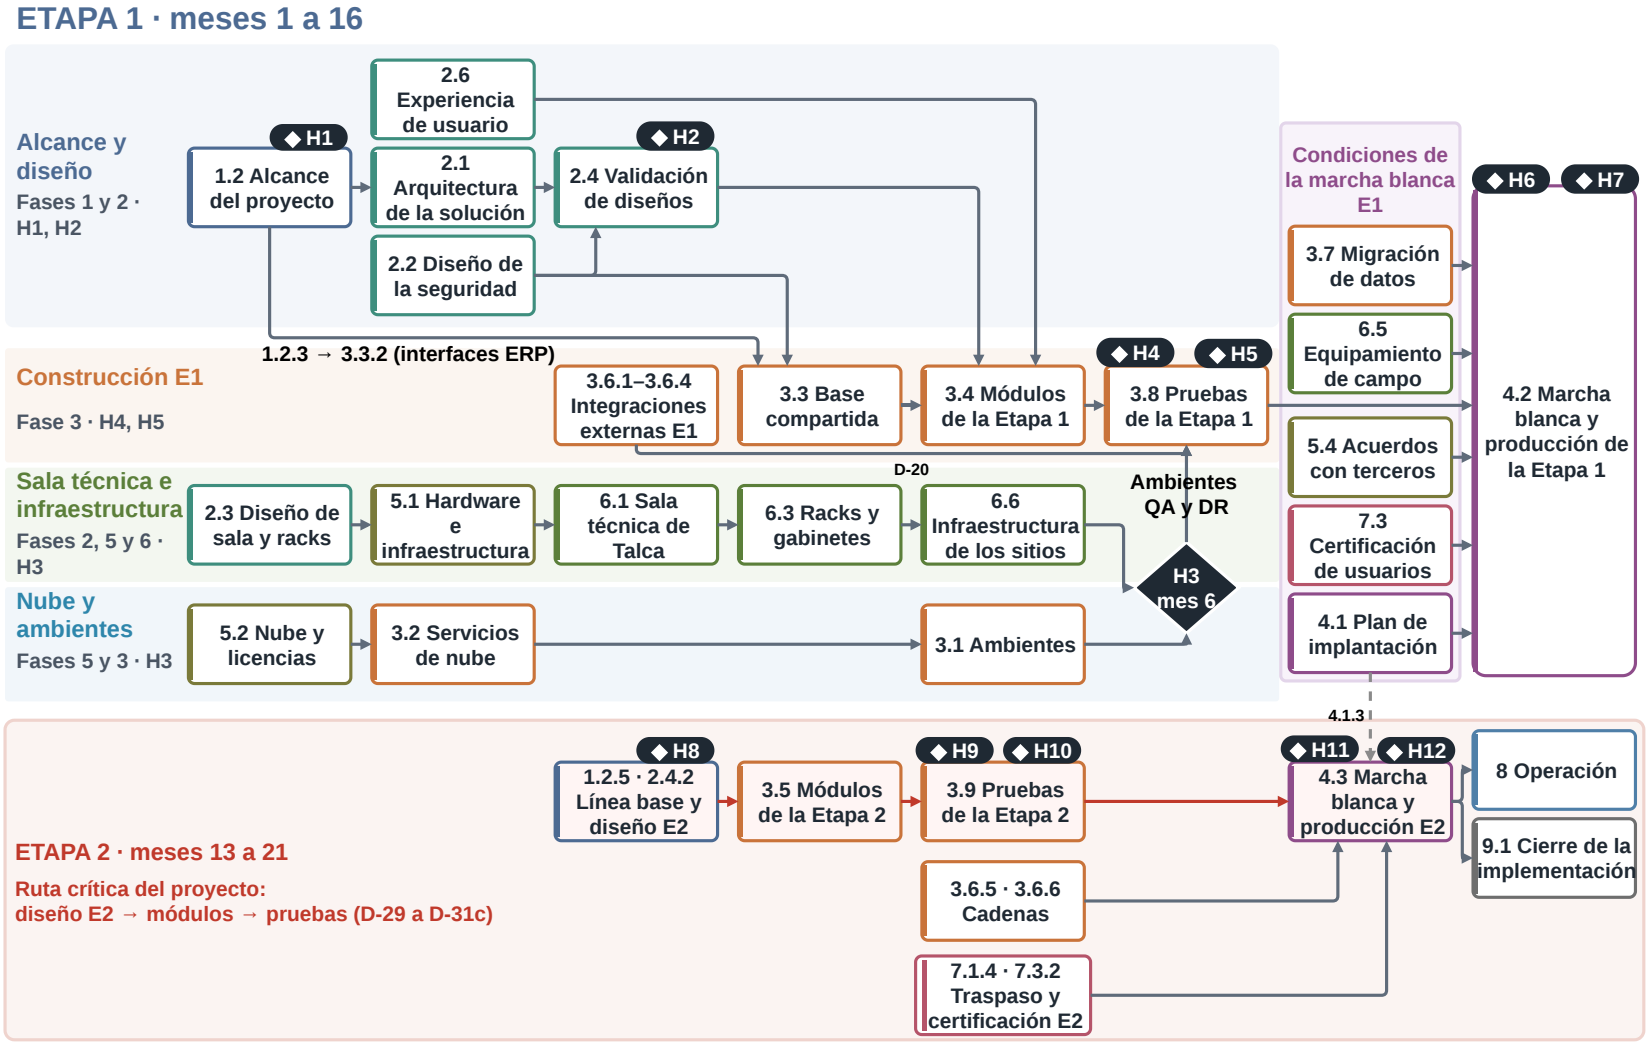


Figura 7.20 Red de precedencias entre cuentas de control e hitos. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026t, Anexo 7.B) y Distribuidora Puelche S.A. (2026a, Formulario E-25).

La red muestra tres convergencias. En el H3 se juntan la cadena de la nube (5.2, 3.2 y 3.1) y la de la sala técnica (2.3, 5.1, 6.1, 6.3 y 6.6). En los hitos H4 y H5 se juntan los módulos, la base compartida, el diseño aprobado y la experiencia de usuario. Al cierre de la marcha blanca se juntan la solución certificada, la migración, el equipamiento de cada ola, la certificación de los usuarios y, en la ola de reparto, los acuerdos con los transportistas y el sindicato. Un atraso en cualquiera de esas ramas se propaga al hito aunque no sea de software. El cálculo de la sección 7.3.1 identifica el cierre de la marcha blanca de la Etapa 2, el acta final y la revisión del CLIENTE como camino controlante del H12, con tres días hábiles de holgura contractual.


El secuenciamiento incorpora además las condiciones de la operación de Puelche que el caso exige ver en el plan (Caso, sección 17.5, p. 33). Los congelamientos de septiembre y diciembre, y el cierre de los tres primeros días hábiles de cada mes, son restricciones de calendario para todo corte, despliegue e inicio de ola (paquete 1.3.1). La implantación en bodega y su acompañamiento se programan en el turno de noche, entre las 22:00 y las 06:00 (paquete 4.2.2), y la rotación del 38 % se atiende con capacitación continua y no con un evento único (paquete 7.1.2). Los 62 preventistas y los cerca de 200 conductores se capacitan en su ruta, sin detener la venta ni el reparto (paquetes 7.1.1 y 4.2.2).

Los acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato preceden a la ola de reparto (paquetes 5.4.1 y 5.4.2), y la certificación del intercambio electrónico es un paquete por cadena y no una tarea única (paquetes 3.6.5 y 3.6.6). Las interfaces del sistema de gestión se levantan en el Inicio y se prueban temprano (paquetes 1.2.3 y 3.3.2). Las reglas de ruteo del planificador se capturan en los talleres de los meses 1 a 3 y se validan sin él durante la marcha blanca (paquete 1.2.2; resultado R18-16).

7.2.2 Estimación

El esfuerzo se estima por paquete con tres valores en horas hombre: optimista, más probable y pesimista (PMI, 2017, p. 201). La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, una de las que el PMBOK admite para modelar la incertidumbre de duración y recursos (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT da el esfuerzo esperado $T_E = (O + 4M + P)/6$ y su desviación $\sigma = (P - O)/6$ (Malcolm et al., 1959). El PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O + M + P)/3$ (PMI, 2017, p. 201); se prefiere la beta porque da cuatro veces más peso al valor más probable, que el equipo funda en los requerimientos del Formulario T-12 y en las cantidades del Formulario T-11.

La base de cada estimación depende del tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman a partir de los requerimientos del Formulario T-12 asignados a cada paquete; la infraestructura, a partir de las cantidades del Formulario T-11; la implantación, a partir de las personas y rutas del caso; y la operación, a partir de los horarios de cobertura y de la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 se estiman por mes y se multiplican por los 36 meses de operación. El Formulario T-15 detalla el método y las reglas de programación. La duración de cada paquete se obtiene de su esfuerzo esperado y de la dotación asignada, y la suma de las varianzas de los paquetes de la ruta crítica entrega la probabilidad de cumplir cada hito con la aproximación normal de PERT. Para programar y controlar, el esfuerzo de cada




paquete se reparte entre sus actividades del Formulario T-15, sección 6, sin cambiar su total.

La Tabla 7.4 resume el resultado de la estimación por etapa contractual, con la reserva protegida separada del trabajo base.

Tabla 7.4 Horas hombre programadas por etapa — Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026e, T-15), sección 4.3

Etapa	Meses	HH base y cobertura	HH de reserva protegida	HH programadas
Etapa 1 · Desarrollo	1 a 12	40.569,48	0	40.569,48
Etapa 1 · Marcha blanca	13 a 15	11.214,55	1.152	12.366,55
Etapa 2 · Desarrollo	13 a 18	11.406,54	0	11.406,54
Etapa 2 · Marcha blanca	19 y 20	7.387,91	0	7.387,91
Etapa 1 · Producción y estabilización	16 a 20	14.824,31	1.920	16.744,31
Etapa 2 · Cierre y estabilización posterior al H12	21 y 22	2.694,54	0	2.694,54
Operación	21 a 56	128.853,67	0	128.853,67
Total		**216.951**	**3.072**	**220.023**

La operación concentra el 59 % de las horas programadas (128.854 de 220.023 HH), porque cubre 36 meses de servicio continuo del centro de operaciones, la mesa y el SOC (el SOC opera desde la primera marcha blanca, en el mes 13, y sus horas de los meses 13 a 20 se imputan a las marchas blancas y a la producción de la Etapa 1); la mesa incluye desde el mes 25, cuando la demanda proyectada se acerca a su límite, un tercer agente en las franjas de menor demanda, con el que cubre sus niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes. Son puestos de turno 24×7 y de mesa, no personas dedicadas a otras tareas. La implementación de los meses 1 a 21, más la estabilización posterior al paso a producción que exige el RT-20.06 en los meses 21 y 22, suma 91.169,33 HH. Su tramo más denso son los meses 13 a 15, cuando la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2 suman 17.532,26 HH (4.747,73 + 6.591,68 + 6.192,85, según la curva del Formulario T-15, sección 4.4), con un máximo de 58 personas equivalentes en el mes 14. La construcción de los cuatro módulos de la Etapa 2 se reparte entre los meses



14 y 15, con cinco personas por módulo como máximo, en vez de concentrarse en abril. El mes de mayor dotación del proyecto es el 16, con 64 personas equivalentes, cuando el paso a producción de la Etapa 1, su estabilización y el soporte puente coinciden con las pruebas de la Etapa 2. Las 3.072 HH de reserva se asignan sólo a la Etapa 1, de modo que una corrección en su marcha blanca no se financia con horas de la Etapa 2.

7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización

El trabajo se organiza en ocho frentes. Cada frente es un equipo con un responsable que avanza en paralelo con los demás sobre un conjunto de cuentas de control. El frente de construcción de la Etapa 1 (F3) se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (LafroX, 2026k): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10). La Figura 7.21 presenta los frentes, su rol líder, sus cuentas de control y su ventana de actividad entre los meses 1 y 21; la correspondencia completa está en el Formulario T-15.



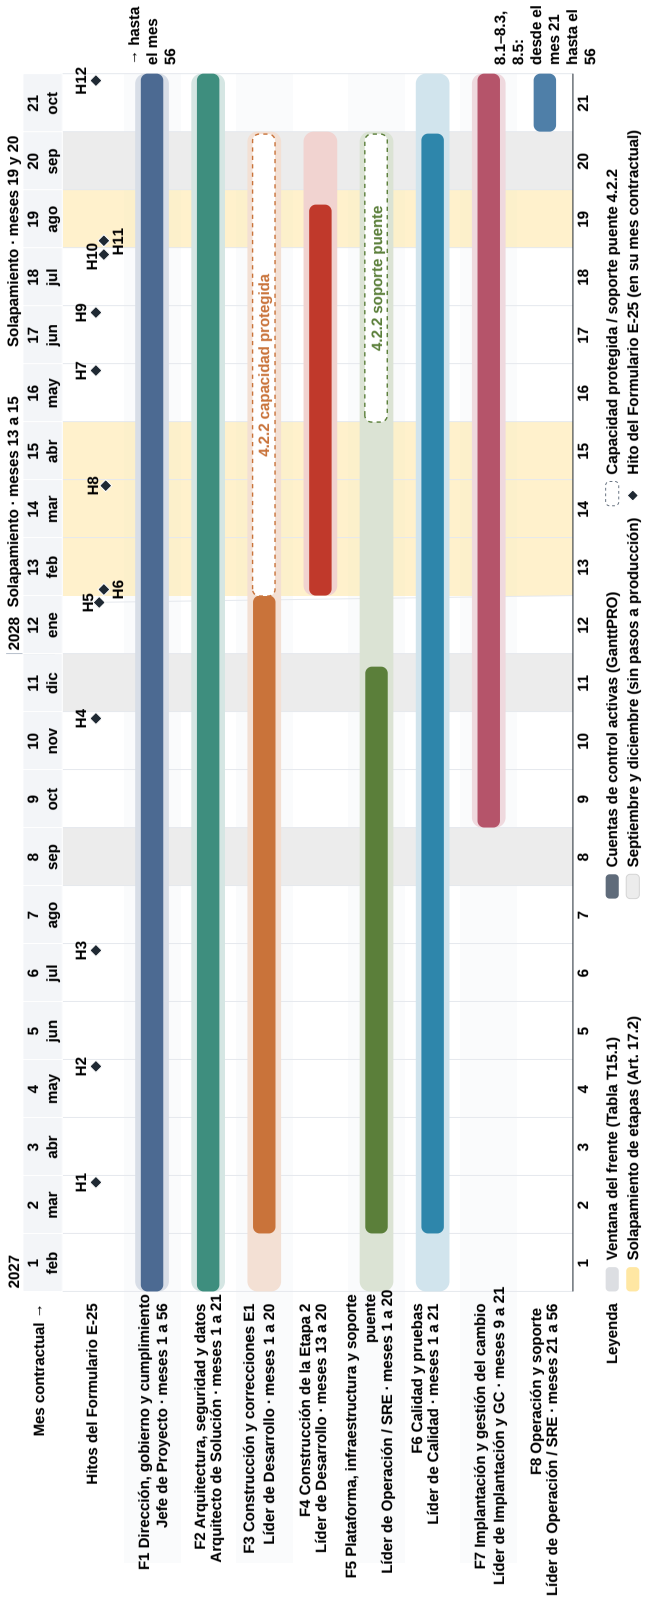


Figura 7.21 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y LafroX (2026e, T-15).

La figura muestra que en ningún mes trabaja un solo frente: entre los meses 1 y 15 avanzan a la vez la dirección, la arquitectura, la construcción de la Etapa 1, la plataforma y la calidad. La gestión del cambio empieza con el diagnóstico organizacional de los meses 2 a 6, y la implantación se intensifica desde el mes 8. Los frentes se sincronizan en tres instancias. La primera son los hitos del Formulario E-25, porque cada hito exige que varios frentes entreguen a la vez. La segunda son los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37): el de Proyecto es quincenal y los de Arquitectura y Operación son mensuales, y sus actas registran los acuerdos entre frentes en dos días hábiles (RT-19.09). La tercera son las ventanas de calendario, que son comunes a todos los frentes.

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20

El artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) obliga a dimensionar dotación y frentes para dos esfuerzos simultáneos. En los meses 13 a 15 trabajan a la vez el frente de implantación (F7), en la marcha blanca de la Etapa 1 con su acompañamiento; el de construcción de la Etapa 1 (F3), en las correcciones de esa marcha blanca; el de construcción de la Etapa 2 (F4), en su desarrollo, con el H8 en el mes 14; el de calidad (F6), en las pruebas de ambas etapas; y los frentes de dirección y de arquitectura (F1 y F2).

F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, pero son equipos distintos. Si el mismo equipo atendiera la marcha blanca y desarrollara la Etapa 2, cada incidente de la marcha blanca atrasaría la Etapa 2, que es precisamente la situación que el artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) busca evitar. La Figura 7.21 lo hace visible: en la franja sombreada de los meses 13 a 15, las barras de F3 y F4 coexisten en carriles separados.

En los meses 19 y 20 la Etapa 1 está en producción y la Etapa 2 en marcha blanca. Trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6, en las pruebas; y el soporte de la Etapa 1 en producción. La dotación de cada frente en cada solapamiento se presenta en el Formulario T-15, de modo que los dos esfuerzos se sumen sin contar dos veces a las mismas personas.

7.3 Cronograma e implantación

El cronograma aplica el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) mes a mes y la implantación aplica las condiciones del Caso logística (secciones 13.3 y 17.6, pp. 23 y 33). Esta sección presenta la ruta crítica, la carta Gantt, el plan de implantación, las marchas blancas, la estabilización y el momento en que se alcanza cada resultado comprometido. El detalle está en los Formularios T-14, T-15 y T-18.

7.3.1 Ruta crítica y holguras


La ruta crítica se calcula con el método de la ruta crítica sobre la red del Anexo 7.B (PMI, 2017, pp. 210–211). Una pasada hacia adelante da las fechas tempranas de cada paquete; una

Alex

pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da las tardías; LS − ES es la holgura total; la libre se mide contra el ES de los sucesores. Como los hitos del Formulario E-25 son fechas fijas, un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

El cálculo de la red vigente utiliza las 220.023 HH, los 168 paquetes con entregable, las dependencias del Anexo 7.B y diez días hábiles de revisión del CLIENTE. El T-15, sección 5, publica las fechas tempranas y tardías, las holguras y el PERT condicional. El camino que controla H12 es 4.3.1 (cierre de la marcha blanca de la Etapa 2) → 4.3.3 (acta) → revisión del CLIENTE. La garantía 4.3.4 se constituye en septiembre, en paralelo, porque es un trámite financiero que no interviene sistemas y no tiene predecesoras. La entrega calculada es el 11 de octubre de 2028 y el acta, el 25 de octubre: quedan tres días hábiles antes del límite contractual del 31 de octubre, mes 21. Para hacer simultáneos el H12, el paso oficial a producción de la Etapa 2 y el inicio de la Operación con ambos alcances (BA, art. 17.2, punto 4, p. 13), se fija como fecha objetivo el primer día hábil del mes contractual 21 posterior al cierre comercial y contable, porque el paso a producción no puede ocurrir en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, sección 13.3, condición 2, p. 23). Bajo el supuesto de inicio en febrero de 2027, el mes 21 es octubre de 2028, sus tres primeros días hábiles son el 2, el 3 y el 4, y la fecha objetivo es el jueves 5 de octubre de 2028; desde ese día, la Operación de los meses 21 a 56 comprende ambos alcances. El 25 de octubre es el resultado de la programación aún vigente, no la fecha objetivo: la diferencia requiere reprogramar la preparación y aceptación del H12 y comprobar el calendario efectivo del contrato. La Figura 7.22 muestra el cálculo vigente, no acredita todavía el cumplimiento de la fecha objetivo.

Alex

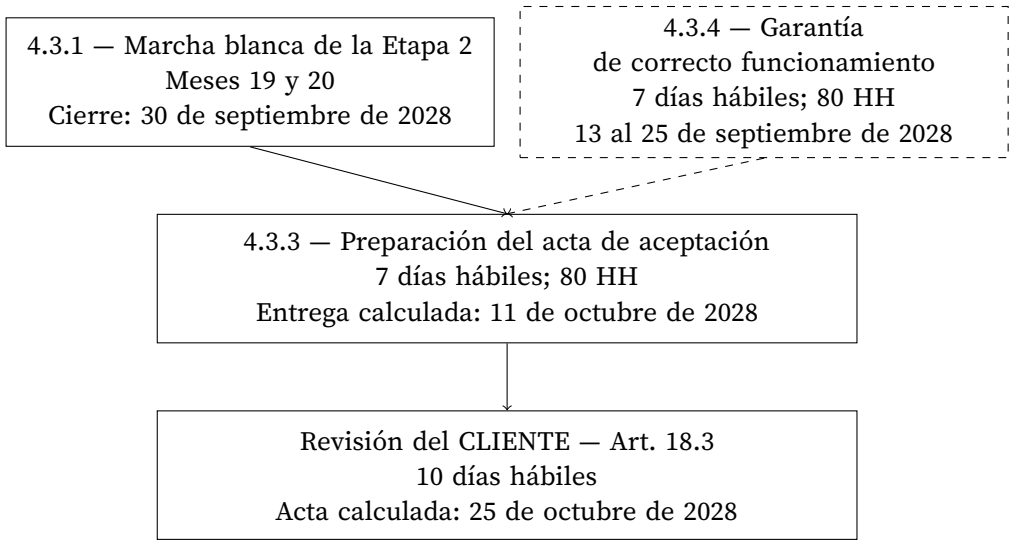

H12: límite 31 de octubre de 2028
Holgura contractual: 3 días hábiles (26, 30 y 31 de octubre).
La garantía corre en paralelo y no forma parte del camino controlante.

Figura 7.22 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

Alex

La Figura 7.22 distingue la entrega técnica del acta posterior a la revisión. Las holguras contractuales menores son las de H7 y H12, de dos y tres días hábiles; H8, H4 y H10 disponen de catorce, dieciséis y trece, respectivamente. Las fechas fijas de inicio de las marchas blancas, H6 y H11, no son reservas utilizables. Las probabilidades del T-15 son aproximaciones PERT por camino, condicionadas a duraciones, productividad y recursos; no son una probabilidad de éxito global ni sustituyen la aceptación copulativa de la marcha blanca. El modelo no acredita asignaciones nominales ni elimina los riesgos de SD8.

La holgura se gestiona en la reunión semanal y el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3). Como las holguras de H7 y H12 son menores que el plazo de subsanación, sus expedientes se revisan con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal, durante las semanas finales de cada marcha blanca; toda amenaza a esos hitos se escala al Comité Ejecutivo. Una holgura positiva tampoco autoriza consumir las cuatro semanas finales de marcha blanca. El informe mensual de valor ganado comunica toda desviación mayor al 10 % y su plan dentro de cinco días hábiles (1.8.6).

La Figura 7.23 complementa la Figura 7.22: muestra en la carta Gantt los paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta los inicios de las marchas blancas, H6 y H11, cuyas fechas son fijas.



Name	Begin date	End date
RC | 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío	01-02-27	31-03-27
RC | 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas	01-04-27	30-04-27
RC | 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica	03-05-27	31-05-27
RC | 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código	03-05-27	31-05-27
RC | 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5	03-05-27	31-05-27
RC | 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica	03-05-27	31-05-27
RC | 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala	03-05-27	20-05-27
RC | 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2	24-05-27	09-06-27
RC | 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2	10-06-27	30-06-27
RC | 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)	18-06-27	30-09-27
RC | 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4	01-12-27	31-12-27
RC | H6 — inicio de marcha blanca (mes 13)	01-02-28	01-02-28
RC | 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	15-03-28	28-04-28
RC | H11 — inicio de marcha blanca (mes 19)	01-08-28	01-08-28

Figura 7.23 Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

7.3.2 Carta Gantt y calendario

La carta Gantt del Formulario T-14 muestra las marchas blancas, los pasos a producción y el inicio de la Operación, sobre la estructura contractual de los 56 meses. La Tabla 7.5 ubica los doce hitos del Formulario E-25 con el paquete que entrega cada uno.

Tabla 7.5 Hitos del Formulario E-25 en el cronograma. Fuente: elaboración a partir del Formulario E-25 y LafroX (2026d, T-14).

Hito	Mes	Entregable que lo gatilla	Paquetes
H1	2	Línea base de alcance y matriz de trazabilidad	1.2.1, 1.2.4
H2	4	Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos aprobados	2.4.1
H3	6	Infraestructura híbrida y ambientes con observabilidad	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5
H4	10	Software de la Etapa 1 con QA superado	3.8.1
H5	12	Certificación de la Etapa 1	3.8.7
H6	13	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1	4.2.1
H8	14	Línea base y diseño de la Etapa 2	1.2.5, 2.4.2
H7	16	Paso a producción de la Etapa 1	4.2.3
H9	17	Software de la Etapa 2 con QA superado	3.9.1
H10	18	Certificación de la Etapa 2	3.9.6
H11	19	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2	4.3.1
H12	21	Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final	4.3.3, 4.3.4



La tabla está ordenada por mes y no por número de hito, porque el H8 (mes 14) ocurre antes que el H7 (mes 16). Ese cruce es la expresión concreta del solapamiento: la línea base de la Etapa 2 se aprueba mientras la Etapa 1 está en su marcha blanca.

Los meses contractuales caen en meses calendario distintos según la fecha de inicio del contrato, que aún no está definida (consulta V-12). La Tabla 7.6 aplica la regla a los tres inicios que el Capítulo 3, sección 3.1.2, considera compatibles con poner la Etapa 2 en producción antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados.

Tabla 7.6 Meses contractuales según la fecha de inicio. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17) y Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secs. 13.2 y 13.3).

Inicio	Mes 13 (H6)	Mes 16 (H7)	Meses 19 y 20	Mes 21 (H12)
Diciembre de 2026	**Diciembre de 2027**	Marzo de 2028	Junio y julio de 2028	Agosto de 2028
Febrero de 2027	Febrero de 2028	Mayo de 2028	Agosto y **septiembre** de 2028	Octubre de 2028
Marzo de 2027	Marzo de 2028	Junio de 2028	**Septiembre** y octubre de 2028	Noviembre de 2028

Ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre; el Anexo 7.A extiende el análisis a los ocho meses de inicio admisibles. Con un inicio en diciembre de 2026, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 cae en diciembre; con uno en marzo de 2027, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 cae en septiembre. Con febrero de 2027, en cambio, el congelamiento afecta solo el segundo mes de la marcha blanca de la Etapa 2 y no un inicio, por lo que LafroX lo adopta como supuesto de calendario del cronograma. Su costo es que las semanas de cierre de esa marcha blanca coinciden con el peak de septiembre, que la sección 7.3.5 trata. Dentro de un mes de congelamiento no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio, y la marcha blanca continúa en convivencia, con medición diaria.


La Figura 7.24 presenta la carta de los 56 meses con ese supuesto de inicio, elaborada en GanttProject: los períodos contractuales, las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción del 5 de mayo y del 5 de octubre de 2028 (cuarto día hábil de cada mes), el inicio de la Operación y los hitos H1 a H12.



Figura 7.24 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y LafroX (2026d, T-14).


Las Figuras 7.25 a 7.31 detallan, en siete partes, la implementación de las Etapas 1 y 2: 155 filas ordenadas por fecha de inicio, desde febrero de 2027 hasta la estabilización de la Etapa 2, con las dependencias entre paquetes visibles. Cada fila es un paquete con entregable, un grupo de paquetes que comparten fechas o un hito, separado en la entrega del expediente y el acta del CLIENTE; el prefijo RC marca la ruta crítica. Ambas cartas están también en el Formulario T-14, sección 3.



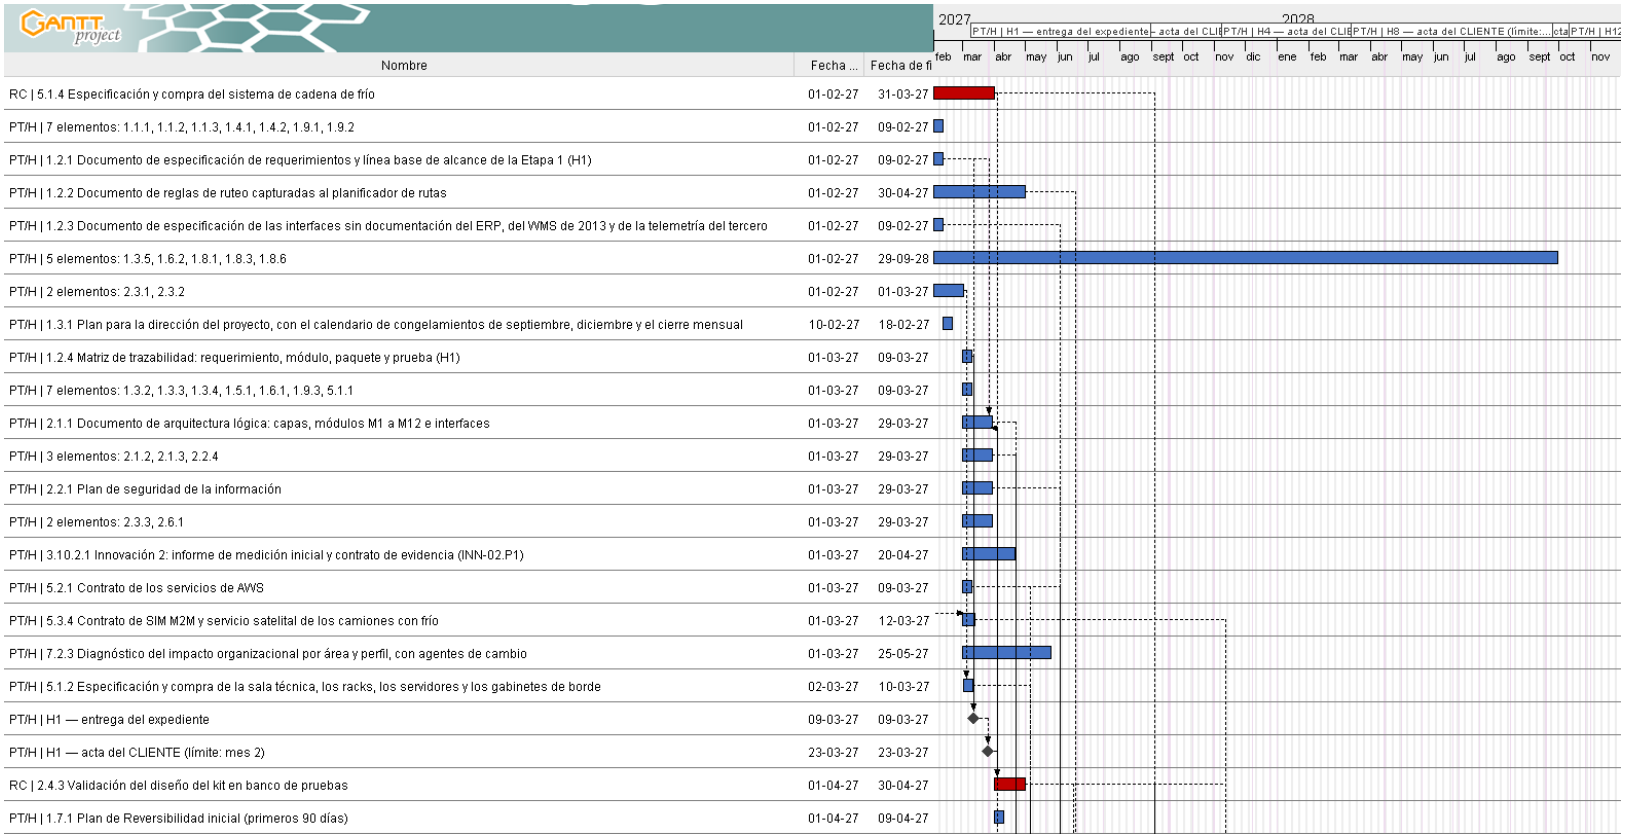


Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
RC | 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío	01-02-27	31-03-27
PT/H | 7 elementos: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.9.1, 1.9.2	01-02-27	09-02-27
PT/H | 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	01-02-27	09-02-27
PT/H | 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas	01-02-27	30-04-27
PT/H | 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero	01-02-27	09-02-27
PT/H | 5 elementos: 1.3.5, 1.6.2, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.6	01-02-27	29-09-28
PT/H | 2 elementos: 2.3.1, 2.3.2	01-02-27	01-03-27
PT/H | 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual	10-02-27	18-02-27
PT/H | 1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)	01-03-27	09-03-27
PT/H | 7 elementos: 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.9.3, 5.1.1	01-03-27	09-03-27
PT/H | 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces	01-03-27	29-03-27
PT/H | 3 elementos: 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4	01-03-27	29-03-27
PT/H | 2.2.1 Plan de seguridad de la información	01-03-27	29-03-27
PT/H | 2 elementos: 2.3.3, 2.6.1	01-03-27	29-03-27
PT/H | 3.10.2.1 Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)	01-03-27	20-04-27
PT/H | 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS	01-03-27	09-03-27
PT/H | 5.3.4 Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío	01-03-27	12-03-27
PT/H | 7.2.3 Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio	01-03-27	25-05-27
PT/H | 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde	02-03-27	10-03-27
PT/H | H1 — entrega del expediente	09-03-27	09-03-27
PT/H | H1 — acta del CLIENTE (límite: mes 2)	23-03-27	23-03-27
RC | 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas	01-04-27	30-04-27
PT/H | 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)	01-04-27	09-04-27

Figura 7.25 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

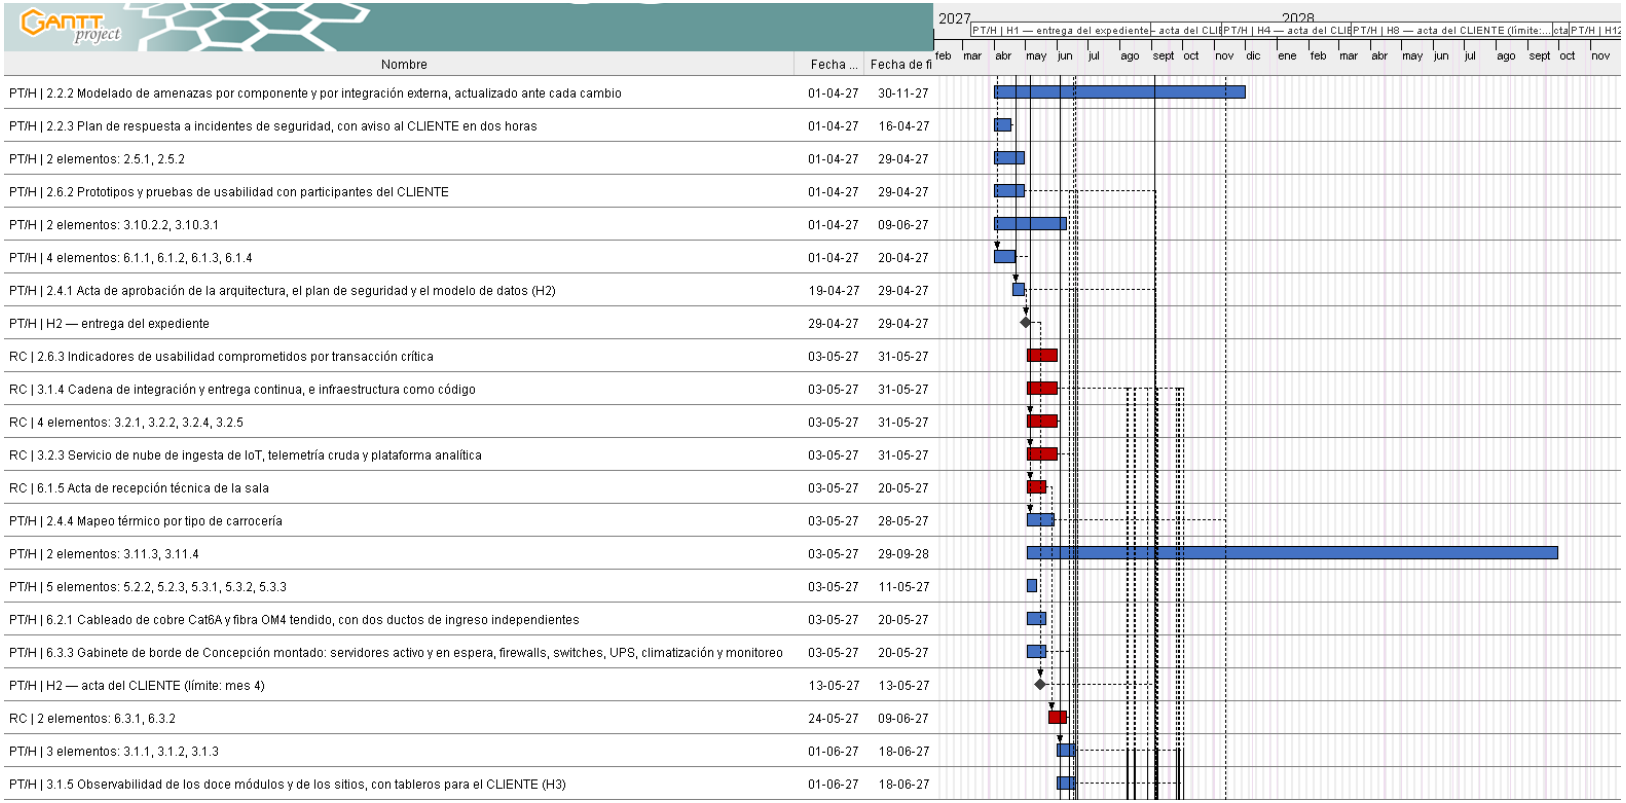

Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
PT/H | 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio	01-04-27	30-11-27
PT/H | 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas	01-04-27	16-04-27
PT/H | 2 elementos: 2.5.1, 2.5.2	01-04-27	29-04-27
PT/H | 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE	01-04-27	29-04-27
PT/H | 2 elementos: 3.10.2.2, 3.10.3.1	01-04-27	09-06-27
PT/H | 4 elementos: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4	01-04-27	20-04-27
PT/H | 2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)	19-04-27	29-04-27
PT/H | H2 — entrega del expediente	29-04-27	29-04-27
RC | 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica	03-05-27	31-05-27
RC | 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código	03-05-27	31-05-27
RC | 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5	03-05-27	31-05-27
RC | 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica	03-05-27	31-05-27
RC | 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala	03-05-27	20-05-27
PT/H | 2.4.4 Mapeo térmico por tipo de carrocería	03-05-27	28-05-27
PT/H | 2 elementos: 3.11.3, 3.11.4	03-05-27	29-09-28
PT/H | 5 elementos: 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	03-05-27	11-05-27
PT/H | 6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes	03-05-27	20-05-27
PT/H | 6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo	03-05-27	20-05-27
PT/H | H2 — acta del CLIENTE (límite: mes 4)	13-05-27	13-05-27
RC | 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2	24-05-27	09-06-27
PT/H | 3 elementos: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	01-06-27	18-06-27
PT/H | 3.1.5 Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)	01-06-27	18-06-27

Figura 7.26 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

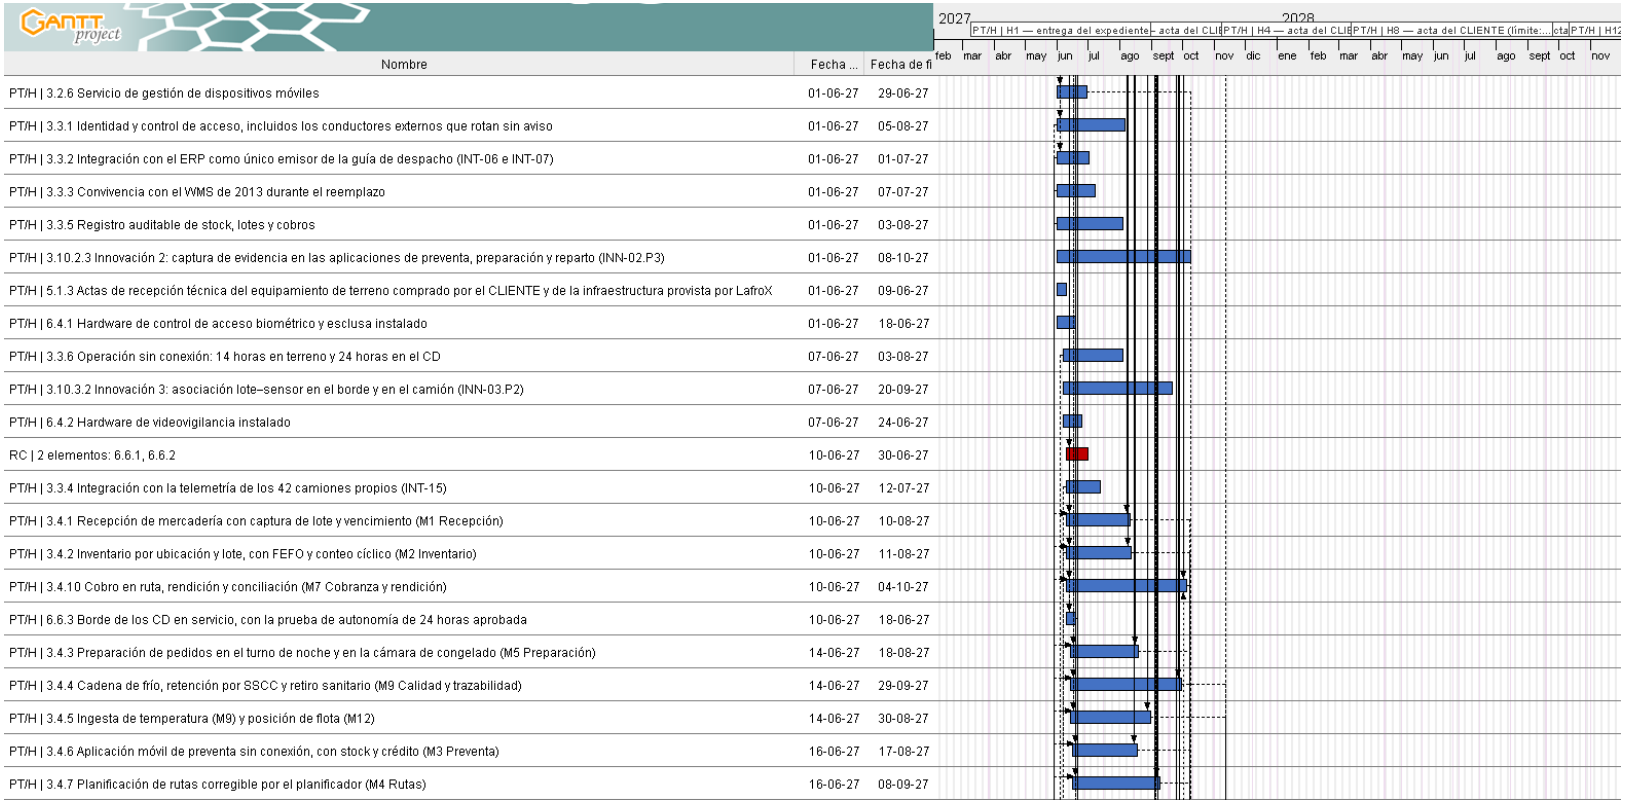

Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
PT/H | 3.2.6 Servicio de gestión de dispositivos móviles	01-06-27	29-06-27
PT/H | 3.3.1 Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso	01-06-27	05-08-27
PT/H | 3.3.2 Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07)	01-06-27	01-07-27
PT/H | 3.3.3 Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo	01-06-27	07-07-27
PT/H | 3.3.5 Registro auditable de stock, lotes y cobros	01-06-27	03-08-27
PT/H | 3.10.2.3 Innovación 2: captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3)	01-06-27	08-10-27
PT/H | 5.1.3 Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX	01-06-27	09-06-27
PT/H | 6.4.1 Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado	01-06-27	18-06-27
PT/H | 3.3.6 Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD	07-06-27	03-08-27
PT/H | 3.10.3.2 Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)	07-06-27	20-09-27
PT/H | 6.4.2 Hardware de videovigilancia instalado	07-06-27	24-06-27
RC | 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2	10-06-27	30-06-27
PT/H | 3.3.4 Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)	10-06-27	12-07-27
PT/H | 3.4.1 Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)	10-06-27	10-08-27
PT/H | 3.4.2 Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)	10-06-27	11-08-27
PT/H | 3.4.10 Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)	10-06-27	04-10-27
PT/H | 6.6.3 Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada	10-06-27	18-06-27
PT/H | 3.4.3 Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)	14-06-27	18-08-27
PT/H | 3.4.4 Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)	14-06-27	29-09-27
PT/H | 3.4.5 Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12)	14-06-27	30-08-27
PT/H | 3.4.6 Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)	16-06-27	17-08-27
PT/H | 3.4.7 Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)	16-06-27	08-09-27

Figura 7.27 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

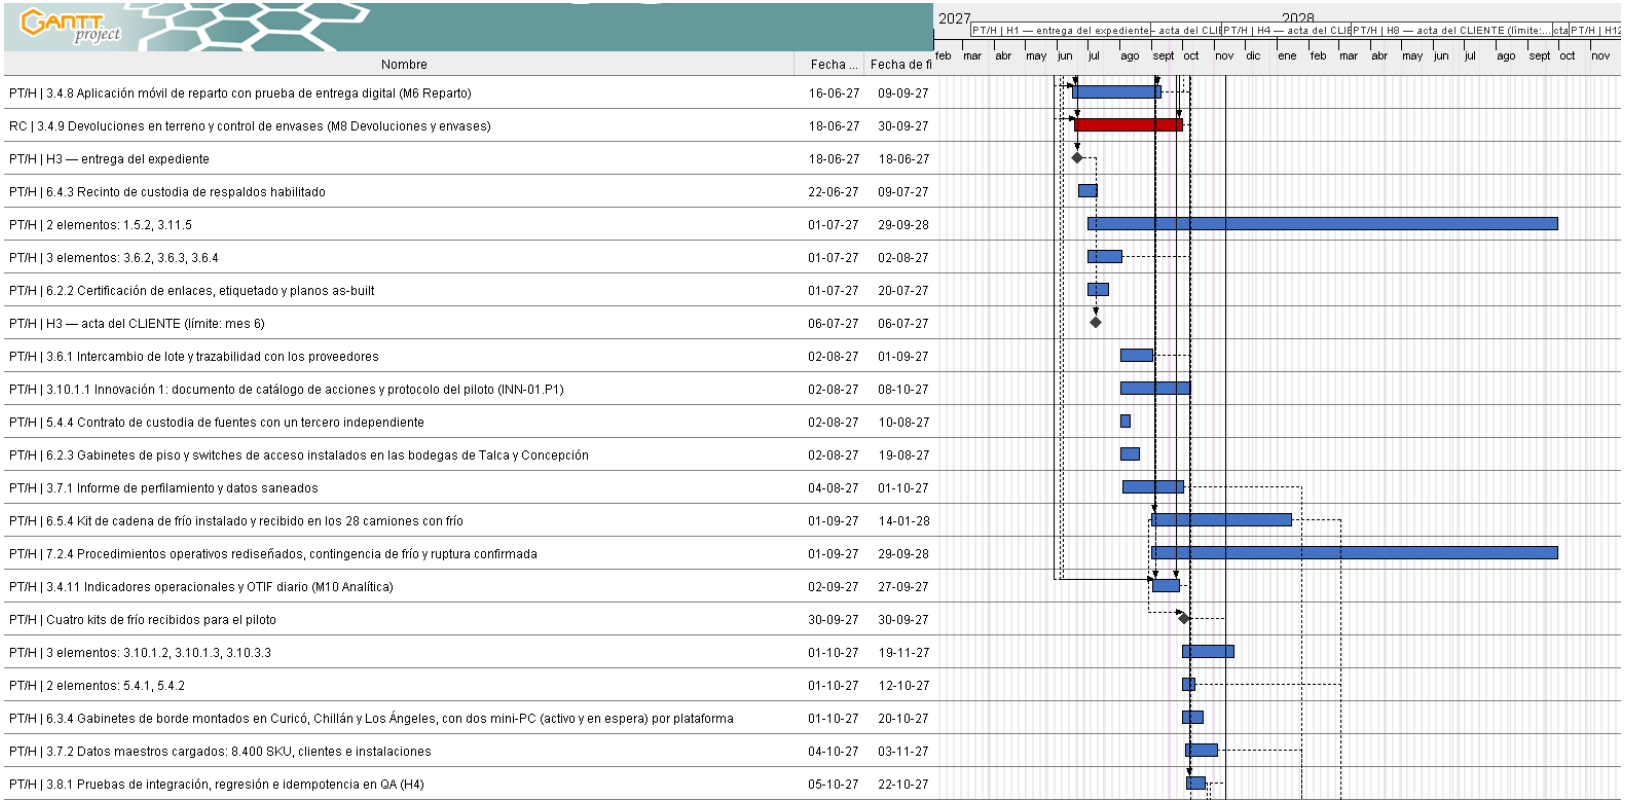


Figura 7.28 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
PT/H | 6.5.1 Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados	06-10-27	14-01-28
PT/H | 6.5.3 Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción	06-10-27	25-11-27
PT/H | 6.5.6 Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas	06-10-27	14-01-28
PT/H | H4 — entrega del expediente	22-10-27	22-10-27
PT/H | 2 elementos: 3.8.2, 3.8.3	25-10-27	19-11-27
PT/H | 4 elementos: 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8	25-10-27	11-11-27
PT/H | 3.11.2 Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño	02-11-27	29-09-28
PT/H | 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking	02-11-27	10-11-27
PT/H | 2 elementos: 7.1.1, 7.1.6	02-11-27	24-12-27
PT/H | 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales	02-11-27	31-07-28
PT/H | 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía	02-11-27	31-05-28
PT/H | 2 elementos: 6.5.2, 6.5.5	04-11-27	14-01-28
PT/H | H4 — acta del CLIENTE (límite: mes 10)	08-11-27	08-11-27
PT/H | 4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones	09-11-27	20-12-27
PT/H | 3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)	22-11-27	01-12-27
RC | 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4	01-12-27	31-12-27
PT/H | 3 elementos: 3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4	01-12-27	20-03-28
PT/H | 4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP	01-12-27	10-12-27
PT/H | 7.1.3 Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo	01-12-27	29-09-28
PT/H | H5 — entrega del expediente	01-12-27	01-12-27
PT/H | 3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento	03-01-28	27-01-28
PT/H | H5 — acta del CLIENTE (límite: mes 12)	03-01-28	03-01-28


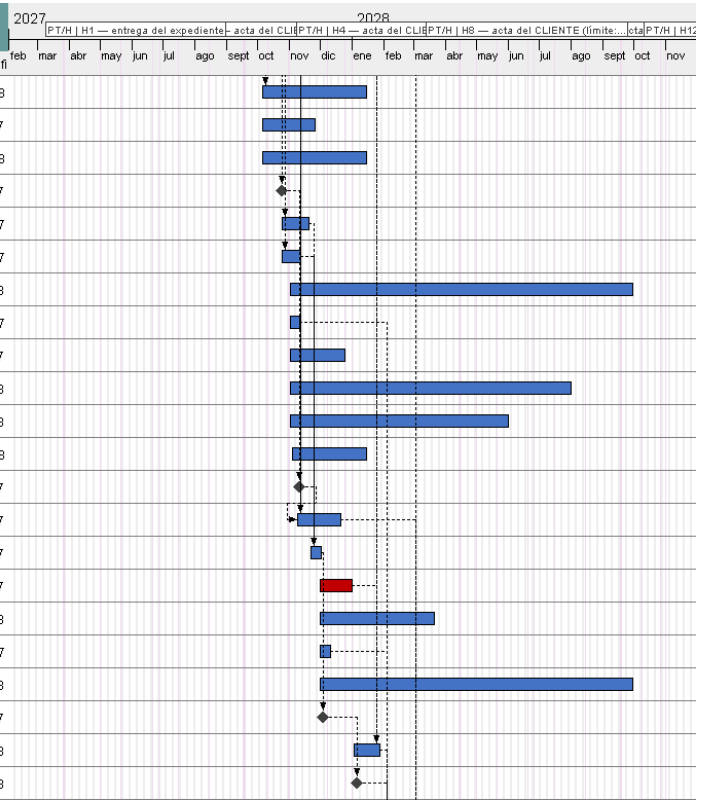


Figura 7.29 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

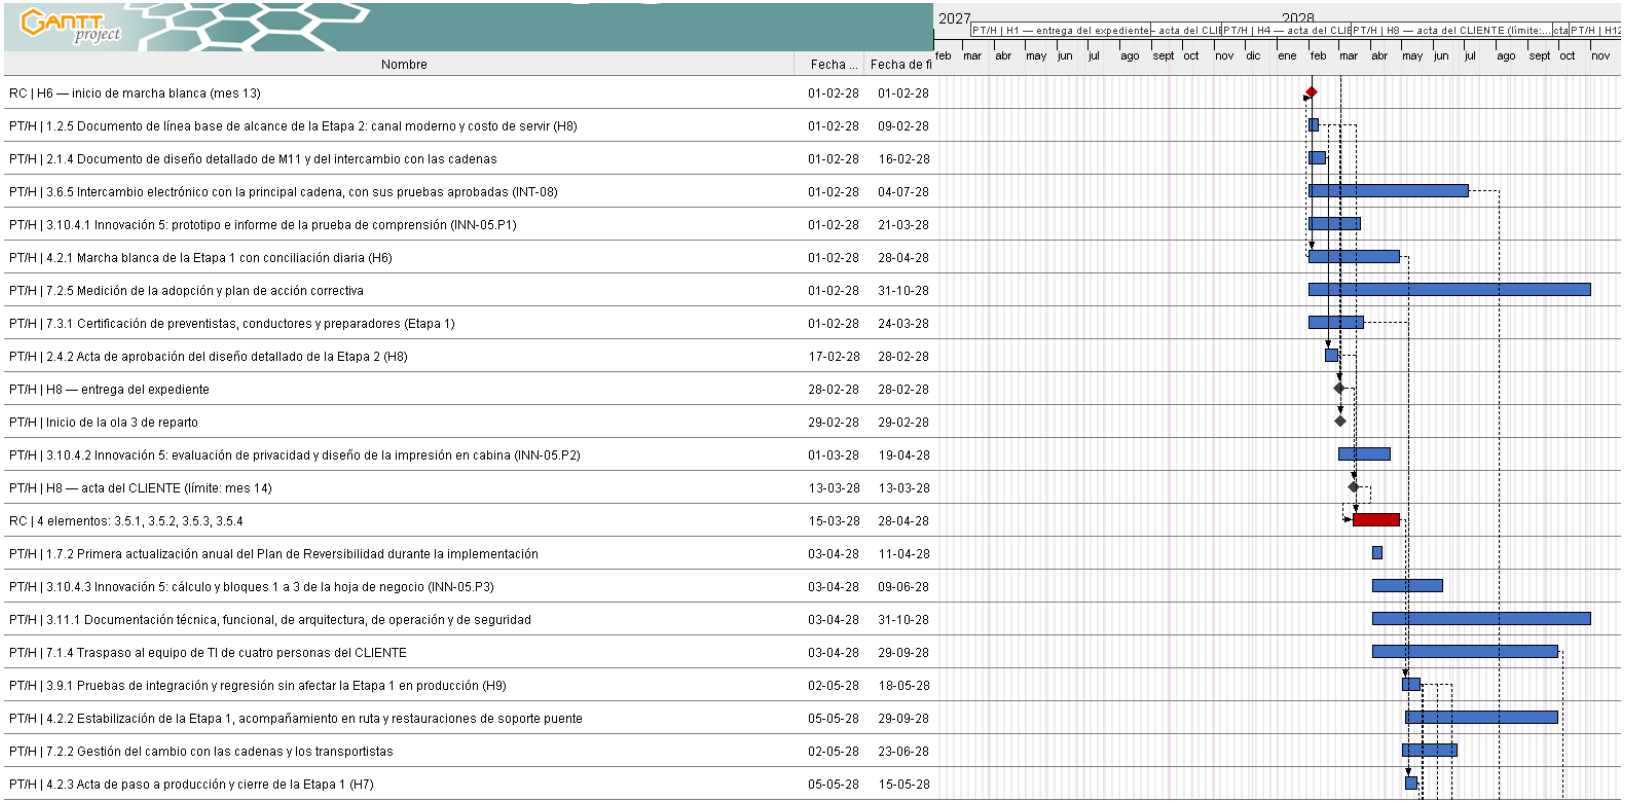

Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
RC | H6 — inicio de marcha blanca (mes 13)	01-02-28	01-02-28
PT/H | 1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)	01-02-28	09-02-28
PT/H | 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas	01-02-28	16-02-28
PT/H | 3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)	01-02-28	04-07-28
PT/H | 3.10.4.1 Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)	01-02-28	21-03-28
PT/H | 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)	01-02-28	28-04-28
PT/H | 7.2.5 Medición de la adopción y plan de acción correctiva	01-02-28	31-10-28
PT/H | 7.3.1 Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)	01-02-28	24-03-28
PT/H | 2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)	17-02-28	28-02-28
PT/H | H8 — entrega del expediente	28-02-28	28-02-28
PT/H | Inicio de la ola 3 de reparto	29-02-28	29-02-28
PT/H | 3.10.4.2 Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)	01-03-28	19-04-28
PT/H | H8 — acta del CLIENTE (límite: mes 14)	13-03-28	13-03-28
RC | 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	15-03-28	28-04-28
PT/H | 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación	03-04-28	11-04-28
PT/H | 3.10.4.3 Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)	03-04-28	09-06-28
PT/H | 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad	03-04-28	31-10-28
PT/H | 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE	03-04-28	29-09-28
PT/H | 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)	02-05-28	18-05-28
PT/H | 4.2.2 Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente	05-05-28	29-09-28
PT/H | 7.2.2 Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas	02-05-28	23-06-28
PT/H | 4.2.3 Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7)	05-05-28	15-05-28

Figura 7.30 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

Nombre	Fecha ...	Fecha de fi
PT/H | H7 — entrega del expediente	15-05-28	15-05-28
PT/H | H9 — entrega del expediente	18-05-28	18-05-28
PT/H | 3 elementos: 3.9.3, 3.9.4, 3.9.7	19-05-28	01-06-28
PT/H | 3.9.5 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente	19-05-28	26-05-28
RC | H7 — acta del CLIENTE (límite: mes 16)	29-05-28	29-05-28
PT/H | 3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)	01-06-28	23-08-28
PT/H | 4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00	01-06-28	09-06-28
PT/H | 5.4.3 Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)	01-06-28	09-06-28
PT/H | H9 — acta del CLIENTE (límite: mes 17)	01-06-28	01-06-28
PT/H | 3.9.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas	02-06-28	15-06-28
PT/H | 3.9.6 Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)	16-06-28	28-06-28
PT/H | H10 — entrega del expediente	28-06-28	28-06-28
PT/H | 3.10.4.4 Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)	03-07-28	29-09-28
PT/H | 7.3.2 Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)	03-07-28	25-07-28
PT/H | H10 — acta del CLIENTE (límite: mes 18)	12-07-28	12-07-28
RC | H11 — inicio de marcha blanca (mes 19)	01-08-28	01-08-28
PT/H | 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)	01-08-28	29-09-28
PT/H | 4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)	13-09-28	25-09-28
PT/H | 4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas	05-10-28	30-11-28
PT/H | 4.3.3 Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12)	02-10-28	11-10-28
PT/H | H12 — entrega del expediente	11-10-28	11-10-28
RC | H12 — acta del CLIENTE (límite: mes 21)	25-10-28	25-10-28

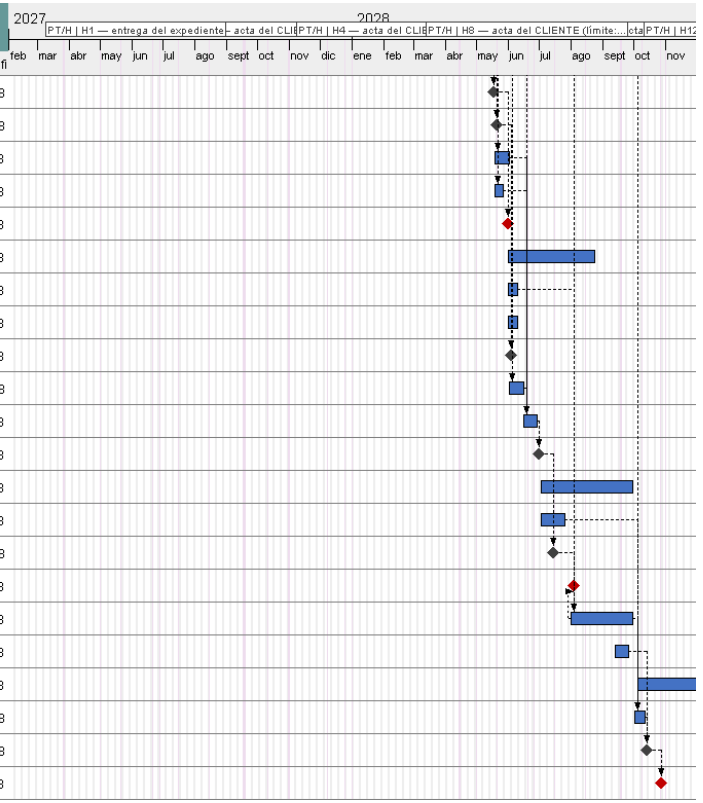


Figura 7.31 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración en GanttProject a partir de LafroX (2026d, T-14).

La carta muestra los periodos fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) mes a mes: el mes 16 es mayo de 2028 y el mes 21, octubre de 2028. La marcha blanca de la Etapa 1 (4.2.1) comienza con el H6 el 1 de febrero de 2028, y la de la Etapa 2 (4.3.1), con el H11 el 1 de agosto de 2028; como anticipa la Tabla 7.6, esta última ocupa septiembre. La fecha objetivo del H12, del paso oficial a producción de la Etapa 2 y del inicio simultáneo de la Operación con ambos alcances es el primer día hábil del mes 21 fuera de sus tres primeros días hábiles (5 de octubre de 2028 sólo bajo el supuesto de inicio en febrero de 2027). La programación de detalle calcula el acta para el 25 de octubre. La estabilización 4.3.2 comienza con el paso a producción, el 5 de octubre, y se extiende hasta el 30 de noviembre; sus cuatro semanas reforzadas, del 26 de octubre al 22 de noviembre, siguen a la firma del acta, igual que el archivo final 9.1.2. La operación supervisada de la Etapa 2 con datos y usuarios reales durante la marcha blanca no sustituye el paso oficial a producción ni el acta H12. La carta no demuestra por sí sola que la fecha objetivo se pueda cumplir.

Antes de cada paso a producción, el cronograma reserva las pruebas que exige el numeral 20.1 de las Bases Técnicas Transversales (p. 35): carga y estrés a 1,5 veces el peak, resiliencia, recuperación ante desastres con conmutación real, seguridad ofensiva y accesibilidad. Además, programa dos ensayos de migración antes de la migración definitiva. En la Etapa 1 estas pruebas forman la cuenta 3.8, se ejecutan en los meses 9 y 10 y se entregan antes del H5 del mes 12; en la Etapa 2 forman la cuenta 3.9, se ejecutan en los meses 16 y 17 y se entregan antes del H10 del mes 18 (Formulario T-15, Tabla 5.2).

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha

El piloto de cadena de frío (4.1.4) dura seis semanas en cuatro camiones, dos rurales, uno urbano y uno de transportista, entre el 9 de noviembre y el 20 de diciembre de 2027, y debe aprobarse antes de la ola de reparto. Su tramo de diciembre no interviene los sistemas vigentes del CLIENTE, porque la solución aún no está en producción y los camiones conservan sus termógrafos actuales (Caso, cap. 10, restricción 8, p. 19). Los cuatro kits piloto se reciben antes del ensayo y los 28 kits de flota quedan instalados y recibidos antes de que comience la ola 3 (6.5.4).

La implantación sigue el principio que impone el caso: nada entra en producción sin haber convivido con la forma actual de trabajar, y nada se despliega como un único evento (Caso, sección 13.3, condiciones 1 y 3, p. 23). Técnicamente, cada capacidad se publica con un despliegue azul-verde y se habilita por sitio y por ola mediante indicadores de funcionalidad (feature flags), conforme al Capítulo 4, apartado 4.2.4.1.2. Así, cada ola puede revertirse sin reinstalar y cada operación tiene un único escritor autorizado (Capítulo 4, sección 4.1.8). Ningún despliegue ocurre en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00, que no admite indisponibilidad, ni en fechas de congelamiento (Caso, Capítulo 15, RT-10.05, p. 27).

La Etapa 1 entra en tres olas, en el orden de las dependencias de datos (Capítulo 3, sección 3.4.4). La Tabla 7.7 las presenta.



Tabla 7.7 Olas de implantación de la Etapa 1. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4), y LafroX (2026s, T-18).

Ola	Procesos	Módulos	Avance	Registro oficial
1	Datos maestros y recepción con lote	M1	Por sitio	Recepciones y lotes
2	Inventario con FEFO y preparación nocturna	M2, M5	Por sitio	Stock y preparación
3	Preventa, rutas, reparto, devoluciones y rendición	M3, M4, M6, M8, M7	Por zona comercial	Pedidos, entregas y cobros

Una ola avanza a la siguiente cuando cumple su criterio durante cuatro semanas consecutivas a volumen real: sin defectos críticos ni altos, con conciliación diaria sin diferencias no explicadas, con los indicadores de disponibilidad y tiempo de respuesta cumplidos, con los usuarios certificados y con el acta de la Contraparte Técnica (Capítulo 3, sección 3.4.4).

La programación de olas usa fechas reales y no una equivalencia de meses a 13 semanas: todos los grupos deben estar operativos antes del inicio de los 28 días finales de marcha blanca. La sección 6.1 del Formulario T-18 propone Talca/Concepción/plataformas/remanentes en semanas 5/6/7/8 para la ola de reparto, subordinadas a fechas permitidas y al límite F − 28 días. Se permite superposición por dominios sin intervenir simultáneamente el mismo proceso ni doble escritura.



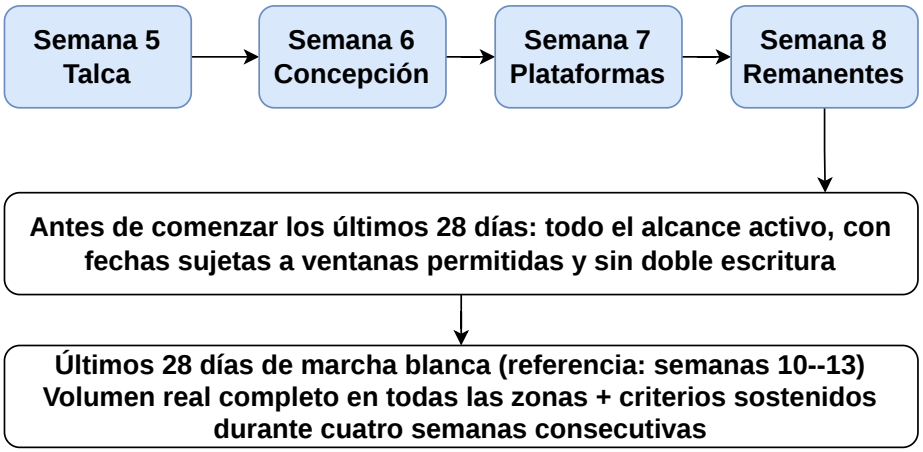


Figura 7.32 Secuencia de olas de la Etapa 1 durante la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4), y LafroX (2026s, T-18).

El avance de cada grupo exige su criterio y acompañamiento. Las cuatro semanas finales requieren todos los grupos y todo el volumen real, no una muestra. E2 habilita todas las cadenas del alcance, portales y costo de servir antes de F − 28 días y, en el ejemplo febrero 2027, antes de septiembre. La carga manual de pedidos mantiene contingencia auxiliar y no acredita intercambio electrónico ni permite excluir una cadena faltante.

La reversión tiene dos niveles, que la Tabla 7.8 distingue.

Tabla 7.8 Niveles de reversión. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4); LafroX (2026m, SD4, apartados 4.2.4.1.2 y 4.1.8); y LafroX (2026s, T-18).

Nivel	Qué hace	Quién decide	Plazo
Técnico	Devuelve el tráfico a la entrega previa por azul-verde/canario o desactiva el indicador de funcionalidad (feature flag)	Líder de Operación / SRE	Objetivo ≤10 minutos, medido en cada ensayo en Preproducción, fuera de la ventana de despacho
Operacional, Etapa 1	Conserva/restaura versión operativa local probada, único escritor y DTE válidos; papel sólo de apoyo	Responsable de operaciones del CLIENTE	Completo antes de las 05:30

continúa en la página siguiente

Tabla 7.8 — continuación

Nivel	Qué hace	Quién decide	Plazo
Operacional, Etapa 2	Desactiva la capacidad de la Etapa 2 que falla, sin tocar la Etapa 1	Responsable de operaciones del CLIENTE	Fuera de la ventana de 05:30 a 07:00

La reversión operacional se dispara con señales observables: pedidos sin sincronizar al inicio de la carga, rutas del día no disponibles o un defecto crítico en la ventana de despacho. El plazo de las 05:30 protege la salida de los 96 camiones y no es el tiempo de recuperación ante desastres. La Figura 7.33 presenta el procedimiento por rol.

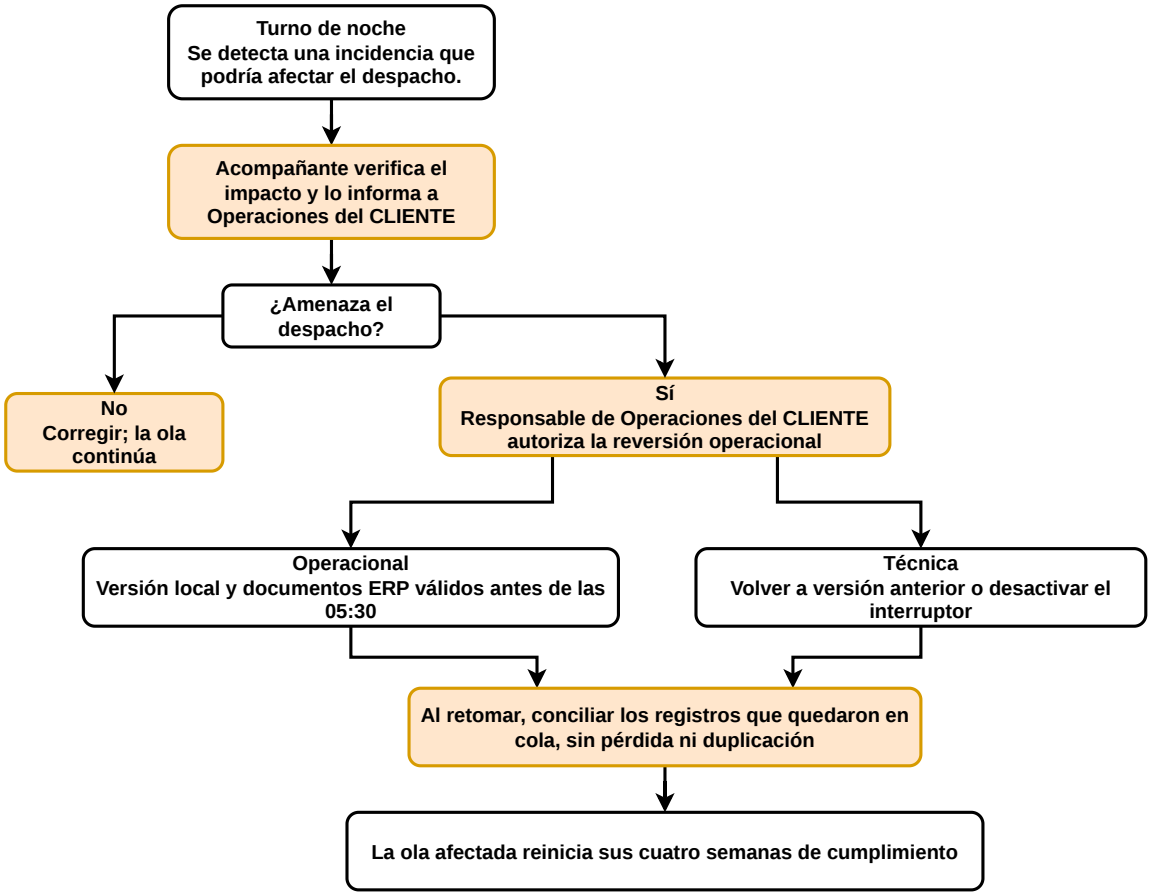


Figura 7.33 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 en la ventana de despacho. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026s, T-18).

La figura muestra que la decisión es del CLIENTE y se toma en el turno de noche, antes de que empiece el despacho. El ensayo debe comprobar que lo capturado permanece en cola y se concilia sin pérdida ni duplicación; no se presume por la descripción. Lo que se pierde es el avance de la ola, que reinicia su período de cuatro semanas (Caso, sección 17.6, punto 4, p. 33). La reversión se ensaya en Preproducción antes de cada corte (paquete 4.1.2), y en ese ensayo se mide el tiempo de cada nivel.

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1

La marcha blanca de la Etapa 1 son tres meses de operación supervisada con datos y usuarios reales, del mes 13 al 15. Convive con la operación vigente: en bodega, con la hoja de picking; en ruta, con la guía en papel; y en Talca, con el WMS de 2013 en solo lectura como respaldo de consulta. Cada día se concilian ambos registros, y toda diferencia se clasifica y explica antes del cierre del día (RT-20.03). La Tabla 7.9 presenta los indicadores que se miden y publican diariamente, con sus umbrales de cierre (RT-20.04).

Alex

Tabla 7.9 Indicadores diarios de la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17.3); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-09.01 y RT-10.05); y LafroX (2026k, SD3, Tabla 3.5).

Indicador	Umbral	Condición Art. 17.3
Incidentes críticos y altos abiertos	0	1
Transacciones de la ola registradas en la solución	100 % del volumen real durante las 4 últimas semanas	2
Indisponibilidad en la ventana de 05:30 a 07:00	0 minutos	3
Disponibilidad de la transacción crítica	99,9 % o más	3
Tiempo de respuesta, percentil 95	Línea de preparación hasta 1 s; entrega hasta 2 s; línea de preventa hasta 1,5 s; stock y crédito hasta 2 s	3
Diferencias de conciliación sin explicar	0	4
Usuarios de la ola certificados	100 %	5

Los indicadores reproducen las condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) con umbrales que se pueden medir cada día, de modo que el cierre no depende de un juicio al final del período. El volumen comprometido es la operación real completa de cada proceso y no una muestra; con las cifras del caso (Caso, sección 14.1, p. 24), son cerca de 1.150 recepciones de proveedor y 260.000 líneas de preparación al mes, unos 31.000 pedidos al mes y alrededor de 1.400 entregas por día hábil, o 2.600 si las semanas de cierre coinciden con el peak de septiembre. El detalle por proceso está en el Formulario T-18, Tabla 7.3.

La sexta condición del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) es el acta de la Contraparte Técnica, que en la Etapa 1 es el H7 del mes 16. Si una condición no se cumple al término del mes 15, la marcha blanca se extiende a costo de LafroX, sin mover las fechas siguientes (BA, art. 17.3, p. 13). La Figura 7.34 resume el ciclo diario de control; las condiciones de cierre se enumeran debajo.

Alex




Figura 7.34 Ciclo diario de la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17.3, p. 13) y Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-20.04, p. 35).

El ciclo de la Figura 7.34 se repite cada día: se miden los indicadores y se concilian los registros, se comparan los resultados con sus umbrales, se decide entre continuar, corregir o revertir y se publica el resultado diario. Si una incidencia amenaza de inmediato el despacho, se activa el procedimiento de reversión de la Figura 7.33 sin esperar la publicación diaria.

El cierre exige cumplir simultáneamente las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13):

1. Cero incidentes críticos o altos abiertos.
2. Volumen real completo durante las últimas cuatro semanas.
3. Sin indisponibilidad en despacho; disponibilidad y respuesta dentro de umbral.
4. Sin diferencias inexplicadas ni pedidos perdidos o duplicados.
5. 100 % de usuarios capacitados y certificados.
6. Acta de aceptación de la Contraparte Técnica (H7).

Ninguna de estas condiciones compensa a otra.

La capacitación se hace en el puesto y en la ruta con las cuatro modalidades del artículo 90.2 de las Bases Administrativas (p. 45). Cada perfil se certifica antes del cierre, porque el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige que el personal del CLIENTE esté «capacitado y certificado conforme al plan de capacitación aprobado», y los usuarios administradores y el equipo técnico del CLIENTE se certifican además conforme al artículo 90.4 de las Bases Administrativas (p. 45). Los perfiles operativos, tomados del Capítulo 3, Anexo 3.I (LafroX, 2026j), son 120 preparadores, con un tutor por turno y un aprendizaje en el puesto de dos horas como máximo; 62 preventistas, en su propia ruta; 84 integrantes de la tripulación propia; y cerca de 160 conductores de transportistas, que se incorporan en el andén al asignarse a una ruta.

La adopción se mide por perfil y por ola, y si una ola no alcanza la meta, no avanza y se extiende el acompañamiento. La respuesta es distinta según el grupo: el personal con veinte o treinta años en la compañía recibe acompañamiento individual y reconocimiento formal de su conocimiento, y el personal rotativo de preparación cuenta con un tutor por turno (Formulario T-18, secciones 2.7 y 2.8).

Alex

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia

La marcha blanca de la Etapa 2 dura los meses 19 y 20 y convive con la Etapa 1 en producción. La regla central del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) es que exista una única fuente de verdad para los datos compartidos: la Etapa 2 lee y extiende los pedidos, clientes, guías y entregas de la Etapa 1, sin copiarlos ni digitarlos de nuevo, y ningún despliegue de la Etapa 2 modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1 ni ocurre en la ventana de despacho.

Esta marcha blanca dura unas 8,7 semanas (2 × 52 / 12). Como el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige volumen real en las cuatro últimas, todas las cadenas certificadas, los portales y el costo de servir deben quedar habilitados en las primeras 4,7 semanas. Con el inicio supuesto de febrero de 2027, el mes 19 es agosto y el mes 20 es septiembre de 2028, de modo que toda habilitación ocurre en agosto, antes del congelamiento del 1 al 25 de septiembre. Las semanas de cierre se miden con el volumen del peak de Fiestas Patrias, cerca de 2.600 entregas diarias, en el primer septiembre de la Etapa 1 en producción. Durante el congelamiento se aplica continuidad previamente autorizada por el CLIENTE; la sección 6.4 del Formulario T-18 no presume que un cambio de configuración esté exento de las prohibiciones. La capacidad para ese peak se demuestra antes del H11 con la prueba de carga a 1,5 veces el peak, con ambas etapas activas (paquete 3.9.3; Formulario T-18, sección 3.1).

A los indicadores de la Tabla 7.9 se suman los propios del alcance de la Etapa 2: los pedidos de las cadenas certificadas recibidos por vía electrónica, los avisos de despacho dentro de dos minutos, las entregas con costo de servir calculado y la ausencia de degradación de los indicadores de la Etapa 1 (Formulario T-18, sección 3.3). La Figura 7.35 muestra cómo fluyen los datos entre ambas etapas.



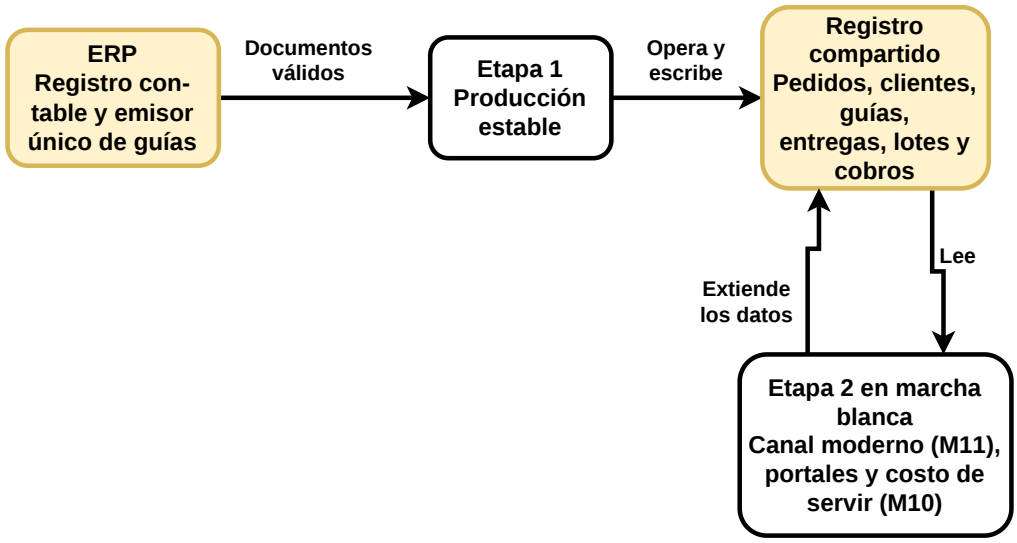


Figura 7.35 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026m, SD4, arquitectura lógica).

Se mantiene una sola fuente de verdad y un escritor autorizado por dato. La Etapa 2 no duplica datos ni modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1. Lee el registro único y lo extiende con sus propios datos, de modo que no existe una doble digitación que conciliar. El ERP se mantiene como registro contable y único emisor de la guía de despacho para ambas etapas. El paso a producción del mes 21 es la aceptación final de la implementación (H12) y el inicio de la Operación con ambos alcances (BA, art. 17.2, punto 4, p. 13).

7.3.6 Estabilización y transferencia

Después de cada paso a producción hay una estabilización de cuatro semanas por ola, con atención reforzada y sin costo adicional (RT-20.06). La dotación se deriva de la operación del caso, como muestra la Tabla 7.10.

Tabla 7.10 Estabilización por ola. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4).

Frente	Personas	Cálculo
Bodega, turno de noche	2	1 por centro de distribución
Plataformas de cross-docking	3	1 por plataforma
Calle	7	158 rutas diarias / 24 días de lunes a sábado ≈ 6,6

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Frente	Personas	Cálculo
Coordinación	1	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Las siete personas de calle permiten acompañar cada una de las 158 rutas diarias (96 camiones y 62 preventistas) al menos una vez en las cuatro semanas. Si la ola cubre una sola zona, la dotación se reduce en proporción a sus rutas, y la dotación decrece según la curva de adopción, como exige el RT-20.05.

La operación se transfiere al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE antes del mes 21, con procedimientos documentados y ensayados y con la base de conocimiento. Sigue una mentoría de seis meses (paquetes 7.1.4 y 8.5.2; RT-22.07). Quedan como servicio permanente de LafroX durante los 36 meses los que el Capítulo 3, sección 3.4.5, le asigna: el centro de operaciones, la mesa de servicio, la gestión de incidentes, la continuidad, la seguridad y el mantenimiento.

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos

El Caso logística exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado de aceptación (Capítulo 18, p. 34). La Tabla 7.11 agrupa los dieciséis resultados por momento; el detalle por resultado está en el Anexo 7.C.

Tabla 7.11 Momento de los resultados de aceptación del caso. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, Capítulo 18); LafroX (2026j, Anexo 3.J); y LafroX (2026t, Anexo 7.C).

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15)	R18-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 y 16	12	H7 (mes 16)
Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20)	R18-11 y 13	2	H12 (mes 21)
Tramos durante el contrato	R18-04: OTIF de 90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y 95 % en el mes 32	1	Revisión mensual en comité

continúa en la página siguiente



Tabla 7.11 — continuación

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Provisional y final	R18-12: provisional en la marcha blanca de la Etapa 1 y final tras 12 meses de operación	1	H7 y operación

Doce de los dieciséis resultados se aceptan en la marcha blanca de la Etapa 1. Otros dos también se verifican allí: R18-04, con su tramo del mes 15, y R18-12, de forma provisional. Son catorce resultados con verificaciones en ese período, conforme al Anexo 7.C y al Formulario T-18. Por eso el volumen real y la certificación de usuarios de ese período son la principal concentración de riesgo de aceptación del proyecto, y por eso el plan dedica a esa marcha blanca su mayor dotación de acompañamiento.

Las innovaciones también tienen su momento en el cronograma (BA, art. 29, punto 4, p. 19), como resume la Tabla 7.12.

Tabla 7.12 Innovaciones en el cronograma. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026t, Anexo 7.D).

Innovación	Paquetes de la EDT	Meses	Hito
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	3.10.1.1 a 3.10.1.4	7 a 15	H4, H5 y marcha blanca E1
2 · Reproducción de incidentes de terreno	3.10.2.1 a 3.10.2.4; 8.3.1	2 a 15; 21 a 56	H4 y marcha blanca E1
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	3.10.3.1 a 3.10.3.4; 8.3.2	3 a 15; operación	H4, H5 y marcha blanca E1
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	5.4.3; 8.3.3; 8.3.4	17 a 20; 21 a 23; 24 a 56	Hito mensual
5 · Hoja de negocio del almacenero	3.10.4.1 a 3.10.4.4; 8.3.5; 8.3.6	13 a 27	H9, H10 y H12

Tres innovaciones se validan en la marcha blanca de la Etapa 1. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2, y la innovación 4 empieza a liquidar recién desde el mes 24, después



de una línea base y tres liquidaciones en sombra. Así, ninguna innovación agrega trabajo a la cadena casi crítica de la Etapa 1 después del H4.

7.3.8 Base de planificación y recursos


El Formulario T-15, sección 4, estima las horas de los 227 paquetes con tres valores (optimista, más probable y pesimista) por clase de tamaño, y separa las curvas mensuales de implementación, soporte puente de la Etapa 1 y Operación. La cobertura del centro de operaciones, la mesa de servicio y el SOC sigue las posiciones dimensionadas en el Capítulo 4, Anexo 4-W.7 (LafroX, 2026l). Con esa base, el total programado es de 220.023 HH (207.615 HH de paquetes y restauraciones previas a Operación, 9.336 HH de soporte puente de la Etapa 1 y 3.072 HH de reserva del frente de construcción y de calidad) y el máximo mensual es de 64 personas equivalentes en el mes 16, cuando el paso a producción de la Etapa 1 coincide con las pruebas de la Etapa 2. La sección 5 del mismo formulario calcula la red y el PERT sobre esa línea base, con feriados y revisiones del CLIENTE; la asignación nominal de personas se confirma antes del H1, y la curva expresa demanda, no disponibilidad acreditada. Las capacidades protegidas de la Etapa 1 no se prestan al desarrollo de la Etapa 2.

La gestión del plan sigue el Capítulo 6: la sección 6.1 fija el PMBOK adaptado, el tablero Kanban, el valor ganado y el control de cambios, y la sección 6.2 fija el proceso RUP iterativo con DevSecOps. La Construcción avanza en las iteraciones definidas en la sección 6.2, con revisión semanal de avance y bloqueos y una demostración de incremento verificable al cierre de cada iteración; una demostración no implica un paso a producción. El Jefe de Proyecto registra la capacidad y los criterios de terminado antes de seleccionar el trabajo de cada iteración, y los cambios se aprueban según la sección 6.1.4.

El cronograma rector usa meses contractuales 1 a 56. El Anexo 7.A traduce esos meses a fechas con un inicio supuesto en febrero de 2027; cuando el CLIENTE confirme la fecha de inicio (consulta V-12), se recalculan los meses calendario y los congelamientos antes de aprobar cada corte. La revisión de parámetros de la Innovación 3 (paquete 8.3.2) se ejecuta en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56.

El Formulario T-18, sección 6, define la cobertura por ola de M9, M12 y M10, propone Talca como sitio piloto, ordena las olas por sitio, por rutas y por certificación de cadenas, declara la estabilización de la Etapa 2 y el soporte de la Etapa 1 en los meses 16 a 20, y fija un objetivo de 40 minutos para el ensayo de reversión. El corte exige un ensayo con volumen real y la contingencia tributaria; el respaldo manual por sí solo no sustituye ese ensayo para los 96 despachos. El WMS queda en modo de solo lectura conforme al supuesto S-14.

El Anexo 7.F traslada al Capítulo 8 los supuestos, disparadores, responsables y paquetes de la planificación. La regla de precio es única en la oferta: el precio acordado al capturar el pedido (LafroX, 2026h, Anexo 2.2, S-09; RF-03.11 y RF-03.12). La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) está dimensionada en los Anexos 4-I y 4-W (LafroX, 2026l). El máximo de cuatro mensajes por línea incluye una holgura porque la retención consumida no se libera. La proporción de líneas con más de una retención se mide con AL-STOCK-01 antes del H4, y la carga y el drenaje se verifican en 3.8.4 y 3.9.3, sin sumar la coordinación al drenaje



tras un corte. El RPO ≤ 15 min se cumple con fibra, LTE y Starlink. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes de reponer alguno es una condición técnica de continuidad y recuperación desarrollada en el Subdocumento 4, apartado 4.3.2.4, y verificada mediante AL-DR-01. Esta verificación incluye las alarmas de retraso a 5 y 15 min, la reposición del enlace y la medición del RPO y el RTO en conmutación real antes del H5 y del H10. La preemisión de guías y el NAS WORM local apoyan la continuidad operativa, pero no garantizan la recuperación de datos ante la destrucción del sitio.



Referencias

Las fuentes citadas en este subdocumento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026d). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026e). *Formulario T-15: Nivelación de recursos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026h). *Subdocumento 2: Resumen ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026i). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026j). *Subdocumento 3: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026k). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026l). *Subdocumento 4: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026m). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026o). *Subdocumento 6: Metodologías*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026r). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026s). *Formulario T-18: Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026t). *Subdocumento 7: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla siguiente presenta la declaración de uso de inteligencia artificial exigida por la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación. La última columna identifica a la persona responsable y los aspectos revisados en cada sección. Los niveles de uso se contrastarán con el



historial de elaboración antes de consolidar la declaración en el Formulario A-6.

Tabla 7.13 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración a partir de registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code	Borrador de síntesis de las Bases y los capítulos de la oferta	Alto	Ninguno	Leandro Chamorro: contrastó el alcance y las referencias a los capítulos con las Bases y la oferta.
7.1 EDT	Claude Code; Codex	Redacción, conteos y ajuste de las figuras de la EDT	Alto	Medio	Leandro Chamorro: comprobó la jerarquía, los conteos y la correspondencia entre paquetes y figuras.
7.2 Plan de trabajo	Claude Code; Codex	Secuenciamiento, dependencias y frentes de trabajo	Alto	Medio	Leandro Chamorro: revisó el orden de actividades, sus dependencias y la coherencia de los frentes.
7.3 Cronograma e implantación	Claude Code; Codex	Calendario, Gantt, CPM/PERT y esquemas de implantación	Alto	Medio	Leandro Chamorro: verificó hitos, duraciones y ruta crítica frente al Gantt y las etapas de implantación.

continúa en la página siguiente



Tabla 7.13 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexos 7.A a 7.F	Claude Code; Codex	Calendario contractual, dependencias, aceptación, innovaciones, trazabilidad y supuestos de riesgos	Alto	Ninguno	Tomás Pérez: revisó la correspondencia de los seis anexos con la EDT, el calendario, los hitos y las dependencias declaradas.
Formulario T-14	Claude Code; Codex	Diccionario de la EDT, ventanas y cartas Gantt	Alto	Medio	Patricio Henríquez: cotejó paquetes y criterios del diccionario con sus ventanas y la carta Gantt.
Formulario T-15	Claude Code; Codex	HH, nivelación, actividades de 8 a 80 horas, PERT y frentes	Alto	Medio	Maximiliano Miño: revisó las estimaciones de HH, la nivelación, las actividades, el PERT y los frentes de trabajo.
Formulario T-18	Claude Code; Codex	Plan de olas, marcha blanca, estabilización y reversión	Alto	Medio	Leandro Chamorro: contrastó las olas y los criterios de marcha blanca, estabilización y reversión con el cronograma.

