LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 13 — Innovaciones

Subdocumento 13 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 5


13 Introducción a las Innovaciones 6

13.1 Innovación 1 10
13.1.1 Problema u oportunidad 10
13.1.2 Tecnología, práctica o modelo 10
13.1.3 Nivel de madurez 12
13.1.4 Diseño de la incorporación 12
13.1.5 Impacto económico 14
13.1.6 Indicador de verificación 15
13.1.7 Control de adopción 16

13.2 Innovación 2 17
13.2.1 Problema u oportunidad 17
13.2.2 Tecnología, práctica o modelo 17
13.2.3 Nivel de madurez 20
13.2.4 Diseño de la incorporación 20
13.2.5 Impacto económico 22
13.2.6 Indicador de verificación 23
13.2.7 Controles de adopción y seguridad 25

13.3 Innovación 3 25
13.3.1 Problema u oportunidad 26
13.3.2 Tecnología, práctica o modelo 26
13.3.3 Nivel de madurez 29
13.3.4 Diseño de la incorporación 30
13.3.5 Impacto económico 32
13.3.6 Indicador de verificación 33
13.3.7 Controles de validación por familia y trazabilidad térmica 35

13.4 Innovación 4 36
13.4.1 Problema u oportunidad 36
13.4.2 Tecnología, práctica o modelo 36
13.4.3 Nivel de madurez 38
13.4.4 Diseño de la incorporación 39
13.4.5 Impacto económico 40
13.4.6 Indicador de verificación 41
13.4.7 Riesgo contractual de liquidación 42



13.5 Innovación 5 43
13.5.1 Problema u oportunidad 43
13.5.2 Tecnología, práctica o modelo 44
13.5.3 Nivel de madurez 45
13.5.4 Diseño de la incorporación 45
13.5.5 Impacto económico 47
13.5.6 Indicador de verificación 48
13.5.7 Control de comprensión y privacidad 50
Referencias 50
Declaración de uso de IA 52

Lista de tablas

Tabla 13.1 Cartera de innovaciones de LafroX. 8
Tabla 13.2 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 1. 11
Tabla 13.3 Paquetes de la EDT de la innovación 1. 14
Tabla 13.4 Ubicación de la innovación 1 en el flujo de caja. 15
Tabla 13.5 Indicadores de la innovación 1. 16
Tabla 13.6 Control de adopción de la innovación 1. 17
Tabla 13.7 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 2. 18
Tabla 13.8 Paquetes de la EDT de la innovación 2. 22
Tabla 13.9 Ubicación de la innovación 2 en el flujo de caja. 23
Tabla 13.10 Indicadores de la innovación 2. 24
Tabla 13.11 Controles de adopción y seguridad de la innovación 2. 25
Tabla 13.12 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 3. 27
Tabla 13.13 Paquetes de la EDT de la innovación 3. 31
Tabla 13.14 Ubicación de la innovación 3 en el flujo de caja. 32
Tabla 13.15 Indicadores de la innovación 3. 34
Tabla 13.16 Controles de validación de la innovación 3. 35
Tabla 13.17 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 4. 37
Tabla 13.18 Niveles de madurez de la innovación 4. 38
Tabla 13.19 Paquetes de la EDT de la innovación 4. 40
Tabla 13.20 Ubicación de la innovación 4 en el flujo de caja. 41
Tabla 13.21 Indicadores de la innovación 4. 42
Tabla 13.22 Riesgo contractual de la innovación 4. 43
Tabla 13.23 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 5. 44
Tabla 13.24 Paquetes de la EDT de la innovación 5. 47
Tabla 13.25 Ubicación de la innovación 5 en el flujo de caja. 48
Tabla 13.26 Indicadores de la innovación 5. 49
Tabla 13.27 Control de comprensión y privacidad de la innovación 5. 50
Tabla 13.28 Declaración de uso de IA. 52



Lista de figuras

Figura 13.1 Ubicación de las cinco innovaciones en la arquitectura. 9
Figura 13.2 Seguimiento posentrega: del dato del lote al cierre de la visita. 13
Figura 13.3 Incidente de terreno: evidencia, reproducción y cierre comprobado. 21
Figura 13.4 Historia térmica: del sensor a la decisión de Calidad. 30
Figura 13.5 Costo de servir: de los hechos a la liquidación auditable. 39
Figura 13.6 Hoja de negocio: preparación, visita sin señal y copia solicitada. 46


Introducción a las Innovaciones

Este capítulo presenta las cinco innovaciones que LafroX compromete para Distribuidora Puelche, una por cada tipo obligatorio del Artículo 28° de las Bases Administrativas (Bases Administrativas, Art. 28°, p. 19). La innovación N corresponde al tipo N. Cada una desarrolla los siete elementos del Artículo 29° (Bases Administrativas, pp. 19–20): el problema del caso con su evidencia, la tecnología o práctica que la sustenta, su nivel de madurez con fuentes, el diseño de su incorporación, su impacto económico, su indicador de verificación y su riesgo de adopción.

Las cinco se eligieron por su pertinencia al caso y no por su novedad, como pide el Art. 30.2 de las Bases Administrativas (p. 20). Cada una parte de un problema que el caso documenta con un dato o una entrevista. Cada una declara además qué parte de su ámbito ya es alcance obligatorio de las Bases o del Capítulo 3, para mostrar que lo ofertado como innovación es un agregado y no una funcionalidad exigida presentada con otro nombre (Bases Administrativas, Art. 30°, p. 20).

El capítulo se conecta con el resto de la oferta de la siguiente forma:

- **Arquitectura.** Cada innovación declara en este capítulo qué capas, componentes y módulos utiliza, como exige el RT-26.01 (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, p. 44). Esos elementos son los que definen el Capítulo 4 (capas en la sección 4.1.3, módulos en la sección 4.1.4 y emplazamiento en la sección 4.2.2) y que el Capítulo 3 resume en la sección 3.4.2. Las innovaciones reutilizan los componentes ofertados y agregan las responsabilidades funcionales y los contratos descritos en este capítulo, sin incorporar hardware adicional al Formulario T-11. El Anexo 13.B identifica los componentes utilizados. El procesamiento que agregan las innovaciones corre sobre los servicios elásticos de la plataforma analítica N-10 (S3, Glue y Redshift Serverless; Formulario T-11) y sobre recursos efímeros de QA y Preproducción, por lo que se refleja como costo operacional en el flujo de caja de cada innovación y no como capacidad fija adicional. En el borde, la innovación 3 solo acumula la carga térmica sobre las lecturas que el gateway B-02 ya recibe en cámaras y el gateway B-04 en camiones, sin agregar ingesta.
- **EDT y cronograma.** Sus paquetes están en la cuenta de control 3.10 «Innovaciones», en el paquete 5.4.3 y en la cuenta 8.3 «Innovaciones en operación» del Formulario T-14, con los meses del Anexo 7.D (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.02, p. 44).
- **Riesgos y controles.** La disputa por la liquidación del tramo variable se registra como riesgo contractual en el Formulario T-16. Las otras cuatro innovaciones se someten a controles internos de diseño, seguridad y adopción del Subdocumento 8, Anexo 8.E: se verifican antes de habilitar y no se les asigna una puntuación del registro de riesgos (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.04, p. 44).



Media firma: Alex Aravena

- **Flujo de caja.** El impacto económico se expresa por rubro, clase y mes, sin montos, porque la Oferta Técnica no puede contener cifras que permitan inferir el precio (Bases Administrativas, Art. 50.2, p. 29). La valorización se presenta en el Entregable 2 de la Oferta Económica, ítem 2.7 (Bases Administrativas, Formulario E-21, p. 71); no se presentan costos ni precios de la oferta en este capítulo.
- **Inteligencia artificial.** Ninguna innovación incorpora un modelo aprendido. Por eso no se les aplica el Capítulo 18 de las Bases Técnicas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.06, p. 44).

El detalle está en el archivo de anexos y en un formulario. El Anexo 13.A define los contratos de datos de cada innovación. El Anexo 13.B presenta la matriz de trazabilidad con la arquitectura, la EDT, los riesgos y el flujo de caja, y el alcance refinado de cada innovación con la investigación adicional que requiere. El Anexo 13.C reúne los indicadores y los riesgos en una sola vista. Las cinco fichas formales del Artículo 29° están en el Formulario T-19 (Bases Administrativas, pp. 19–20 y 64).

La Tabla 13.1 resume la cartera. La Figura 13.1 ubica las cinco innovaciones sobre las capas de la arquitectura del Capítulo 4.

Tabla 13.1 Cartera de innovaciones de LafroX. Fuente: elaboración a partir de los tipos obligatorios (Bases Administrativas, Art. 28°, p. 19), los problemas del caso (Bases Técnicas del caso, caps. 2, 4, 8, 10 y 18, pp. 4–9, 13–17, 19–20, 34–35) y la cartera y su calendario (Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

N.°	Tipo (Art. 28°)	Innovación	Problema del caso que resuelve	Se materializa
1	Producto o servicio	Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	Merma por vencimiento detectada en la góndola del cliente	Mes 16
2	Proceso	Reproducción de incidentes de terreno	Pedidos perdidos o duplicados sin señal, «semanalmente, sin medición»	Mes 5 (circuito); mes 15 (beneficio medido)
3	Tecnológica o de arquitectura	Vida útil remanente por historia térmica del lote	Excursiones de temperatura sin consecuencia conocida sobre el lote	Mes 16
4	Modelo de negocio o de contratación	Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	Costo de servir prorrateado con un criterio de 2016	Mes 21 (acompañamiento); mes 24 (primera liquidación)
5	Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social	Hoja de negocio del almacenero	Cliente sin internet que no recibe la información de sus compras	Mes 21

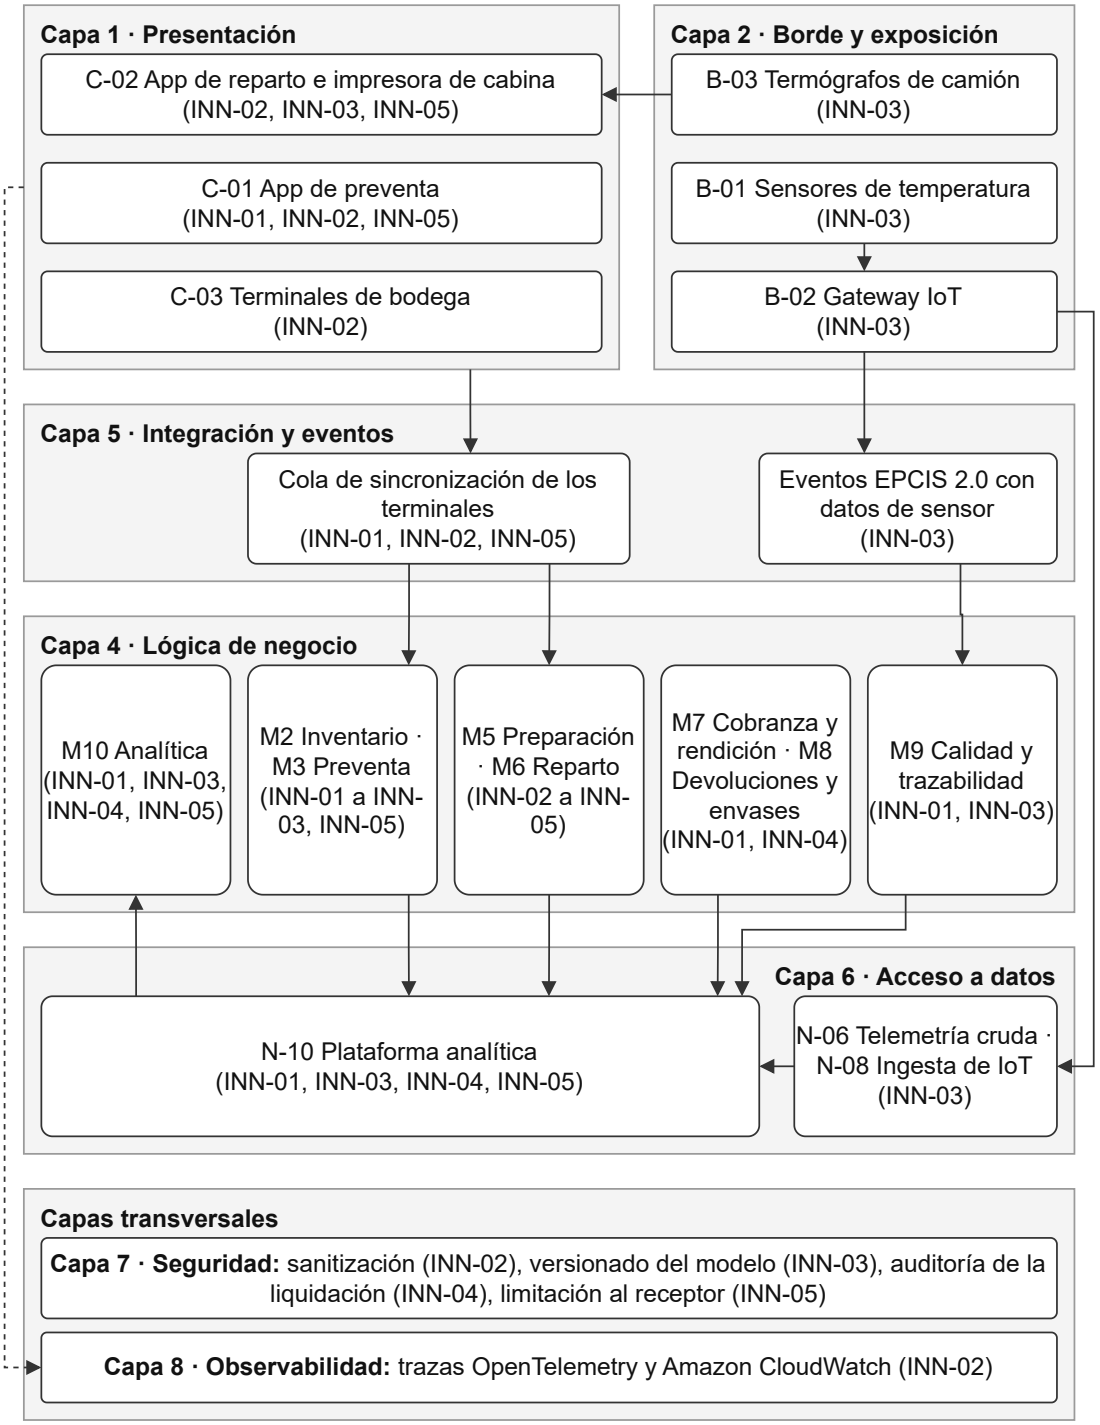


Figura 13.1 Ubicación de las cinco innovaciones en la arquitectura. Fuente: elaboración a partir de la arquitectura e inventario (Subdocumento 4, secciones 4.1.3, 4.1.4 y 4.2.2; Formulario T-11) y la inserción de INN-01 a INN-05 (Subdocumento 13, secciones 13.1.4 a 13.5.4).

La Figura 13.1 ubica las cinco innovaciones sobre las capas de la arquitectura del Capítulo 4. Cada caja es un componente o módulo ya ofertado, y entre paréntesis se indican las inno-

Alex

vaciones que lo usan. La figura muestra que las cinco innovaciones se apoyan en los mismos componentes ya ofertados. Cuatro de ellas pasan por M10 Analítica y tres por la cola de sincronización de los terminales, que es la pieza que permite trabajar sin señal. Ninguna crea un sistema paralelo: cada una agrega una regla, un contrato de datos o un circuito de trabajo sobre la plataforma del Capítulo 4. La matriz completa está en el Anexo 13.B.

La innovación 2 permite medir la reducción del tiempo de diagnóstico antes del mes 16 mediante I-02A. Con ese beneficio LafroX oferta el RT-26.08 (Bases Técnicas Transversales, RT-26.08, cap. 26, p. 45). Las innovaciones 1 y 3 verifican durante la marcha blanca sus condiciones de habilitación; sus beneficios posteriores se evalúan en los momentos definidos para cada indicador. Una condición de habilitación no se contabiliza como ahorro ya demostrado. Las innovaciones 4 y 5 dependen del costo de servir y de los canales de la Etapa 2, por lo que se materializan desde el mes 21.

13.1 Innovación 1

Tipo 1, producto o servicio: Seguimiento de vencimiento posentrega en el local (INN-01). Es un servicio que sigue los lotes de Puelche después de entregarlos. Avisa al preventista qué lotes de un local no alcanzarán a venderse antes de vencer y con qué acción autorizada puede evitarse la pérdida.

13.1.1 Problema u oportunidad

La merma por vencimiento equivale al 1,7 % del valor del inventario al año, y se detecta en el conteo, en la preparación o en la góndola del cliente (Bases Técnicas del caso, cap. 4.8, p. 9). La preventista de la zona Curicó lo confirma: ve producto vencido de Puelche en la góndola y no lo anota en ninguna parte porque no hay dónde (Bases Técnicas del caso, cap. 8, entrevista a Sandra Riffo, p. 14). El rechazo por vencimiento próximo es además causa habitual de devolución.

La solución obligatoria mide y controla la merma dentro de la bodega, pero la pérdida que ocurre después de la entrega, en el local, no tiene medición propia ni un momento en que se pueda evitar. Esa es la oportunidad que toma esta innovación.

13.1.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.2 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.2 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 1. Fuente: elaboración a partir de los requisitos de inventario, preventa, picking, devoluciones y ciclo de vida del lote (Formulario T-12; Subdocumento 3, Anexo 3.G) y la meta de merma (Subdocumento 2, Tabla 2.1).


Ya es alcance obligatorio	Dónde está
FEFO estricto en la asignación del picking	RF-05.05 (M5), RF-02.09 (M2) y RNG-10
Alerta cuando un producto en stock alcanza un umbral de vida útil remanente, en bodega	RF-02.09
Picking dirigido con causa de faltante, incluido «producto vencido»	RF-02.08
Registro de la merma ya detectada, incluida la de la góndola	RF-08.05 (M8)
Sugerencia de productos por historial de compra	RF-03.14 (M3)
Ciclo de vida del lote hasta el cliente	RF-02.10 y RF-01.03
Merma ≤ 1,0 % del inventario a 12 meses de operación	Capítulo 2, Tabla 2.1

Todo el alcance obligatorio actúa dentro de la bodega o después de que la merma ya existe. La innovación agrega el seguimiento en el local y antes de la pérdida, con una acción comercial y su cierre. Para no apropiarse de la meta de merma del Capítulo 2, la innovación no se mide con la merma de inventario, sino con el vencimiento posentrega (indicador I-01B).

La regla de cobertura compara, para cada par lote–local, la cobertura en días con la vida útil remanente del lote. La cobertura es el saldo estimado dividido por el ritmo de reposición. Sus insumos son los siguientes:

- **Saldo estimado:** se calcula con las entregas por lote y las devoluciones, y el preventista lo confirma en la visita.
- **Ritmo de reposición:** se estima con el historial de compra por cliente y producto que M3 Preventa ya mantiene para sus sugerencias (RF-03.14). Mide reposición y no venta al consumidor; por eso se confirma en la visita.
- **Vida útil remanente:** cuando el lote es refrigerado o congelado y tiene estimación de la innovación 3, se usa esa estimación; en los demás casos, la fecha impresa del lote (RF-01.03).
- **Datos insuficientes:** el aviso muestra fecha y cantidad, sin simular una predicción.

El saldo estimado nunca entra al inventario oficial ni bloquea una venta, y la disposición sanitaria sigue siendo de M9 Calidad y trazabilidad. Cada aviso trae una acción tomada de un catálogo aprobado por Comercial y Calidad del CLIENTE, como canje, rotación en la góndola o retiro, y el preventista registra la respuesta del local.



13.1.3 Nivel de madurez

La madurez se declara con la escala TRL de la Comisión Europea (European Commission, 2016). El cálculo de cobertura es aritmética conocida. Lo que decide la calidad del aviso es estimar el ritmo de reposición por local en el canal tradicional, donde las compras son irregulares.

Riesenegger et al. (2023) revisan las prácticas contra la merma de alimentos en la operación del comercio minorista: pedido, exhibición, precio y retiro de producto por vencer. Es el mismo punto de la cadena donde actúa esta innovación. Esas prácticas las ejecuta el propio comercio con sus sistemas. Lo propio de esta innovación es que el distribuidor las lleve a un almacén que no tiene sistema, a través de la visita del preventista. Por eso el servicio integrado parte en TRL 2, con dos objetivos: TRL 4 al mes 10 (cierre de los paquetes 3.10.1.2 y 3.10.1.3, con datos sintéticos) y TRL 6 al mes 15 (piloto en la marcha blanca).

Investigación adicional declarada. Falta establecer con qué precisión se estima el ritmo de reposición por local en el canal tradicional. Se investiga en el paquete 3.10.1.2 (meses 9 y 10) con datos sintéticos y se valida en el paquete 3.10.1.4 (meses 11 a 15: certificación del H5 en los meses 11 y 12, y piloto en la marcha blanca de los meses 13 a 15) con el indicador I-01A. El Anexo 8.E (CT-08) distingue la ventana del paquete completo del piloto con locales reales, que ocurre solo en la marcha blanca.

13.1.4 Diseño de la incorporación

M10 Analítica calcula la lista de avisos cada noche con datos de M2 Inventario, de M9 Calidad y trazabilidad y del historial de compra de M3 Preventa; sus datos residen en N-10 (capa 6). M8 Devoluciones y envases aporta las devoluciones por lote y su causal, que alimentan el saldo estimado y el indicador I-01C. M3 Preventa entrega la lista en la aplicación de preventa C-01 (capa 1). La lista viaja en el terminal y funciona sin señal (Capítulo 4, sección 4.1.15), y la respuesta de la visita vuelve por la cola de sincronización de M3 (capa 5). La innovación no abre una interfaz pública; su contrato de datos está en el Anexo 13.A.

La Figura 13.2 recorre el servicio desde los datos de origen hasta la verificación del beneficio en el local.

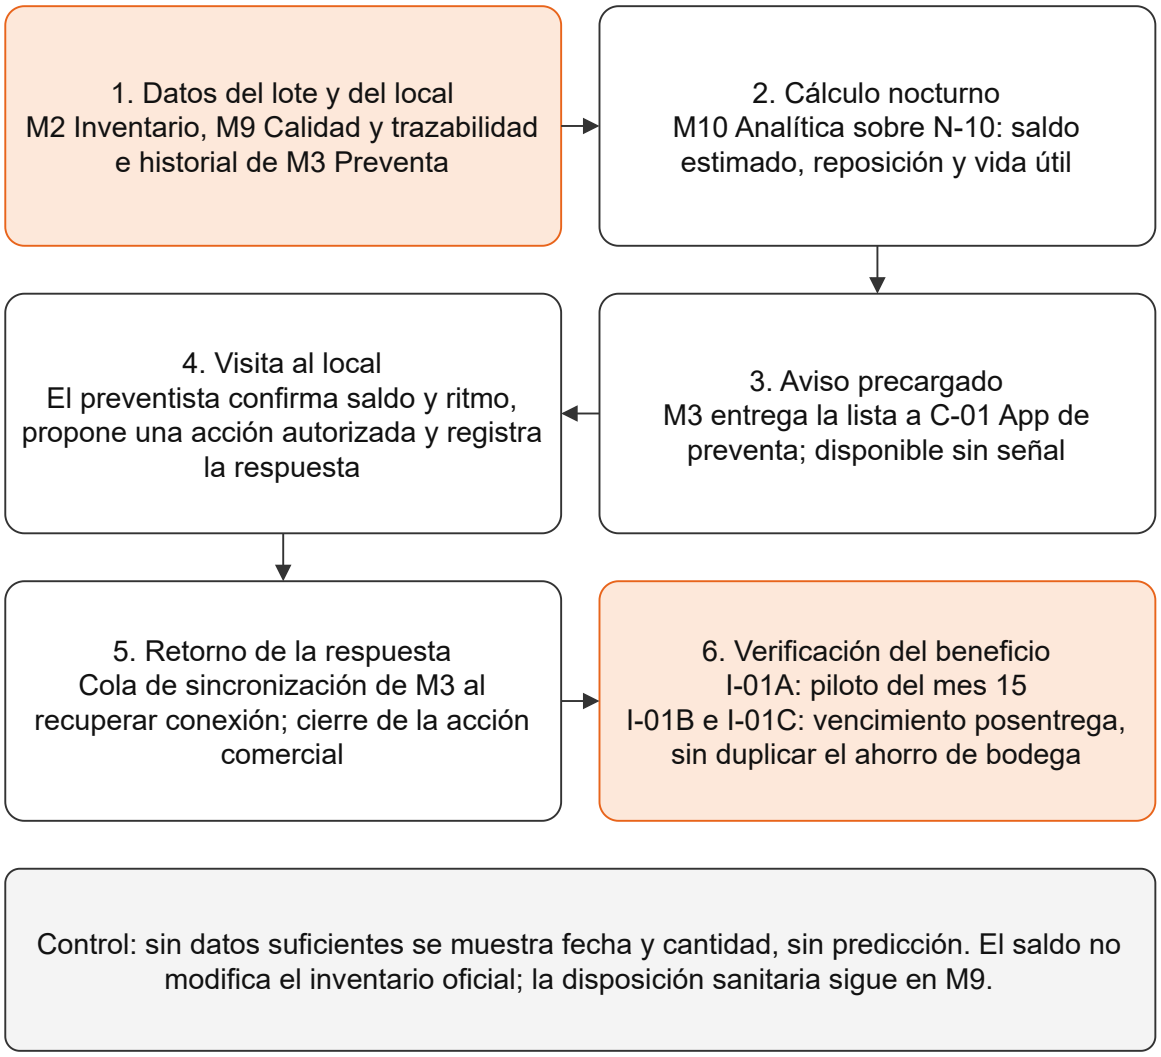


Figura 13.2 Seguimiento posentrega: del dato del lote al cierre de la visita. Fuente: elaboración a partir del diseño, calendario y controles de INN-01 (Subdocumento 13, secciones 13.1.4 a 13.1.7) y sus contratos de datos (Subdocumento 13, Anexo 13.A).

El recorrido distingue el cálculo nocturno de la confirmación en terreno. La precarga permite consultar el aviso sin señal y la cola devuelve la respuesta cuando vuelve la conexión. El cierre comercial no altera el inventario oficial ni reemplaza la decisión sanitaria de Calidad; por eso el beneficio se contrasta con vencimiento posentrega y no con la merma de bodega.

El piloto se hace en 120 locales de 12 rutas, con al menos 100 avisos evaluables. El tamaño es una decisión de diseño que permite evaluar el indicador I-01A, no una muestra representativa del canal. La Tabla 13.3 presenta los paquetes de la EDT que ejecutan la innovación.

Alex

Tabla 13.3 Paquetes de la EDT de la innovación 1. Fuente: elaboración a partir de los paquetes 3.10.1.1 a 3.10.1.4 y su calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Paquete	EDT	Meses	Entregable
INN-01.P1	3.10.1.1	7 a 9	Catálogo de acciones autorizadas y protocolo del piloto
INN-01.P2	3.10.1.2	9 y 10	Estimador de saldo y ritmo de reposición
INN-01.P3	3.10.1.3	9 y 10	Lista sin conexión y respuesta de visita en M3
INN-01.P4	3.10.1.4	11 a 15	Certificación del H5, piloto en marcha blanca e informe de habilitación

Los paquetes 3.10.1.2 y 3.10.1.3 se ejecutan del 01-10-2027 al 19-11-2027 (Formulario T-15). No forman parte de la entrega técnica del H4 (22-10-2027) ni de su acta (08-11-2027): cierran el 19-11-2027, dentro del límite contractual del H4 (30-11-2027), con siete días de holgura.

La innovación se materializa en el mes 16, con el paso a producción de la Etapa 1. La dirige el Líder de Datos, Leandro Chamorro, y Comercial y Calidad del CLIENTE validan el catálogo. En los meses 16 a 20 la innovación queda cubierta por la estabilización de la Etapa 1 (paquete 4.2.2). Desde el mes 21, su regla y su catálogo se mantienen dentro del mantenimiento correctivo y evolutivo (paquete 8.2.1); desde el mes 22, ese mantenimiento queda en el frente de Operación que dirige el Líder de Operación / SRE, Guillermo Castillo, porque la dedicación del Líder de Datos termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla 1.6). Para el control CT-08 del Anexo 8.E, Datos dirige, Implantación coordina el piloto en terreno y Calidad verifica.

13.1.5 Impacto económico

La innovación no requiere hardware ni licencias: usa la aplicación de preventa C-01 y la plataforma analítica ya ofertados. La Tabla 13.4 ubica sus rubros en el flujo de caja.

Tabla 13.4 Ubicación de la innovación 1 en el flujo de caja. Fuente: elaboración a partir de la definición económica de INN-01 (Subdocumento 13, sección 13.1.5) y su calendario (Subdocumento 7, Anexo 7.D; Formulario T-14). La valorización se presenta en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Horas de datos, desarrollo móvil y diseño del catálogo	Inversión / recursos humanos	7 a 15
Acompañamiento del piloto en terreno	Inversión / recursos humanos	13 a 15
Cálculo nocturno y almacenamiento en nube	Costo operacional	16 a 56
Mantención de la regla y del catálogo	Costo operacional / recursos humanos	16 a 56
Unidades vencidas evitadas en el local, netas de canjes y descuentos	Beneficio	Desde el mes 16; primera medición en el mes 28

En un escenario ilustrativo, si el piloto registra 100 unidades vencidas por cada 10.000 entregadas en las rutas de control, la reducción relativa del 25 % equivale a 25 unidades vencidas evitadas por cada 10.000 entregadas. Las 100 unidades son un supuesto, no un dato del Caso: la estimación se recalcula con la línea base medida. En la Oferta Económica, el beneficio se valoriza a partir de las unidades evitadas, descontando canjes y descuentos. No se suma al beneficio de la meta de merma del Capítulo 2 ni al de la innovación 3, para no contar dos veces el mismo ahorro.

13.1.6 Indicador de verificación

Las reducciones de I-01B e I-01C son metas propuestas de diseño, no mediciones obtenidas ni ahorros garantizados. El mecanismo esperado es detectar el riesgo antes del vencimiento y cerrar una acción autorizada en el local. La línea base se levanta durante la marcha blanca, en rutas de control que no reciben avisos, y el contraste del mes 28 determina el efecto observado; sin ese contraste no se atribuye ahorro a la innovación.

La Tabla 13.5 define los indicadores, con su línea base, su meta y su momento de medición.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 13.5 Indicadores de la innovación 1. Fuente: elaboración a partir de las metas y reglas de verificación ofertadas para INN-01 (Subdocumento 13, sección 13.1.6) y del problema de vencimiento (Bases Técnicas del caso, sección 4.8, p. 9).

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-01A	Avisos con riesgo confirmado en la visita / avisos evaluables	Sin medición (el servicio no existe)	≥ 70 %, con ≥ 100 avisos	Mes 15
I-01B	Unidades vencidas en el local / unidades entregadas, en las rutas de control	Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15	−25 % relativo	Mes 28
I-01C	Devoluciones con causal «vencimiento próximo» / devoluciones, en las rutas de control	Rutas de control sin avisos, meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28

I-01A es la condición para liberar el servicio al resto de las rutas: mide si el aviso acierta antes de medir si ahorra. I-01B e I-01C toman su línea base en la marcha blanca, porque el caso no desagrega el vencimiento posentrega ni la causal de devolución, y por eso la meta se expresa como reducción relativa y no como un valor absoluto. La base se mide en rutas de control, comparables en zona y canal con las rutas del piloto, que no reciben avisos durante los meses 13 a 15; así, la base no incluye el efecto de la innovación. El contraste del mes 28 se hace en esas mismas rutas, que reciben el servicio cuando se libera al resto de las rutas tras cumplir I-01A. Las reducciones del 25 % y del 20 % son metas propuestas de diseño: no provienen de una medición previa y no se cuentan como ahorro antes de su medición en el mes 28.

13.1.7 Control de adopción

El control CT-08 del Anexo 8.E verifica el catálogo y la utilidad de los avisos. Dentro del paquete 3.10.1.4 se certifica en los meses 11 y 12 y se realiza el piloto en marcha blanca en los meses 13 a 15. Para ampliar a otras rutas se exige en el mes 15 al menos un 70 % de aciertos sobre 100 avisos evaluables como mínimo; si no se alcanza, se corrige y se repite. La Tabla 13.6 detalla el tratamiento.




Tabla 13.6 Control de adopción de la innovación 1. Fuente: Subdocumento 8, Anexo 8.E, CT-08.

Causa	Control	Mitigación	Contingencia
Avisos falsos por compras irregulares del canal tradicional	CT-08	No liberar sin cumplir I-01A; mostrar la confianza de cada aviso; confirmar el saldo en la visita	Degradar a aviso solo por vida útil remanente del lote, sin estimar el ritmo
Aviso sin acción posible por falta de catálogo	CT-08	El catálogo del paquete 3.10.1.1 es condición de activación	Mantener solo el aviso informativo y escalar a Comercial

Si la innovación no rinde, la trazabilidad de lote hasta la entrega y la alerta de vida útil en bodega siguen operando, porque son alcance obligatorio y no dependen de ella.

13.2 Innovación 2

Tipo 2, proceso: Reproducción de incidentes de terreno (INN-02). Cambia cómo Puelche recupera la operación después de un fallo de terreno. El incidente se reproduce y la corrección se valida; el actor de terreno confirma que puede continuar la tarea afectada antes de cerrar el caso.

13.2.1 Problema u oportunidad

Los pedidos se pierden o se duplican por falta de señal «semanalmente, sin medición» (Bases Técnicas del caso, cap. 18, criterio 6, p. 34). La preventista cuenta que a veces el pedido no se mandó y otras se mandó dos veces (Bases Técnicas del caso, cap. 8, entrevista a Sandra Riffo, p. 14).

Estos fallos ocurren donde no se programa: en las rutas de Empedrado, Chanco, Cauquenes, Pinto y Alto Biobío, con tramos sin señal de hasta dos horas continuas (Bases Técnicas del caso, cap. 6, pp. 10–11), en la cámara de congelados, en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00 y en el peak de septiembre. Llegan a la mesa de ayuda como un relato que no se puede reproducir en un escritorio, y por eso se corrigen a ciegas y reaparecen.

13.2.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.7 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.7 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 2. Fuente: elaboración a partir de los requisitos de reconciliación, calidad y pruebas (Bases Técnicas Transversales, RT-03.12, p. 9; RT-04.03 a RT-04.05, p. 10; RT-10.07, p. 22; RT-14.06, p. 27), los requisitos ofertados (Formulario T-12), los ambientes (Subdocumento 4, sección 4.1.9) y el método de desarrollo (Subdocumento 6; Formulario T-10).

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Inyección controlada de fallas antes de cada paso a producción y semestral en operación	RT-10.07 (Bases Técnicas Transversales, cap. 10, p. 22); RNF-20.04
Pruebas de integración, regresión, idempotencia y fallas de enlace en QA, con datos controlados	Capítulo 4, sección 4.1.9
Preproducción con topología equivalente para aceptación, carga y resiliencia	Capítulo 4, sección 4.1.9
Revisión por pares, pruebas de contrato, PHPUnit, PHPStan y análisis de secretos como bloqueo	RT-04.03 a RT-04.05 (Bases Técnicas Transversales, cap. 4, p. 10); Capítulo 6 y Formulario T-10
Reconciliación determinista y bitácora	RT-03.12 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9)
Análisis de causa raíz de todo incidente crítico, con informe en cinco días hábiles	RT-14.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 14, p. 27; RF-16.04)



Todo lo anterior prueba fallas que el equipo imagina. La innovación agrega el circuito para fallas que ocurrieron en la calle, en cuatro pasos:

1. El terminal arma un paquete sanitizado con la secuencia causal del incidente.
2. Calidad lo admite y lo reproduce en QA.
3. La corrección se valida contra ese mismo paquete.
4. El escenario queda como prueba de regresión permanente.

El actor de terreno informa qué tarea quedó detenida y confirma que puede retomarla sin repetir el ingreso del pedido ni dejarlo sin conciliar. Puelche registra la hora del aviso y la hora de reanudación confirmada; el equipo técnico sigue siendo responsable de reproducir el incidente y verificar la corrección. No se cierra el caso sin ambas verificaciones.


Por qué no es práctica estándar. Las herramientas corrientes de reporte de fallos móviles registran las caídas de la aplicación y los pasos previos. El defecto típico de Puelche no es una caída: la aplicación sigue funcionando y el pedido se pierde o se duplica porque la cola local y el servidor procesaron los eventos en otro orden durante la reconexión. Ese defecto no deja rastro en un reporte de fallos. Solo se reproduce con el orden causal de la cola local, los reintentos y el estado de conectividad, que es lo que contiene el paquete de esta innovación.

Lo que agrega frente al RT-14.06. El RT-14.06 exige explicar por escrito la causa de los incidentes críticos (Bases Técnicas Transversales, RT-14.06, cap. 14, p. 27). Esta innovación cubre también los incidentes no críticos de terreno, que son los frecuentes, y cambia el criterio de cierre: no basta un informe de causa, porque el incidente se cierra cuando la corrección pasa la reproducción del caso real. El informe del RT-14.06 se alimenta del mismo paquete, sin duplicar el trabajo.

La tecnología se compone de las siguientes piezas:

- **Contrato de evidencia:** correlación seudonimizada, versión de la aplicación Kotlin, transiciones de estado, cola local, reintentos, orden causal y estado de conectividad. Excluye nombres, credenciales, firmas, fotos y contenido comercial. El detalle está en el Anexo 13.A.
- **Reproducción:** con recursos efímeros creados con Terraform dentro de QA o de Preproducción. No es un sexto ambiente: se respetan los cinco ambientes del RT-04.01 (Bases Técnicas Transversales, cap. 4, p. 10; Capítulo 4 de la oferta, sección 4.1.9).
- **Integración:** la reproducción se engancha a la cadena de GitLab CI como un trabajo más (Capítulo 6 y Formulario T-10).
- **Correlación:** la traza viaja con OpenTelemetry hacia la capa 8 de observabilidad, en Amazon CloudWatch.
- **Límites:** el frío, los guantes y la batería no se simulan; requieren prueba física con el dispositivo.

Cada ejecución de reproducción vinculada a una incidencia creará automáticamente sus recursos mediante Terraform desde GitLab CI y los destruirá al finalizar, incluso si la prueba



falla (Bases Técnicas Transversales, RT-04.14, cap. 4, p. 11). La ejecución se realizará dentro de QA o Preproducción, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, salvo ventanas de prueba programadas por el CLIENTE y la activación prevista para correcciones críticas, conforme al supuesto S-43 (Subdocumento 3, Anexo 3.C).

La práctica se apoya en la entrega continua (Shahin et al., 2017). Las métricas de tasa de fallo de cambio y de tiempo de recuperación del informe DORA (2024) se usan como referencia para comparar el diagnóstico antes y después.

13.2.3 Nivel de madurez

Las piezas por separado, la integración y la entrega continuas, los entornos efímeros y las trazas distribuidas, están en TRL 9: son prácticas de uso industrial documentadas (Shahin et al., 2017). El circuito completo incidente → paquete → reproducción → cierre, aplicado a terminales que trabajan sin señal, parte en TRL 2 en la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016). Sus objetivos son TRL 4 al mes 5, con el circuito mínimo de pérdida y retorno de red, y TRL 6 al mes 15, en la marcha blanca con incidentes reales.

Investigación adicional declarada. Falta demostrar que el paquete de evidencia reproduce los reordenamientos de la cola durante la reconexión sin competir con la sincronización de pedidos. Se investiga en el paquete 3.10.2.2 (meses 3 a 5) y se valida con incidentes reales en el paquete 3.10.2.4 (meses 11 a 15) con los indicadores I-02A e I-02B.

13.2.4 Diseño de la incorporación

La aplicación de preventa C-01 (M3 Preventa), los terminales de bodega C-03 (M5 Preparación) y la aplicación de reparto C-02 (M6 Reparto), en la capa 1, emiten la evidencia con un cupo de tamaño y frecuencia para no competir con la sincronización de pedidos. La evidencia incluye el estado de los módulos M3, M5 y M6 (capa 4) y el orden causal de la cola de sincronización de los terminales (capa 5). La capa 8 correlaciona las trazas, y la capa 7 sanitiza y controla el acceso a los paquetes. Como la innovación modifica el tratamiento de datos de la capa de seguridad, el Encargado de Seguridad de la Información, Álvaro Catalán, aprueba la sanitización con su propio modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45).

La Figura 13.3 muestra cómo un incidente real se transforma en un escenario reproducible y una prueba de regresión.

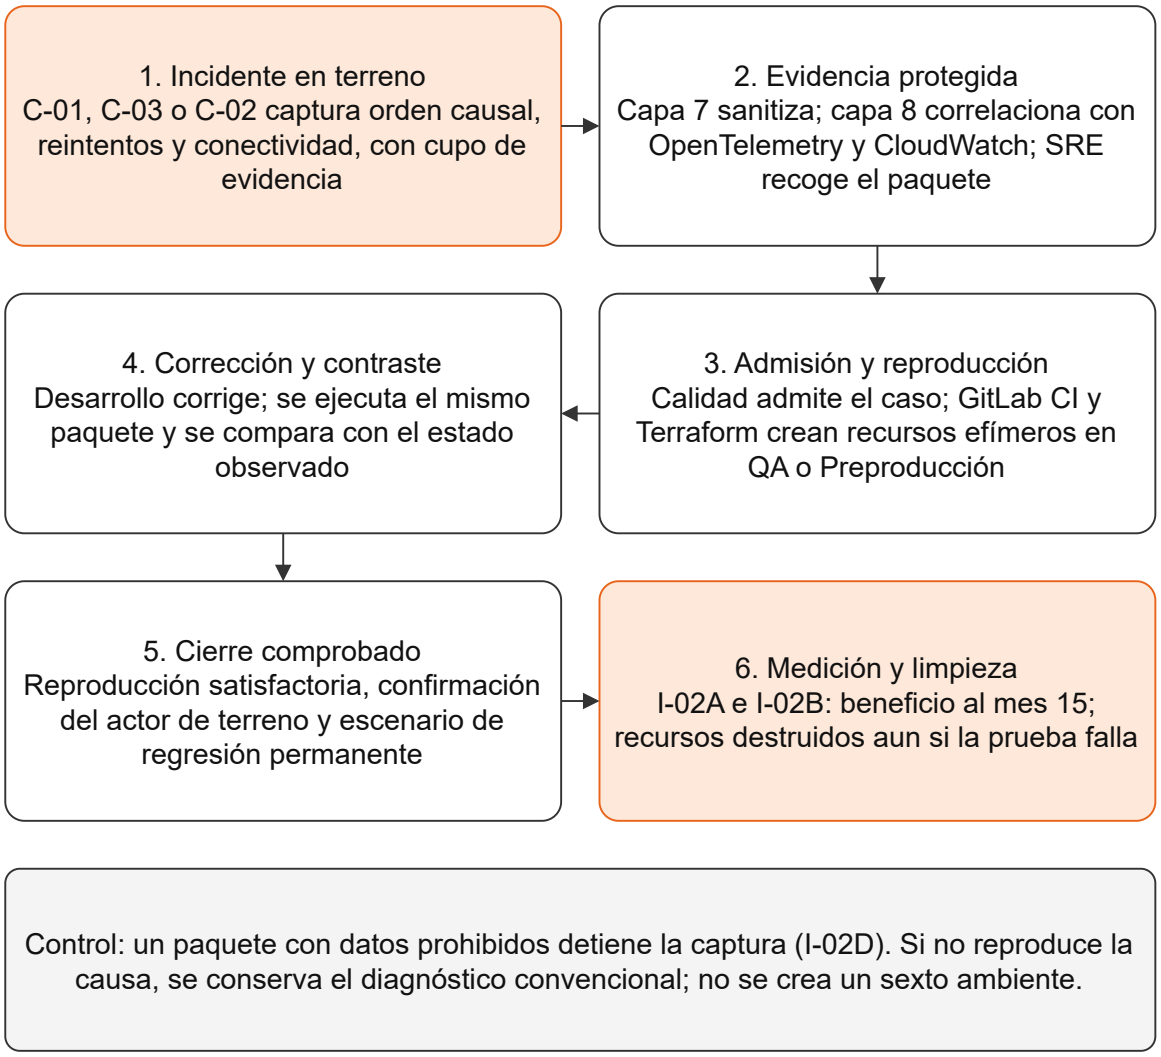


Figura 13.3 Incidente de terreno: evidencia, reproducción y cierre comprobado. Fuente: elaboración a partir del diseño, calendario y controles de INN-02 (Subdocumento 13, secciones 13.2.4 a 13.2.7) y sus contratos de datos (Subdocumento 13, Anexo 13.A).

La secuencia separa la captura por el terminal, la protección de la evidencia, la admisión por Calidad y la corrección por Desarrollo. El cierre depende de reproducir satisfactoriamente el caso y de la confirmación del actor de terreno, no solo de redactar una causa. Los recursos efímeros se destruyen al terminar incluso ante una falla; el diagnóstico convencional permanece como contingencia.

Operación/SRE recoge la evidencia, Calidad admite el paquete y Desarrollo corrige. El actor de terreno de Puelche confirma la recuperación de la tarea e informa si el pedido sigue pendiente de conciliación. La Tabla 13.8 presenta los paquetes de la EDT.

Alex

Tabla 13.8 Paquetes de la EDT de la innovación 2. Fuente: elaboración a partir de los paquetes 3.10.2.1 a 3.10.2.4 y 8.3.1 y su calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Paquete	EDT	Meses	Entregable
INN-02.P1	3.10.2.1	2 y 3	Medición inicial de incidentes y contrato de evidencia sanitizado
INN-02.P2	3.10.2.2	3 a 5	Circuito mínimo: pérdida y retorno de red en M3
INN-02.P3	3.10.2.3	5 a 10	Captura de evidencia en M3, M5 y M6 (antes del H4)
INN-02.P4	3.10.2.4 y 8.3.1	11 a 15 y 21 a 56	Validación comparada en la marcha blanca; mantenimiento de escenarios en operación

El circuito inicial se materializa en el mes 5 y su beneficio se mide en el mes 15. Los responsables son el Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, y el Líder de Operación / SRE, Guillermo Castillo, ambos con dedicación hasta el mes 56. Las correcciones las hace el equipo del Líder de Desarrollo, Tomás Pérez, hasta el mes 21, y desde el mes 22 el mantenimiento correctivo de la fase de Operación (paquete 8.2.1). En los meses 16 a 20 los incidentes de terreno se atienden dentro de la estabilización de la Etapa 1 (paquete 4.2.2), con el mismo circuito.

13.2.5 Impacto económico

La inversión instrumenta los terminales y construye el circuito; no duplica el presupuesto de las pruebas obligatorias, que siguen en la cuenta 3.8. La Tabla 13.9 ubica sus rubros en el flujo de caja.

Tabla 13.9 Ubicación de la innovación 2 en el flujo de caja. Fuente: elaboración a partir de la definición económica de INN-02 (Subdocumento 13, sección 13.2.5) y su calendario (Subdocumento 7, Anexo 7.D; Formulario T-14). La valorización se presenta en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Instrumentación de los terminales y sanitización	Inversión / recursos humanos	2 a 5
Cobertura de M3, M5 y M6	Inversión / recursos humanos	5 a 10
Validación comparada en la marcha blanca (paquete 3.10.2.4)	Inversión / recursos humanos	11 a 15
Cómputo efímero por corrida en QA y Preproducción	Costo operacional	5 a 56
Mantención de los escenarios de regresión	Costo operacional / recursos humanos	21 a 56
Tiempo de interrupción operativa evitado para Puelche	Beneficio	Desde el mes 13; primera medición en el mes 15

El beneficio para Puelche se mide en minutos de interrupción evitados, desde el aviso hasta que la persona afectada confirma que puede retomar la tarea. Si la referencia operativa resulta ser de 120 minutos por incidente y el piloto reduce ese tiempo un 30 %, el efecto ilustrativo sería de 36 minutos menos por incidente. El 30 % se usa aquí como supuesto de escenario, no como meta de interrupción ni como resultado obtenido. Las horas de diagnóstico y las regresiones evitadas son beneficios internos del proveedor. No se contabiliza como beneficio innovador el criterio del Caso de cero pedidos perdidos o duplicados.

13.2.6 Indicador de verificación

La reducción del 30 % de I-02A es una meta propuesta de diseño. Se espera reducir el tiempo dedicado a reconstruir manualmente la secuencia del incidente mediante su paquete causal. La comparación de al menos veinte pares equivalentes permite evaluar la meta; no demuestra anticipadamente que esa magnitud se alcanzará ni autoriza a descontar esfuerzo del plan.

La Tabla 13.10 define los indicadores de la innovación 2.




Tabla 13.10 Indicadores de la innovación 2. Fuente: elaboración a partir de las metas y reglas de verificación ofertadas para INN-02 (Subdocumento 13, sección 13.2.6) y del criterio 6 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35).

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-02A	Mediana de horas desde la admisión del incidente hasta la causa reproducida	Incidentes de prueba de los meses 5 a 10 en QA, diagnosticados sin el paquete	−30 % relativo, con ≥ 20 pares comparables	Mes 15
I-02B	Incidentes de terreno admitidos cuyo paquete reproduce la causa / admitidos	Sin medición (el circuito no existe)	≥ 80 %	Mes 15; trimestral después
I-02C	Incidentes reabiertos por la misma causa después del cierre	Sin medición	0	Mensual desde el mes 21
I-02D	Paquetes con datos prohibidos	Cero por diseño	0	En cada liberación

La línea base de I-02A se forma en QA con incidentes de prueba de los meses 5 a 10: fallas de enlace y de reconexión inyectadas con los escenarios del RT-10.07, que se diagnostican del modo convencional y sin abrir el paquete de evidencia, aunque el circuito ya exista desde el mes 5. No se usan incidentes de terreno, porque antes de la marcha blanca no hay operación en terreno. En el mes 15, cada incidente de la marcha blanca diagnosticado con su paquete se compara con un incidente de la línea base del mismo tipo de falla y del mismo módulo, hasta reunir al menos veinte pares. Un par se forma cuando ambos incidentes comparten tipo de falla (pérdida de enlace, reconexión con reordenamiento de la cola o reintento duplicado) y módulo (M3, M5 o M6). Calidad asigna cada par antes de conocer el tiempo de diagnóstico del incidente de la marcha blanca, y un incidente sin par no se cuenta en la comparación. La comparación de diagnóstico contrasta fallas inyectadas en QA con incidentes reales y no mide interrupción del cliente. Para estimar esta última se registran por separado incidentes operativos comparables atendidos con el proceso habitual y con el circuito, del mismo tipo y módulo. Si faltan tiempos de aviso o reanudación, o no hay incidentes comparables, no se atribuye un ahorro a Puelche. I-02D es una condición de seguridad y no de beneficio: un solo paquete con datos prohibidos detiene la captura.



13.2.7 Controles de adopción y seguridad

El Anexo 8.E distingue la fidelidad de la reproducción y el consumo del terminal (CT-09) de la sanitización previa a la exportación (CT-10). Calidad compara los casos con los incidentes observados antes de ampliar la captura. La exportación se bloquea hasta demostrar que ningún dato personal sin sanitizar sale del terminal, antes del primer uso y ante cada cambio de esquema. La Tabla 13.11 detalla el tratamiento.

Tabla 13.11 Controles de adopción y seguridad de la innovación 2. Fuente: Subdocumento 8, Anexo 8.E, CT-09 y CT-10.


Causa	Control	Mitigación	Contingencia
Reproducción artificial que no explica el incidente	CT-09	Comparar con el estado observado; revisión de muestras por Calidad	Conservar diagnóstico y regresión base con trazas protegidas; reproducción semiautomática con un paquete armado por soporte
Consumo de batería o de datos del terminal	CT-09	Cupo y frecuencia de captura	Captura solo a solicitud de soporte
Datos personales en los paquetes	CT-10	Sanitización por reglas fijas; modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45)	Suspender el conjunto afectado y producir una muestra protegida

Si el circuito no rinde, el diagnóstico convencional y las pruebas obligatorias de resiliencia siguen vigentes, y no se descuentan horas del plan por el ahorro esperado.

13.3 Innovación 3

Tipo 3, tecnológica o de arquitectura: Vida útil remanente por historia térmica del lote (INN-03). Cada lote refrigerado o congelado acumula su historia de temperatura desde la recepción hasta la entrega. Con un modelo cinético por familia de producto, la solución estima cuánta vida útil le queda realmente al lote, no solo la que dice la etiqueta.

El registro continuo de temperatura en cámaras y vehículos es alcance obligatorio (criterio 3 del caso) y no es la innovación. La innovación es lo que se construye sobre ese registro: asociar cada serie de temperatura al lote que estuvo expuesto a ella y convertirla en una vida útil remanente por lote.



13.3.1 Problema u oportunidad

Puelche maneja mil cien productos refrigerados y congelados, y hoy no existe registro continuo ni automático de temperatura en ningún punto de la cadena (Bases Técnicas del caso, cap. 4.9, p. 9). La flota con equipo de frío suma 28 camiones: 18 propios y 10 de transportistas (Bases Técnicas del caso, cap. 2.3, p. 5). El año pasado un cliente de food service rechazó un camión completo por sospecha de ruptura de la cadena de frío, y Puelche no pudo demostrar lo contrario (Bases Técnicas del caso, cap. 4.9, p. 9).

La jefa de Calidad lo plantea como pregunta: si dos grados por diez minutos es una excursión, y qué pasa con cuarenta minutos (Bases Técnicas del caso, cap. 8, entrevista a Katherine Ñanco, p. 16). La solución obligatoria ya define cuándo hay excursión: 2 °C de desviación sostenida por 15 minutos, parametrizable por tipo de producto (RF-09.05 y RF-09.10). La regla graduada del Capítulo 3 (RNG-04) deja la disposición final a Calidad. Lo que nadie define es qué consecuencia tuvo esa excursión sobre la vida útil del lote. Con ese dato Calidad decidiría entre liberar, acortar la vida útil o descartar; hoy esa decisión se toma sin él, y la fecha impresa supone una cadena de frío perfecta que nadie puede acreditar.


La pertinencia es directa: el proveedor de lácteos excluyó a Puelche de su lista de distribuidores «hasta que acredite capacidad de trazabilidad» (Bases Técnicas del caso, cap. 1, p. 3), y esa suspensión venció en septiembre de 2026 (Bases Técnicas del caso, cap. 13.2, pp. 22–23). La trazabilidad por lote que exige ese proveedor ya es alcance obligatorio; INN-03 agrega sobre ella la evidencia del efecto de la cadena de frío en la vida útil de cada lote.

13.3.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.12 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.12 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 3. Fuente: elaboración a partir de los criterios del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35), los requisitos de frío (Formulario T-12; Subdocumento 3, Anexo 3.G) y la arquitectura (Subdocumento 4, secciones 4.1 y 4.2).

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Registro continuo de temperatura en cámaras y vehículos	Criterio 3 del caso; RF-09.03 y RF-09.04 (M9)
Serie sin brechas: un intervalo sin lectura se registra como evento	RNF-09.05
Alerta en tiempo real de excursión, parametrizable por tipo de producto	RF-09.05, RF-09.10 y RF-09.11 a RF-09.14
Respuesta graduada con disposición de Calidad	RF-09.06 y RNG-04 (Capítulo 3, sección 3.2.4)
Rechazo por sospecha de ruptura y evidencia de la cadena de frío ante la autoridad y el cliente	RF-09.07 y RF-09.09
Bloqueo en el borde en menos de 5 segundos y 24 horas sin enlace; evaluación local en el camión	Capítulo 4, sección 4.2, B-02 en cámaras y kit B-03 a B-15 con C-02 en camiones; RNF-09.06 a RNF-09.09
Trazabilidad por eventos GS1 EPCIS; FEFO y alerta de vida útil remanente calculadas desde la fecha impresa	Capítulo 4, sección 4.1; RF-05.05, RF-02.09 y RNG-10



La innovación agrega una medida continua por lote, la vida útil remanente estimada, derivada de su historia térmica real. A diferencia de la vida útil remanente del RF-02.09, que se calcula desde la fecha impresa y supone una cadena de frío perfecta, esta medida descuenta la exposición térmica que el lote tuvo realmente. Para Calidad, la regla graduada y el bloqueo no cambian: la medida le da evidencia cuantitativa para disponer en la zona gris. Para la bodega, M2 Inventario y M5 Preparación reciben un orden de salida sugerido por vida útil remanente real, que Calidad habilita familia por familia; es una sugerencia y no reemplaza el FEFO del RF-05.05. Para la innovación 1, entrega una vida útil más realista.

La tecnología tiene cuatro componentes:

1. **EPCIS 2.0 con datos de sensor.** La versión 2.0 del estándar agregó la lista de elementos de sensor (`sensorElementList`) para adjuntar lecturas o resúmenes de sensor a un evento de negocio (GS1 AISBL, 2022). Cada movimiento del lote (recepción, ubicación en cámara, carga del SSCC al camión y entrega) lleva el resumen térmico del tramo: mínimo, máximo, minutos fuera de rango y carga térmica acumulada.
2. **Asociación lote–sensor por lugar y tiempo.** En cámara, el lote toma la serie del punto B-01 de su zona (21 puntos en total); en ruta, la de las sondas que lee el gateway B-04 de su camión (28 en total), con el termógrafo B-03 y el sensor independiente B-08 como respaldo. Un tramo sin dato queda marcado como tal y nunca se rellena. El modelo de datos ya contiene esta asociación temporal entre sensor y lote (Capítulo 5, sección 5.1.7).
3. **Modelo cinético por familia** (lácteos, cecinas, congelados y otras). Usa la dependencia de la velocidad de deterioro con la temperatura (Arrhenius o Q10), integrada sobre la historia real del lote. Es el principio del sistema SMAS de gestión de la seguridad de alimentos refrigerados (Koutsoumanis et al., 2005) y del FEFO dinámico en la logística de alimentos (Jedermann et al., 2014). El modelo es determinista: los parámetros vienen de la literatura y de la ficha del proveedor, y los aprueban el Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, y Calidad del CLIENTE. No es aprendizaje automático.
4. **Cálculo distribuido.** En el borde, el gateway B-02 (AWS IoT Greengrass, en los centros de distribución de Talca y Concepción) acumula la carga térmica de los lotes en cámara aunque el centro esté 24 horas sin enlace. En ruta, el gateway B-04 del camión evalúa las sondas y activa la alarma local sin red, y la aplicación de reparto C-02 evalúa por separado el sensor B-08 (Capítulo 4, sección 4.2). La alerta llega a Calidad durante la ruta por la red móvil o por Iridium; al retorno, N-10 concilia las series y calcula la carga térmica del tramo de ruta. La estimación es una proyección derivada de los eventos: se puede reconstruir con otra versión del modelo para auditoría.

El contrato de datos de la historia térmica del lote se especifica en el Anexo 13.A.

Modelo analítico y alcance propio de la incorporación. El RT-05.30 valora una capacidad analítica con modelo, variables, métrica de desempeño y plan de reentrenamiento documentados (Bases Técnicas Transversales, RT-05.30, cap. 5, p. 13). El modelo cinético, sus variables, la métrica y el plan de recalibración se ofertan como capacidad del requisito deseable, no como innovación adicional (SD3, T-12; SD5, Gestión de Datos). Lo adicional es el flujo opera-

Alex

tivo distribuido: integra la historia térmica de cada lote con el cálculo en cámara sin enlace, la reconstrucción central y su uso por Calidad y por los módulos consumidores. Su aporte se argumenta por ese recorrido operativo, no por renombrar el registro de temperatura ni por atribuir novedad a Arrhenius o Q10. Los cuatro elementos del modelo se especifican a continuación.

Modelo. La cinética de deterioro por familia, mediante Arrhenius o Q10, se integra sobre la historia térmica del lote. El cálculo es determinista y conserva la versión de los parámetros aprobados por Maximiliano Miño y Calidad del CLIENTE.

Variables. Se utilizan la serie de temperatura y el tiempo de cada tramo, la familia del producto, la vida útil nominal informada por el proveedor y los parámetros cinéticos aprobados. Los tramos sin dato se identifican expresamente y no se completan por inferencia.

Métrica de desempeño. I-03B mide la proporción de lotes cuya estimación difiere de la evaluación de Calidad en no más del 15 % de la vida nominal. La habilitación se decide por familia con la muestra y el umbral definidos en la sección 13.3.6; no se confunde esta precisión con el ahorro posterior de I-03D.


Recalibración. Al no ser un modelo aprendido, se revisan los parámetros y no se reentrena un algoritmo de aprendizaje. El paquete 8.3.2 ejecuta la revisión semestral con los lotes evaluados del período, en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56. Estos meses siguen la numeración del proyecto que usa todo el cronograma, y no un conteo desde el inicio de la Operación: caen dentro de la fase de Operación, que va del mes 21 al mes 56 (Bases Administrativas, Art. 17°, pp. 12–13), y dentro de la ventana del paquete 8.3.2 en el Formulario T-15 (meses 21 a 56). A efectos del seguimiento operacional, se considera señal de deriva del desempeño que I-03B sea inferior al 80 % en dos cortes consecutivos para una misma familia. Este umbral activa la recalibración extraordinaria de sus parámetros; no constituye por sí solo un diagnóstico de la causa de la degradación.

Al no ser un modelo aprendido, no se le aplica el Capítulo 18 de las Bases Técnicas (RT-26.06). Aun así declara línea base, métrica de desempeño y detección de deriva, como pediría el RT-18.08 a un modelo predictivo.

13.3.3 Nivel de madurez

EPCIS 2.0 es un estándar publicado (GS1 AISBL, 2022). Los modelos cinéticos de vida útil están validados experimentalmente para alimentos refrigerados (Koutsoumanis et al., 2005), y Jedermann et al. (2014) documentan el FEFO dinámico en logística refrigerada. Con la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016), la integración propuesta, con cálculo en el borde sin enlace, asociación por eventos y uso por Calidad en la operación de Puelche, parte en TRL 2. Sus objetivos son TRL 4 al mes 10 (cierre del paquete 3.10.3.3, con series y eventos sintéticos) y TRL 6 al mes 15 (marcha blanca con lotes reales).

Investigación adicional declarada. Faltan los parámetros cinéticos de cada familia para los productos que distribuye Puelche, porque la literatura entrega rangos generales. Se definen en el paquete 3.10.3.1 (meses 3 a 5) con las fichas de los proveedores y se validan con lotes reales en el paquete 3.10.3.4 (meses 11 a 15) con el indicador I-03B, con un laboratorio externo si



Calidad lo requiere.

13.3.4 Diseño de la incorporación

La Figura 13.4 distingue la captura en cámara y en ruta, la asociación al lote y el uso posterior de la estimación.

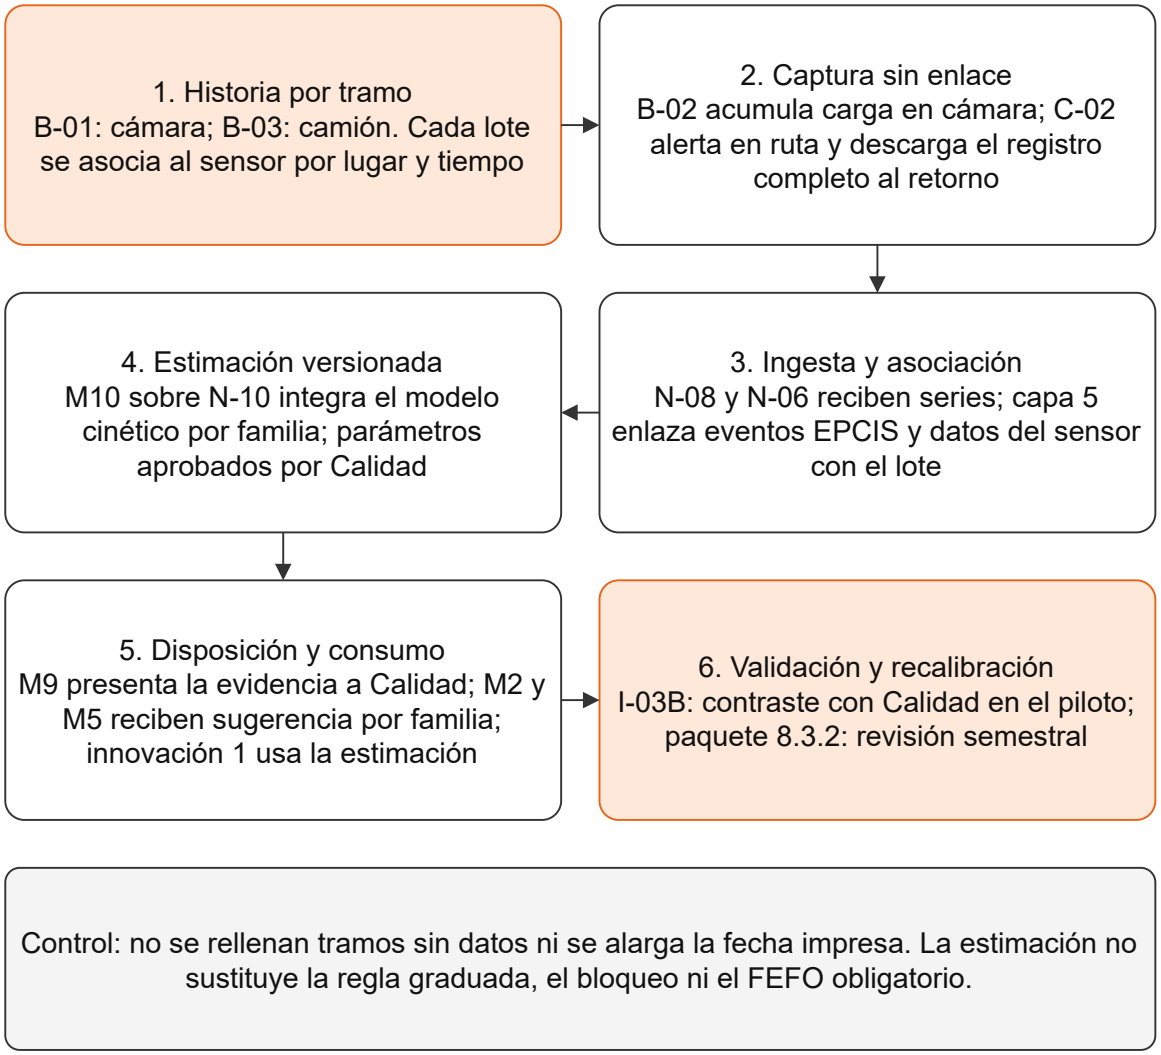


Figura 13.4 Historia térmica: del sensor a la decisión de Calidad. Fuente: elaboración a partir del diseño, calendario y controles de INN-03 (Subdocumento 13, secciones 13.3.4 a 13.3.7) y sus contratos de datos (Subdocumento 13, Anexo 13.A).

La innovación usa componentes que la arquitectura ya contiene. Los sensores B-01 y el kit de camión B-03 a B-15 son la fuente de las series; el gateway B-02 acumula la carga térmica de cámara sin enlace y el gateway B-04 la del camión. N-08 Ingesta de IoT y N-06 Telemetría cruda reciben las series y reutilizan los 30.548 mensajes y 127.848 lecturas diarias ya dimensionados para INT-05 (Capítulo 4, sección 4.2), sin agregar ingesta. La capa 5 transporta los eventos

Alex

EPCIS con datos de sensor. M9 Calidad y trazabilidad muestra la historia y la estimación, y en ella Calidad del CLIENTE dispone y, junto con Maximiliano Miño, aprueba los parámetros. M2 Inventario y M5 Preparación reciben el orden de salida sugerido, habilitado por familia. M10 Analítica, sobre N-10, ejecuta el modelo, recalcula y publica, y conserva las series cinco años. La capa 7 versiona y aprueba el modelo y sus parámetros.

La vigilancia del camión ocurre durante la ruta en B-04 y C-02, sin esperar la descarga al retorno. En cámara, B-02 acumula carga térmica sin enlace. Después, la asociación temporal y el modelo versionado producen una estimación que Calidad contrasta antes de habilitar su uso por familia. La sugerencia no sustituye el FEFO ni autoriza alargar la fecha impresa.

La Tabla 13.13 presenta los paquetes de la EDT.

Tabla 13.13 Paquetes de la EDT de la innovación 3. Fuente: elaboración a partir de los paquetes 3.10.3.1 a 3.10.3.4 y 8.3.2 y su calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Paquete	EDT	Meses	Entregable
INN-03.P1	3.10.3.1	3 a 5	Familias priorizadas, parámetros aprobados por Maximiliano Miño y Calidad del CLIENTE, y protocolo de validación
INN-03.P2	3.10.3.2	5 a 9	Asociación lote–sensor en el borde y en el camión, por eventos EPCIS
INN-03.P3	3.10.3.3	9 y 10	Vista en M9, publicación en N-10 y orden sugerido a M2 y M5
INN-03.P4	3.10.3.4	11 a 15	Certificación del H5 y validación en marcha blanca contra la evaluación de Calidad
INN-03.P5	8.3.2	26, 32, 38, 44, 50 y 56	Revisión semestral de parámetros y extensión a nuevas familias

El paquete 3.10.3.3 se ejecuta del 01-10-2027 al 19-11-2027 (Formulario T-15). No forma parte de la entrega técnica del H4 (22-10-2027) ni de su acta (08-11-2027): cierra el 19-11-2027, dentro del límite contractual del H4 (30-11-2027), con siete días de holgura.

Los lácteos son la primera familia priorizada, por la relación con su proveedor descrita en la sección 13.3.1. La innovación se materializa en el mes 16, como apoyo a la decisión de Calidad; el orden de salida sugerido se activa por familia cuando esa familia cumple el indicador I-03B. Los responsables son el Líder de Datos, Leandro Chamorro, y el Arquitecto de Solución, Bastián Trejo, con la validación del Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, y de la jefa de Calidad del CLIENTE. Desde el mes 22, las revisiones semestrales del paquete 8.3.2 se ejecutan en el frente de Operación que dirige Guillermo Castillo, y Maximiliano Miño y Calidad del CLIENTE aprueban sus parámetros, porque la dedicación del Líder de Datos termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla 1.6). Las horas del paquete se mantienen en la familia de esfuerzo

Alex

Media firma: Alex Aravena

DAT del Formulario T-15, ejecutadas por el equipo de Operación. Con el inicio supuesto en febrero de 2027 (Anexo 7.A), las revisiones de los meses 32, 44 y 56 caen en septiembre. En esos meses la recalibración se analiza sin intervenir producción, y los parámetros aprobados se activan después del día 25. En todas las revisiones, la activación evita además los tres primeros días hábiles del mes, por el cierre comercial y contable; ambas ventanas forman parte del congelamiento operacional (Bases Técnicas del caso, cap. 10, restricción 8, p. 20).


13.3.5 Impacto económico

La innovación no agrega hardware ni ingesta. Si la validación con lotes reales requiere un laboratorio externo, se contrata como servicio de terceros dentro del paquete 3.10.3.4. La Tabla 13.14 ubica sus rubros en el flujo de caja.

Tabla 13.14 Ubicación de la innovación 3 en el flujo de caja. Fuente: elaboración a partir de la definición económica de INN-03 (Subdocumento 13, sección 13.3.5) y su calendario (Subdocumento 7, Anexo 7.D; Formulario T-14). La valorización se presenta en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Familias, parámetros y protocolo (datos y Calidad)	Inversión / recursos humanos	3 a 5
Cálculo en el borde, eventos y vista en M9	Inversión / recursos humanos	5 a 10
Validación con lotes reales en la marcha blanca (horas de datos y Calidad, paquete 3.10.3.4)	Inversión / recursos humanos	11 a 15
Validación con lotes reales (laboratorio externo, si se contrata)	Inversión / proveedores	11 a 15
Cómputo en el borde y en N-10	Costo operacional	16 a 56
Recalibración semestral de parámetros	Costo operacional / recursos humanos	26 a 56, cada seis meses
Retenciones, descartes y rechazos por fecha próxima evitados	Beneficio	Desde el mes 16; primera medición en el mes 28

El beneficio llega por tres vías: menos lotes retenidos o descartados sin justificación térmica real; menos rechazos por fecha próxima, porque sale primero lo que tiene menos vida real; y, ante un rechazo como el del camión de food service, el dato de cuánta vida útil consumió el evento en cada lote, que define si el lote se reubica en otro cliente o se descarta. La evidencia de temperatura ya la entrega el RF-09.09 y no se cuenta como beneficio de la innovación. El beneficio no se suma a la meta de merma del Capítulo 2 ni al de la innovación 1.



13.3.6 Indicador de verificación

La reducción del 20 % de I-03D es una meta propuesta, no un resultado ni una garantía. Para dimensionar el aporte adicional, el escenario compara dos flujos con el mismo modelo, parámetros, familias y criterio de disposición de Calidad: consulta central del resultado frente a cálculo disponible sin enlace y uso en la decisión del lote. En el escenario de dimensionamiento, ambos flujos reciben 1.000 lotes comparables. Se supone que en el flujo central 50 se retienen o descartan por vencimiento (5 %); con una reducción relativa del 20 %, el flujo distribuido tendría 40 afectados (4 %). El beneficio estimado es de 10 lotes menos por cada 1.000 recibidos. El 5 % es un supuesto de diseño, no un dato del caso ni una línea base medida; el ejemplo no supone eliminar retenciones obligatorias. El contraste del mes 28 mantiene la línea base de los meses 13 a 15; solo se atribuye el diferencial al flujo distribuido si se comprueba esa comparación. No se suma otra vez a merma de inventario ni a INN-01.

Datos para expresar el beneficio en lotes. El caso informa 1.100 productos refrigerados y congelados y un rechazo de camión por sospecha de ruptura de cadena de frío (Bases Técnicas del caso, cap. 4.9, p. 9). Esas cifras describen el problema, pero no indican cuántos lotes se recibieron ni cuántos se retuvieron o descartaron por vencimiento. Tampoco se toma el 1,7 % del valor de inventario perdido por vencimiento como porcentaje de lotes (cap. 4.8). Sin los conteos no se extrapola el escenario ni se atribuye el rechazo histórico a un beneficio de esta innovación.

Registro y cálculo. Calidad compara cohortes de la misma familia y sitio, con igual plazo de seguimiento, versión del modelo y reglas de disposición. Registra por flujo y período los lotes recibidos y los lotes de ese mismo conjunto retenidos o descartados por vencimiento. Cada lote sanitario cuenta una vez: si se retiene y después se descarta, no se suma dos veces; un traslado o un nuevo identificador logístico no genera otra recepción. Se conserva la causa y la disposición decidida por Calidad; las retenciones sanitarias obligatorias no se presentan como evitables.

Para cada familia comparable, se divide el número de lotes afectados por los recibidos en cada flujo. La diferencia entre la tasa del flujo central y la del distribuido, multiplicada por los lotes recibidos en este último, expresa el diferencial en lotes; se suman los resultados de las familias comparables sin redondear por separado. Un valor negativo significa más lotes afectados, no ahorro. Si faltan conteos, no hay lotes recibidos o los períodos no son comparables, se informa que no hay estimación para ese grupo.

La Tabla 13.15 define los indicadores de la innovación 3.

Tabla 13.15 Indicadores de la innovación 3. Fuente: elaboración a partir de las metas y reglas de verificación ofertadas para INN-03 (Subdocumento 13, sección 13.3.6) y de la operación de frío (Bases Técnicas del caso, sección 4.9, p. 9).

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-03A	Lotes de familias priorizadas con historia térmica completa / lotes de esas familias	0 (no hay registro continuo)	≥ 95 %; los tramos sin dato se informan con causa	Mes 15 y mensual
I-03B	Lotes evaluados con estimación dentro de ±15 % de la vida nominal respecto de Calidad / lotes evaluados	Sin medición histórica; referencia inicial por familia en la validación de los meses 11 a 15	≥ 80 %, con ≥ 60 lotes por familia	Mes 15, por familia; luego, cada trimestre
I-03C	Excursiones dispuestas por Calidad con la vida útil consumida registrada / excursiones alertadas	0	100 %	Mensual desde el mes 16
I-03D	Lotes de familias habilitadas retenidos o descartados en bodega por vencimiento / lotes recibidos	Medición de los meses 13 a 15	−20 % relativo	Mes 28

La validación inicial de los meses 11 a 15 documentará el valor observado de I-03B por familia, con al menos 60 lotes evaluados, el período de evaluación y la versión de parámetros utilizada. Ese resultado constituirá la referencia inicial para el seguimiento posterior; el 80 % es el umbral de aceptación, no la línea base.

Después de habilitar cada familia, I-03B se sigue en cortes trimestrales, con al menos 30 lotes evaluados por familia en cada corte; si una familia no reúne 30 lotes en el trimestre, el corte se acumula con el siguiente. Calidad del CLIENTE puede acortar la periodicidad de una familia, sin reducir la muestra mínima. Los 60 lotes de la validación inicial no se trasladan a cada corte operacional.

I-03A e I-03B se miden antes del mes 16 y son la condición para habilitar cada familia. I-03D toma su línea base en la marcha blanca, cuando ya existe registro continuo, porque antes no hay con qué medirlo.

13.3.7 Controles de validación por familia y trazabilidad térmica

El Anexo 8.E separa la validación de parámetros por familia y de la regla térmica (CT-11) de la asociación lote–sensor (CT-12). Antes de habilitar y en regresión se ensayan un movimiento sin evento, un sensor equivocado y la sincronización tardía: si la historia queda incompleta, se muestra esa condición y no se infiere la vida útil. La Tabla 13.16 detalla el tratamiento.

Tabla 13.16 Controles de validación de la innovación 3. Fuente: Subdocumento 8, Anexo 8.E, CT-11 y CT-12.

Causa	Control	Mitigación	Contingencia
Parámetros que no representan los productos de Puelche	CT-11	Validación por familia (I-03B) antes de habilitar el orden sugerido; nunca extender el vencimiento por inferencia	La familia queda con historia visible y FEFO por fecha impresa
Que Operaciones lea la estimación como permiso para relajar RNG-04	CT-11	La regla graduada, el bloqueo de B-02 y la evaluación de B-04 y C-02 en el camión no cambian; la estimación solo informa a Calidad	Mostrar la estimación solo en M9, no en M5
Lote movido sin evento (asociación errónea)	CT-12	Tramos sin dato explícitos; control de los eventos de ubicación en M2	Lote marcado «historia incompleta», sin estimación

La regla de diseño que acota el riesgo es que la estimación puede acortar la vida útil de un lote, pero nunca alargarla más allá de la fecha impresa.

13.4 Innovación 4

Tipo 4, modelo de negocio o de contratación: Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir (INN-04). Durante la Operación, una parte acotada del pago mensual se liga a una mejora verificable del costo por entrega de Puelche. El tramo no se paga si las entregas completas y a tiempo (OTIF) están bajo su meta.

13.4.1 Problema u oportunidad

El costo logístico se prorratea por zona con un criterio de 2016, y el gerente de Administración y Finanzas no sabe cuánto cuesta atender a un almacén de Empedrado que hace compras pequeñas cada dos semanas (Bases Técnicas del caso, cap. 1, p. 3). El Capítulo 2 identifica la opacidad del costo de servir como uno de los tres problemas centrales de Puelche.

Conocer el costo de servir y generar sugerencias de frecuencia de visita o compra mínima son alcance obligatorio del criterio 11 y del RF-11.08. La decisión comercial de aplicar esas sugerencias permanece en el CLIENTE. Además, el área de TI de Puelche son cuatro personas, y toda función que requiera un especialista que la compañía no tiene debe ofrecerse como servicio y estar costeada (Bases Técnicas del caso, cap. 10, restricción 9, p. 20). INN-04 no presenta la segmentación ni sus sugerencias como funcionalidades nuevas: agrega el mecanismo contractual que vincula una parte del pago a la reducción comparable del costo por entrega, con canasta estable, atribución documentada y protección del OTIF. El acompañamiento gestionado permite revisar los resultados y registrar las decisiones del CLIENTE, sin sustituir el alcance analítico obligatorio.

13.4.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.17 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.17 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 4. Fuente: elaboración a partir de los criterios 4 y 11 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35), la estructura de pago (Bases Administrativas, Formularios E-21, p. 70, y E-25, p. 74) y el alcance ofertado (Subdocumento 3, sección 3.2.5 y Anexo 3.C).

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Costo de servir por cliente y por entrega, construido desde el hecho	Criterio 11; familia F-14 «Analítica de Costo de Servir», Etapa 2 (RF-11.01, RF-11.02, RF-11.08, RF-04.08, RF-08.07 y RF-14.04)
Segmentación por rentabilidad neta con sugerencia de frecuencia y pedido mínimo	RF-11.08
OTIF único con metas de 90 % (mes 15), 93 % (mes 19) y 95 % (mes 32)	Criterio 4; Capítulo 3, sección 3.2.5, criterio R18-04
Pago de la Operación con componentes fijos y variables	Bases Administrativas, Formulario E-25, p. 74, y Formulario E-21, 1.2, p. 70
Multas por incumplimiento de nivel de servicio	Bases Administrativas, Formulario E-25, p. 74

Las Bases prevén el componente variable, pero ligado a métricas de servicio del proveedor. Esta innovación lo liga a una métrica de negocio del CLIENTE, la reducción comparable del costo por entrega, con dos protecciones: el OTIF debe estar en su meta y una canasta congelada impide bajar costos dejando de atender a clientes caros. El Capítulo 2 ya declara que los clientes no rentables no se eliminan en forma automática (Anexo 2.2, S-07); la canasta congelada es la forma contractual de respetarlo.

El modelo de pago tiene los siguientes elementos:

- **Estructura:** tarifa fija, que es la mayor parte del pago, más un tramo variable con techo. Los valores se fijan solo en la Oferta Económica.
- **Línea base:** se forma con los hechos de los meses 21 a 23, cuando la Etapa 2 ya está en producción. La canasta se congela por zona, canal, distancia y condición térmica, con pesos fijos.
- **Ajustes:** el combustible, el cambio de mezcla de productos y el peak de septiembre se ajustan con índices documentados antes de liquidar.
- **Puntuación:** la reducción comparable dividida por 5 %, acotada entre 0 y 1. El tramo se paga solo si el OTIF del período alcanza la meta del Capítulo 3 vigente para ese mes.
- **Acompañamiento:** LafroX entrega la segmentación y las sugerencias exigidas por RF-11.08 como alcance base. En el circuito contractual de INN-04 se documentan su revisión con el CLIENTE, la decisión del gerente Comercial y el efecto observado; lo propio no es la sugerencia, sino su seguimiento dentro de la atribución y la liquidación condicionada.



Media firma: Alex Aravena

- **Lo que no cambia:** no se compensan multas, no se excluyen entregas fallidas del denominador y no se supera el precio máximo.

13.4.3 Nivel de madurez

La madurez se declara con la escala TRL de la Comisión Europea (European Commission, 2016), aplicada a la práctica contractual y no a un componente tecnológico. Por separado, los contratos con pago ligado al nivel de servicio son práctica corriente en los servicios de tecnología (TRL 9). Ligar el variable a una métrica del negocio del cliente, el costo de servir, no lo es, y por eso el conjunto parte en TRL 2.

FitzGerald et al. (2023) analizan la relación entre la especificación de resultados y el pago en contratos por resultados. En esta propuesta, la canasta, los índices y la protección del OTIF se fijan antes de la primera liquidación para que el resultado y su atribución sean comprobables. La Tabla 13.18 traduce cada nivel a un hito verificable del contrato.

Tabla 13.18 Niveles de madurez de la innovación 4. Fuente: elaboración a partir de la escala TRL (European Commission, 2016, Anexo G) y los hitos y meses propuestos para INN-04 (Subdocumento 13, sección 13.4.3; Formulario T-14, paquetes 5.4.3, 8.3.3 y 8.3.4).

Nivel	Significado en esta innovación	Mes
TRL 2	Modelo de pago y regla de atribución formulados	Oferta
TRL 4	Fórmula simulada con casos y aprobada por Finanzas del CLIENTE (paquete 5.4.3)	20
TRL 6	Tres liquidaciones en sombra reproducidas sin diferencia (paquete 8.3.3)	23
TRL 7	Liquidación con efecto de pago aceptada en operación real (paquete 8.3.4)	24

Cada nivel tiene un entregable que Finanzas del CLIENTE puede revisar, por lo que el avance de madurez no depende de una apreciación del proponente.

Investigación adicional declarada. Falta definir la canasta, los índices de ajuste y la regla estacional con datos reales de costo de servir, que solo existen cuando la Etapa 2 opera con locales reales. Se diseñan en el paquete 5.4.3 (meses 17 a 20) con los datos de la marcha blanca de la Etapa 2, en los meses 19 y 20 (Bases Administrativas, Art. 17°, pp. 12–13); se calibran con los datos de producción de los meses 21 a 23 y se prueban en las tres liquidaciones en sombra del paquete 8.3.3 (meses 21 a 23) con el indicador I-04B. Con el inicio supuesto en febrero de 2027 (Anexo 7.A), esa ventana va de octubre a diciembre de 2028: incluye el peak de diciembre, pero ningún septiembre. La regla del peak de septiembre se fija, por tanto, sin haber observado un septiembre con el sistema nuevo, y la liquidación del mes 32, el primer septiembre en producción, se revisa con Finanzas del CLIENTE antes de aplicar su efecto de pago.

Alex

13.4.4 Diseño de la incorporación

M6 Reparto y M7 Cobranza y rendición aportan los hechos de cada entrega, y M8 Devoluciones y envases aporta los retornos. M10 Analítica calcula el costo comparable y el OTIF sobre N-10 (capa 6). La capa 6 versiona la línea base y la canasta, y la capa 7 audita la cifra liquidada. El dato contable definitivo vive en el ERP. La Tabla 13.19 presenta los paquetes de la EDT.

La Figura 13.5 recorre la formación de la referencia comparable, el ensayo en sombra y la liquidación con efecto de pago.

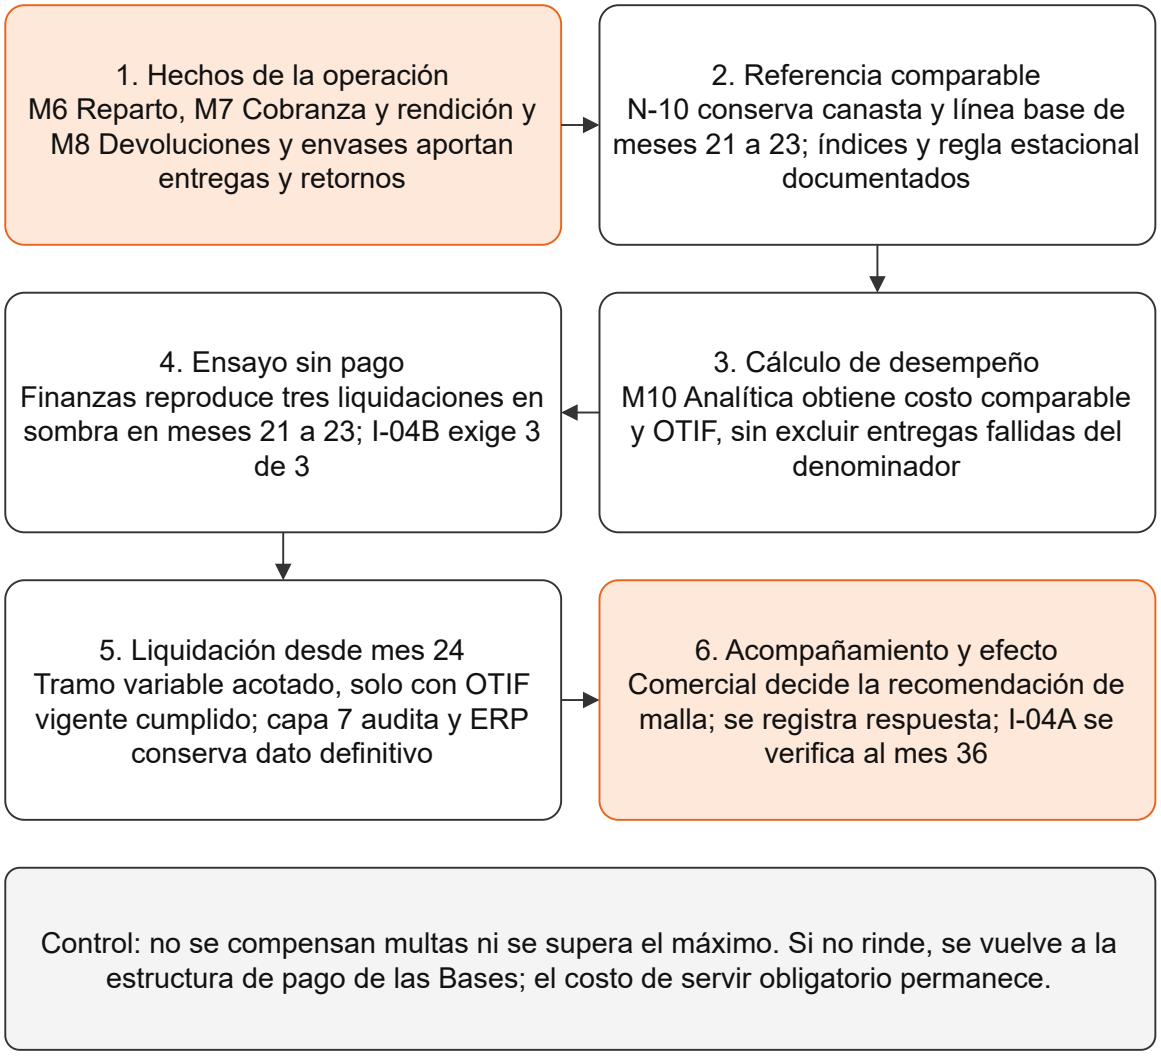


Figura 13.5 Costo de servir: de los hechos a la liquidación auditable. Fuente: elaboración a partir del diseño, calendario y controles de INN-04 (Subdocumento 13, secciones 13.4.4 a 13.4.7) y sus contratos de datos (Subdocumento 13, Anexo 13.A).

La referencia de los meses 21 a 23 precede a cualquier pago variable por este mecanismo. Finanzas debe reproducir las tres liquidaciones en sombra, y desde el mes 24 el cálculo sigue

Alex

condicionado por la meta OTIF vigente. La canasta evita que una reducción aparente de costo provenga de excluir entregas; la decisión sobre la malla de atención sigue en Comercial del CLIENTE.

Tabla 13.19 Paquetes de la EDT de la innovación 4. Fuente: elaboración a partir de los paquetes 5.4.3, 8.3.3 y 8.3.4 y su calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Paquete	EDT	Meses	Entregable
INN-04.P1	5.4.3	17 a 20	Reglas de atribución, canasta, índices y traducción a la Oferta Económica
INN-04.P2	8.3.3	21 a 23	Línea base y tres liquidaciones en sombra, sin efecto de pago
INN-04.P3	8.3.4	24 a 56	Liquidación mensual y acompañamiento comercial

El primer paquete está en la fase 5 de la EDT porque es un acuerdo con el CLIENTE y no un desarrollo. El acompañamiento se materializa en el mes 21 y la primera liquidación en el mes 24. El responsable es el Jefe de Proyecto, Alex Aravena, que dirige el contrato durante la Operación, junto con Finanzas y la Contraparte Técnica del CLIENTE.

13.4.5 Impacto económico

Al ser una innovación de contratación, su impacto se separa en lo que es costo de LafroX, lo que es ingreso de LafroX y lo que es beneficio del CLIENTE. El tramo vale cero en los meses 21 a 23; desde el mes 24 se paga la puntuación por el tramo máximo, a mes vencido, como establece el Formulario E-25. Para Puelche, el modelo significa pagar menos si la solución no rinde y nunca más que el máximo; para LafroX, el tramo es un ingreso contingente. La Tabla 13.20 ubica los rubros.

Tabla 13.20 Ubicación de la innovación 4 en el flujo de caja. Fuente: elaboración a partir de la definición económica de INN-04 (Subdocumento 13, sección 13.4.5) y su calendario (Subdocumento 7, Anexo 7.D; Formulario T-14). La valorización se presenta en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Diseño de la atribución, la canasta y los índices	Inversión / recursos humanos	17 a 20
Ensayo en sombra	Inversión / recursos humanos	21 a 23
Acompañamiento comercial (restricción 9)	Costo operacional / recursos humanos	21 a 56
Conciliación mensual con Finanzas	Costo operacional / gasto administrativo	24 a 56
Pago fijo de la Operación	Ingreso	21 a 56
Tramo variable	Ingreso contingente; vale cero en los meses 21 a 23	24 a 56, a mes vencido
Reducción del costo por entrega de Puelche	Beneficio	Desde el mes 24; meta en el mes 36

El beneficio del CLIENTE es el ahorro operacional verificable, sin sumar lo ya atribuido a las innovaciones 1, 3 o 5. Como indicador físico complementario, pasar de 20 a 19 minutos-persona de trabajo por entrega comparable equivaldría a 1.000 minutos-persona menos por cada 1.000 entregas (16 horas y 40 minutos). Son valores ilustrativos, no una línea base medida ni una conversión de la meta de costo del 5 %. Se compara el tiempo de trabajo en entregas equivalentes sin degradar el cumplimiento de entrega completa y a tiempo.

13.4.6 Indicador de verificación

El 5 % de I-04A es una meta propuesta y una referencia de puntuación contractual; la fórmula no demuestra por sí sola que el ahorro sea alcanzable. El mecanismo esperado combina recomendaciones de atención con comparación sobre una canasta estable y protección del OTIF. La referencia de los meses 21 a 23 y el seguimiento posterior permiten comprobar el efecto, separándolo de cambios de combustible, mezcla y estacionalidad.

La Tabla 13.21 define los indicadores de la innovación 4.




Tabla 13.21 Indicadores de la innovación 4. Fuente: elaboración a partir de las metas y reglas de verificación ofertadas para INN-04 (Subdocumento 13, sección 13.4.6) y del criterio OTIF ofertado (Subdocumento 3, sección 3.2.5, R18-04).

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-04A	1 − costo comparable del período / costo de referencia de la canasta	Canasta de los meses 21 a 23	≥ 5 %, con OTIF ≥ 95 %	Mes 36; mensual desde el mes 24
I-04B	Liquidaciones reproducidas por Finanzas sin diferencia / liquidaciones en sombra	Sin modelo	3 de 3	Meses 21 a 23
I-04C	Recomendaciones con respuesta y efecto registrados / recomendaciones	Sin registro	100 %	Mensual desde el mes 21

La meta de I-04A se exige con OTIF de 95 % porque en el mes 36 ya rige el tramo final de OTIF del criterio R18-04, que se alcanza en el mes 32. I-04B es la condición para pasar del ensayo en sombra a la liquidación con efecto de pago.

13.4.7 Riesgo contractual de liquidación

El Formulario T-16 registra la posible disputa como R-027, con probabilidad 3 e impacto 3 (exposición inicial 0,10, zona Media). Finanzas, con Comercial y la Contraparte Técnica, debe acordar las reglas al cierre del mes 20 y reproducir tres liquidaciones en sombra en los meses 21 a 23 antes del primer pago variable en el mes 24. Si no se aprueban las reglas, no se activa el tramo. La Tabla 13.22 detalla el tratamiento.

Tabla 13.22 Riesgo contractual de la innovación 4. Fuente: Formulario T-16, R-027.

Causa	P × I (SD8)	Mitigación	Contingencia
Variación del costo por causas externas (combustible, cambio de malla, septiembre)	3 × 3 (R-027)	Canasta, índices y regla estacional fijados en el paquete 5.4.3, antes de la primera liquidación	Mecanismo contractual de resolución y corrección, sin modificar SLA ni inventar tarifa; acotar el tramo al cumplimiento del OTIF, que es atribuible, y mantener el acompañamiento en la tarifa fija
Bajar el costo degradando el servicio o excluyendo clientes	Incluida en R-027	Protección del OTIF; denominador sin exclusiones; reproducción por Finanzas	Suspender el devengo del período en disputa según el mecanismo del contrato

Si el modelo no rinde, el contrato vuelve a la estructura de las Bases, con pago fijo y componentes variables de servicio, y el costo de servir sigue disponible como alcance obligatorio de la Etapa 2.


13.5 Innovación 5

Tipo 5, experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social: Hoja de negocio del almacenero (INN-05). Es una hoja por local, entregada en la visita del preventista, que devuelve al cliente del canal tradicional la información que Puelche ya tiene sobre sus compras, sin exigirle dispositivo, conexión ni registro.

13.5.1 Problema u oportunidad

Puelche atiende 11.600 almacenes y minimarkets (Bases Técnicas del caso, cap. 2.2, pp. 4–5). No se puede exigir al cliente del canal tradicional que tenga internet, dispositivo propio ni medio de pago electrónico (Bases Técnicas del caso, cap. 10, restricción 5, p. 19), y el 38 % de las ventas del canal se cobra en efectivo contra entrega (Bases Técnicas del caso, cap. 4.7, p. 9). Mientras tanto, un competidor ofrece una aplicación donde el almacenero hace su pedido solo (Bases Técnicas del caso, cap. 1, p. 3).

Puelche sabe qué compra cada local, qué dejó de pedir y qué tiene por vencer, pero no se lo devuelve. La información de gestión queda hoy reservada a los clientes grandes, que tienen sistemas propios o acceso al portal.



13.5.2 Tecnología, práctica o modelo

La Tabla 13.23 separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que esta innovación agrega.

Tabla 13.23 Alcance obligatorio en el ámbito de la innovación 5. Fuente: elaboración a partir de los requisitos de accesibilidad y autoatención (Bases Administrativas, Art. 26°, p. 18; Bases Técnicas Transversales, RT-13.07, p. 26, y RT-16.32, p. 31), el criterio 8 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35) y el alcance ofertado (Formulario T-12).

Ya es alcance obligatorio	Dónde está
Segmentación por rentabilidad, construida para Comercial y Finanzas	RF-11.08 (M10, Etapa 2)
Autoatención de las consultas más frecuentes	RT-16.32 (Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 31)
Portal web con estado de cuenta, saldo, entregas y documentos, con usuario, clave e internet	RF-07.07 y RF-12.15 a RF-12.18
Atención a personas usuarias con baja alfabetización digital	Bases Administrativas, Art. 26°, p. 18; Bases Técnicas Transversales, cap. 13, RT-13.07, p. 26
Comprobante de entrega	Criterio 8 del caso

Lo obligatorio se construye para Puelche o exige internet. La innovación agrega una lectura del propio negocio del almacenero con Puelche, entregada por el canal que el cliente ya usa, la visita, con el costo de acceso a cargo de Puelche.

La hoja tiene cuatro bloques:

1. Qué compró, por categoría, comparado con su período anterior.
2. Qué dejó de pedir: productos habituales ausentes hace dos o tres ciclos.
3. Qué tiene por vencer, tomado de la innovación 1. El bloque se omite si no hay datos confirmados.
4. Opcional y condicionado: cómo le va frente al agregado de locales comparables de su zona. Nunca muestra un local identificable; aplica un umbral mínimo de locales por grupo y supresión de celdas, según el control de divulgación estadística (Hundepool et al., 2024) y la k-anonimidad (Sweeney, 2002). Se activa solo después de una revisión legal bajo la Ley 21.719 de protección de datos personales (Ley N.º 21.719, 2024).

La hoja se entrega por dos vías:

- **En pantalla:** M3 Preventa la muestra en la aplicación de preventa C-01, en el terminal del preventista. Se calcula antes de la ruta y viaja cifrada en el terminal, así que funciona sin señal.

Alex

- **Impresa, si el cliente la pide:** M6 Reparto la imprime con la impresora de cabina del camión (Zebra ZQ620 Plus, una por camión; Formulario T-11) y se entrega con la guía en la entrega siguiente. El preventista no lleva impresora.

Si esa semana el local no hace pedido, no hay entrega y la copia impresa no llega; queda en espera para la próxima entrega a ese local, y la hoja en pantalla sí se mostró en la visita. El indicador I-05A mide por separado las copias pedidas y las entregadas, para que esa brecha quede visible.

13.5.3 Nivel de madurez

El informe sobre datos propios y el control de divulgación estadística son prácticas maduras, en TRL 9 (Hundepool et al., 2024; Sweeney, 2002). Su utilidad para el micro-comercio sin conectividad no está probada, por lo que el conjunto parte en TRL 2 de la escala de la Comisión Europea (European Commission, 2016). Sus objetivos son TRL 4 con la prueba de comprensión de los meses 13 y 14, y TRL 6 en la marcha blanca de la Etapa 2, en los meses 19 y 20.

Investigación adicional declarada. Falta comprobar que el almacenero entiende la hoja y obtener el dictamen legal del bloque 4 bajo la Ley 21.719. La comprensión se investiga con 24 almaceneros en el paquete 3.10.4.1 (meses 13 y 14), con el indicador I-05B, y la revisión legal se hace en el paquete 8.3.6 (meses 24 a 27).

13.5.4 Diseño de la incorporación

M10 Analítica calcula los bloques sobre N-10 (capa 6). La precarga llega al terminal por la cola de sincronización de los terminales (capa 5). M3 Preventa los muestra en la aplicación de preventa C-01 (capa 1), y M6 Reparto imprime la copia con la impresora de cabina del camión. La capa 7 limita la hoja a su receptor y audita el tratamiento en el registro de actividades de tratamiento. La Tabla 13.24 presenta los paquetes de la EDT.

La Figura 13.6 muestra las dos vías de entrega de la hoja y el control de su cobertura efectiva.

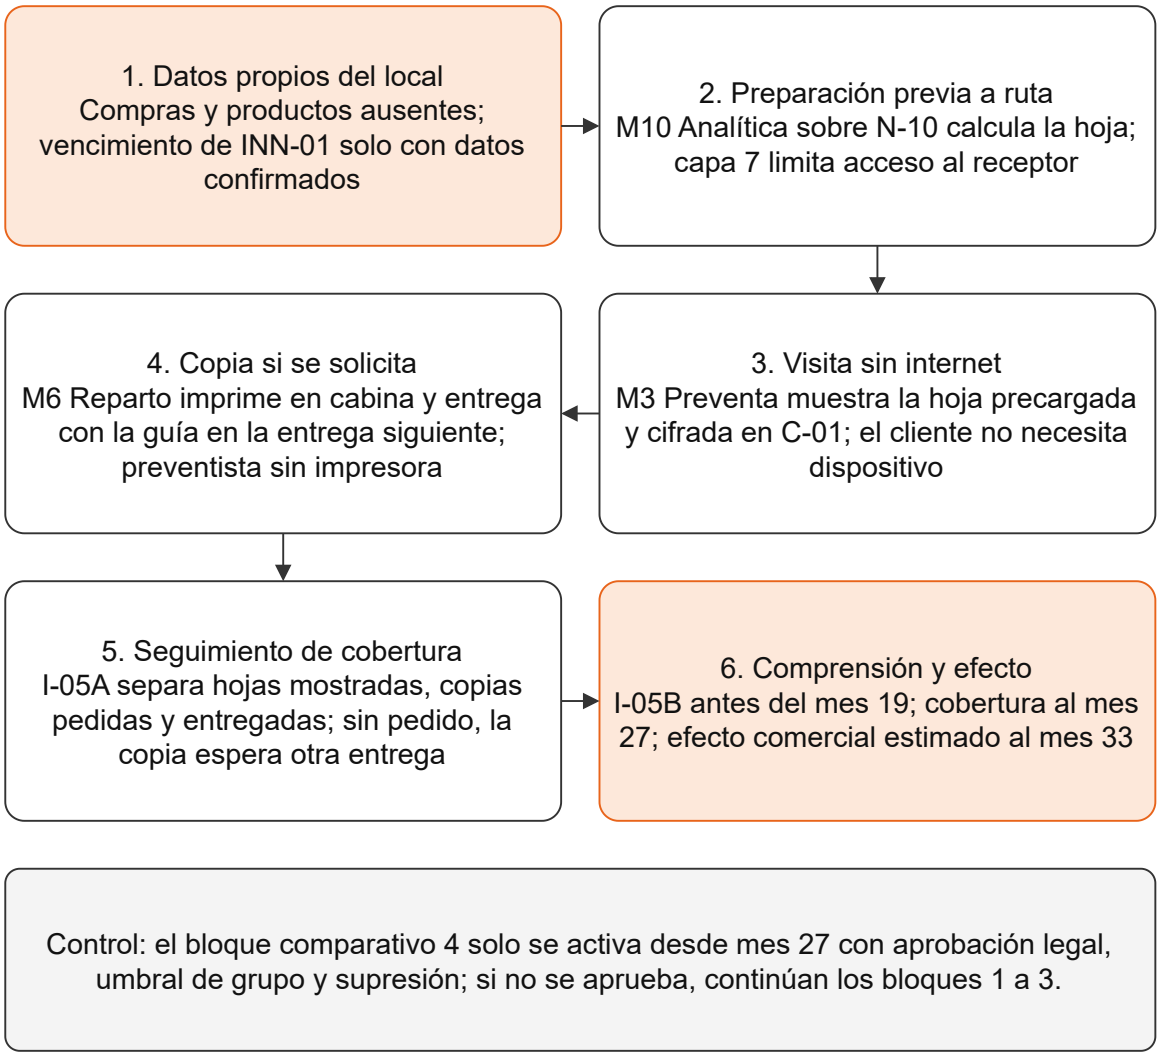


Figura 13.6 Hoja de negocio: preparación, visita sin señal y copia solicitada. Fuente: elaboración a partir del diseño, calendario y controles de INN-05 (Subdocumento 13, secciones 13.5.4 a 13.5.7) y sus contratos de datos (Subdocumento 13, Anexo 13.A).

La información se prepara antes de la ruta y se muestra en el terminal del preventista, sin exigir conexión ni dispositivo al almacenero. La impresión es una vía posterior y opcional: si no hay pedido, no hay entrega inmediata de la copia. Por eso I-05A separa las hojas mostradas de las copias pedidas y entregadas. El bloque comparativo permanece condicionado a la aprobación legal y no impide utilizar los bloques de datos propios.

Tabla 13.24 Paquetes de la EDT de la innovación 5. Fuente: elaboración a partir de los paquetes 3.10.4.1 a 3.10.4.4, 8.3.5 y 8.3.6 y su calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Paquete	EDT	Meses	Entregable
INN-05.P1	3.10.4.1	13 y 14	Prototipo en papel y pantalla; prueba de comprensión con 24 almaceneros
INN-05.P2	3.10.4.2	14 y 15	Privacidad (Ley 21.719), verificación del receptor, retención e impresión en cabina
INN-05.P3	3.10.4.3	15 a 17	Cálculo, precarga y bloques 1 a 3 (H9)
INN-05.P4	3.10.4.4 y 8.3.5	18 a 21 y 22 a 26	Certificación del H10, marcha blanca, producción en el mes 21 y despliegue gradual por rutas
INN-05.P5	8.3.6	24 a 27	Bloque 4: revisión legal, parámetros de agrupación y activación condicionada

La cuenta 3.10.4 de la EDT corresponde a la innovación 5, porque la innovación 4 no tiene paquetes de construcción. Los bloques 1 a 3 se materializan en el mes 21; el bloque 4, desde el mes 27 y solo si la revisión legal lo aprueba. Hasta el mes 21 la innovación la dirige el Líder de Implantación y Gestión del Cambio, Patricio Henríquez, con el Encargado de Seguridad de la Información, Álvaro Catalán, a cargo de la privacidad. Desde el mes 22, el despliegue por rutas y el bloque 4 se ejecutan en el frente de Operación que dirige Guillermo Castillo, y Álvaro Catalán aprueba la activación del bloque 4, porque la dedicación del Líder de Implantación termina en el mes 21 (Capítulo 1, Tabla 1.6). Las horas de los paquetes 8.3.5 y 8.3.6 se mantienen en la familia de esfuerzo IMP del Formulario T-15, ejecutadas por el equipo de Operación. Con el inicio supuesto en febrero de 2027 (Anexo 7.A), el despliegue de los meses 22 a 26 va de noviembre de 2028 a marzo de 2029. En el mes 23, diciembre, no se activan rutas, y en los demás meses ninguna activación ocurre en los tres primeros días hábiles, por el congelamiento operacional (Bases Técnicas del caso, cap. 10, restricción 8, p. 20).

13.5.5 Impacto económico

La impresora de cabina ya está ofertada, por lo que la innovación no agrega hardware. La Tabla 13.25 ubica sus rubros en el flujo de caja.

Tabla 13.25 Ubicación de la innovación 5 en el flujo de caja. Fuente: elaboración a partir de la definición económica de INN-05 (Subdocumento 13, sección 13.5.5) y su calendario (Subdocumento 7, Anexo 7.D; Formulario T-14). La valorización se presenta en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7.

Rubro	Clase	Meses
Investigación con usuarios y prueba de comprensión	Inversión / recursos humanos	13 y 14
Privacidad, cálculo, precarga e impresión en cabina	Inversión / recursos humanos	14 a 18
Certificación del H10 y marcha blanca (paquete 3.10.4.4)	Inversión / recursos humanos	18 a 21
Despliegue gradual por rutas (paquete 8.3.5)	Inversión / recursos humanos	22 a 26
Revisión legal del bloque 4	Inversión / proveedores	24 a 27
Cálculo mensual y papel térmico de las copias pedidas	Costo operacional	21 a 56
Minutos de explicación en la visita	Costo operacional (tiempo de preventa)	21 a 56
Efecto en la frecuencia y el tamaño del pedido, si se demuestra	Beneficio	Desde el mes 33

El beneficio comercial es la frecuencia y el tamaño del pedido en los locales que reciben la hoja, y la retención frente al competidor con aplicación; se valoriza solo si se demuestra al mes 33. El beneficio social es que el almacenero accede a información de gestión sin conexión ni dispositivo propio. En un escenario ilustrativo, si la misma decisión de reposición pasa de 10 a 8 minutos por visita, se ahorran 2 minutos por decisión. Se mide con tareas equivalentes con y sin la hoja, registrando el tiempo hasta que el almacenero decide qué reponer. No se presume un aumento de compras ni se presenta el escenario como medición.

13.5.6 Indicador de verificación

La Tabla 13.26 define los indicadores de la innovación 5.



Tabla 13.26 Indicadores de la innovación 5. Fuente: elaboración a partir de las metas y reglas de verificación ofertadas para INN-05 (Subdocumento 13, sección 13.5.6) y de la cobertura del canal (Bases Técnicas del caso, sección 2.2, pp. 4–5).

Id	Indicador	Línea base	Meta	Momento
I-05A	Locales con hoja mostrada / locales elegibles que la aceptan; copias impresas entregadas / copias pedidas	0 (la hoja no existe)	≥ 90 % de hojas mostradas; ≥ 85 % de copias entregadas dentro de dos visitas	Mes 27
I-05B	Participantes que interpretan bien las tres preguntas / participantes	Sin medición (la hoja no existe)	≥ 80 %: al menos 20 de 24 participantes	Mes 14
I-05C	Frecuencia y tamaño de compra: durante el despliegue, rutas con hoja frente a rutas aún sin hoja; después, cada ruta frente a su período previo	Período previo por ruta	Estimar el efecto; no se promete un alza	Meses 22 a 26 y mes 33
I-05D	Emisiones del bloque 4 con todos los grupos sobre el umbral / emisiones del bloque 4	No aplica antes de activar	100 %	Cada emisión

En I-05B, 19 de 24 participantes equivalen al 79,17 % y no cumplen; 20 de 24 equivalen al 83,33 % y sí cumplen. Cada participante contabilizado debe interpretar correctamente las tres preguntas. La prueba se aplica en los meses 13 y 14 sobre el prototipo (paquete 3.10.4.1), y su resultado se informa en el mes 14, antes de la marcha blanca de la Etapa 2.

I-05A también se informa sobre el total de 11.600 locales, para mostrar la cobertura real del canal. I-05C usa el despliegue gradual por rutas como comparación: durante los meses 22 a 26, las rutas que aún no reciben la hoja sirven de referencia para las que ya la reciben. Desde el mes 27 todas las rutas tienen la hoja, por lo que el contraste del mes 33 compara cada ruta con su período previo y se interpreta junto con la estimación del despliegue. Por eso la meta es estimar el efecto y no prometer un alza que hoy no tiene evidencia.

13.5.7 Control de comprensión y privacidad

El control CT-13 del Anexo 8.E exige una prueba de comprensión con almaceneros y pruebas de inferencia antes de habilitar los bloques respectivos. La comparación agregada requiere revisión legal y verificación del umbral y la supresión en cada emisión; si permite inferir datos de terceros, el bloque comparativo no se habilita. La Tabla 13.27 detalla el tratamiento.

Tabla 13.27 Control de comprensión y privacidad de la innovación 5. Fuente: Subdocumento 8, Anexo 8.E, CT-13.

Causa	Control	Mitigación	Contingencia
Que el almacenero no la lea o no la entienda	CT-13	Prueba de comprensión (I-05B) y co-diseño con almaceneros	Versión de un bloque, explicada de palabra en la visita
Inferir las cifras de un vecino a partir del bloque 4	CT-13	Umbral y supresión verificados en cada emisión; revisión legal previa	No activar el bloque 4; los bloques 1 a 3 son datos propios del local

Si la innovación no rinde, la visita del preventista, el pago en efectivo y los canales obligatorios siguen operando sin cambios, porque la hoja es un agregado opcional.

Referencias

Las citas a las Bases Administrativas y a las Bases Técnicas Transversales identifican el artículo o capítulo y la página impresa del PDF original, además del código RT cuando corresponde. Las referencias al caso se localizan por capítulo, sección o entrevista, sin exigir paginación.

- DORA. (2024). *Accelerate state of DevOps report 2024*. Google Cloud. `https://dora.dev/r`



esearch/2024/dora-report/

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*, artículos 17, 26, 28, 29, 30 y 50.2, y Formularios E-21, E-25 y T-19.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, RT-03.12, RT-04.01, RT-04.03 a RT-04.05, RT-04.14, RT-05.30, RT-10.07, RT-13.07, RT-14.06, RT-16.32, RT-18.08 y capítulo 26.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*, capítulos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 y 18.
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf
- FitzGerald, C., Tan, S., Carter, E., & Airoldi, M. (2023). Contractual acrobatics: A configurational analysis of outcome specifications and payment in outcome-based contracts. *Public Management Review, 25*(9), 1796–1814. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2244501
- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/
- Hundepool, A., Domingo-Ferrer, J., Franconi, L., Giessing, S., Lenz, R., Naylor, J., Schulte Nordholt, E., Seri, G., De Wolf, P.-P., Tent, R., Młodak, A., Gussenbauer, J., & Wilak, K. (2024). *Handbook on statistical disclosure control* (2.ª ed.). STACE project. https://sdctools.github.io/HandbookSDC/
- Jedermann, R., Nicometo, M., Uysal, I., & Lang, W. (2014). Reducing food losses by intelligent food logistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society A, 372*(2017), 20130302. https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0302
- Koutsoumanis, K., Taoukis, P. S., & Nychas, G.-J. E. (2005). Development of a Safety Monitoring and Assurance System for chilled food products. *International Journal of Food Microbiology, 100*(1–3), 253–260. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.10.024
- Ley N.º 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272
- Riesenegger, L., Santos, M. J., Ostermeier, M., Martins, S., Amorim, P., & Hübner, A. (2023). Minimizing food waste in grocery store operations: Literature review and research agenda. *Sustainability Analytics and Modeling, 3*, 100023. https://doi.org/10.1016/j.samod.2023.100023
- Shahin, M., Babar, M. A., & Zhu, L. (2017). Continuous integration, delivery and deployment: A systematic review on approaches, tools, challenges and practices. *IEEE Access, 5*, 3909–3943. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2685629



- Sweeney, L. (2002). k-anonymity: A model for protecting privacy. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 10*(5), 557–570. https://doi.org/10.1142/S0218488502001648

Declaración de uso de IA

La Tabla 13.28 declara el uso de herramientas de inteligencia artificial y registra la revisión editorial humana ya documentada. Esa revisión no acredita una verificación técnica de la versión final. El cierre técnico se registra por innovación, con nombre del revisor, fecha, versión, elementos verificados, evidencia y resultado. La pauta del Anexo 13.C define los puntos de verificación; su inclusión no certifica que se hayan revisado. Al cierre de esta versión, la revisión técnica efectiva aún no está acreditada.

Tabla 13.28 Declaración de uso de IA.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code; OpenAI Codex	Síntesis, citas y mapa general	Alto	Alto (Figura 13.1)	Guillermo Castillo: Se revisó la claridad de la presentación general y la comprensión del propósito de las cinco innovaciones.
13.1	Claude Code; OpenAI Codex	Contenido y recorrido INN-01	Medio	Alto (Figura 13.2)	Guillermo Castillo: Se examinó la redacción del seguimiento de vencimiento posentrega y la comprensión del problema y de la solución propuesta.
13.2	Claude Code; OpenAI Codex	Contenido y recorrido INN-02	Medio	Alto (Figura 13.3)	Guillermo Castillo: Se revisó la secuencia explicativa del recorrido de reproducción de incidentes de terreno y la claridad de sus descripciones.

continúa en la página siguiente




Tabla 13.28 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
13.3	Claude Code; OpenAI Codex	Contenido y recorrido INN-03	Medio	Alto (Figura 13.4)	Guillermo Castillo: Se examinó la exposición de la vida útil remanente por historia térmica, con atención a la comprensión de los supuestos y límites descritos.
13.4	Claude Code; OpenAI Codex	Contenido y recorrido INN-04	Medio	Alto (Figura 13.5)	Guillermo Castillo: Se revisó la explicación del tramo variable de la operación y la claridad de los términos relativos al costo de servir.
13.5	Claude Code; OpenAI Codex	Contenido y recorrido INN-05	Medio	Alto (Figura 13.6)	Guillermo Castillo: Se examinó la descripción de la hoja de negocio del almacenero, atendiendo a la comprensión de su propósito y funcionalidades.
Anexo 13.A	Claude Code	Contratos de datos	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: Se revisó la redacción de las definiciones de los contratos de datos y la claridad de la terminología empleada.
Anexo 13.B	Claude Code	Trazabilidad y alcance	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: Se examinó la presentación de la matriz de trazabilidad y la comprensión de las relaciones y del alcance descritos.

continúa en la página siguiente




Tabla 13.28 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 13.C	Claude Code; OpenAI Codex	Indicadores y riesgos	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: Se revisó la exposición de los indicadores y riesgos, con atención a la claridad de sus descripciones.
T-19	Claude Code; OpenAI Codex	Fichas de las cinco innovaciones	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez: Se revisó la redacción, claridad y consistencia de las afirmaciones dentro de las fichas, atendiendo a la comprensión de su contenido.

