LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 09 — Plan de calidad

Subdocumento 09 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

9 Introducción al Plan de calidad 5

9.1 Plan de Calidad 5

9.1.1 Objetivos y gobierno de la calidad 6

9.1.2 Estándares aplicados y forma de acreditarlos 7

9.1.3 Modelo de calidad del producto según ISO/IEC 25010 8

9.1.4 Modelos de madurez 11

9.1.5 Métricas de código con umbral bloqueante 11

9.1.6 Métricas de proceso y costo de la calidad 12

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad 14

9.2.1 Puertas de calidad 15

9.2.2 Revisión por pares y análisis estático y dinámico 17

9.2.3 Estrategia de pruebas conforme a ISO/IEC/IEEE 29119 17

9.2.4 Datos de prueba 21

9.2.5 Verificación, validación y trazabilidad 22

9.2.6 Control de la calidad y mejora continua 24

9.3 Alineación con Plan de Trabajo 25


9.3.1 Actividades de calidad en la EDT 25

9.3.2 Calidad en el cronograma y en los hitos 27

9.3.3 Pruebas periódicas durante la Operación 31

Referencias 32


Declaración de uso de IA 33



Media firma: Alex Aravena


Lista de tablas

Tabla 9.1 Objetivos de calidad del proyecto 6
Tabla 9.2 Estándares de calidad y su mecanismo de verificación 8
Tabla 9.3 Umbral principal por característica 10
Tabla 9.4 Métricas de código con umbral bloqueante 12
Tabla 9.5 Métricas de proceso 13
Tabla 9.6 Subtotal de conformidad en horas-hombre 14
Tabla 9.7 Bloqueo y autoridad por puerta 16
Tabla 9.8 Pruebas aplicables por etapa y antes de cada entrada a Producción 19
Tabla 9.9 Derivación de la carga de prueba 20
Tabla 9.10 Paquetes de calidad de la EDT 26
Tabla 9.11 Actividades de calidad mes a mes en la Etapa 1, meses 1 a 12 28
Tabla 9.12 Actividades de calidad mes a mes en las marchas blancas, la Etapa 2 y la entrada a la Operación, meses 13 a 21 29
Tabla 9.13 Reserva y holgura de los hitos ante una subsanación 30
Tabla 9.14 Pruebas periódicas de la Operación 31
Tabla 9.15 Declaración de uso de inteligencia artificial. Fuente: registro de asistencia de IA de este subdocumento. 33



Lista de figuras

Figura 9.1 Marco de aseguramiento de la calidad 7
Figura 9.2 Modelo de calidad del producto aplicado a la solución 9
Figura 9.3 Puertas de calidad en la cadena de entrega 15
Figura 9.4 Niveles y tipos de prueba por ambiente 18
Figura 9.5 Origen y control de los datos de prueba 21
Figura 9.6 Verificación y validación por nivel y por hito 22
Figura 9.7 Cadena de trazabilidad de extremo a extremo 23
Figura 9.8 Ciclo de mejora de la calidad 25
Figura 9.9 Vista general de las actividades de calidad en el cronograma del contrato 27



Introducción al Plan de calidad

Distribuidora Puelche tardó nueve días en identificar a los clientes afectados por un retiro sanitario y entregó una estimación, no una lista (Bases Técnicas del caso, cap. 1 y cap. 7.3, pp. 3, 12). Su Jefa de Calidad pidió en la entrevista de levantamiento algo más exigente que un sistema que registre: que bloquee el despacho ante una excursión de temperatura fuera de rango (Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 15). Ese es el nivel de exigencia de este plan. La solución opera alimentos bajo fiscalización sanitaria, y en industrias reguladas el control de calidad es más estricto que en otras (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 300).


El capítulo responde tres preguntas. La sección 9.1 define con qué se juzga la calidad: los objetivos, las normas, el modelo de calidad del producto, los modelos de madurez, las métricas con umbral y el costo de la calidad. La sección 9.2 describe cómo se asegura y se controla: las puertas de calidad, la revisión y el análisis del código, la estrategia de pruebas, los datos de prueba, la trazabilidad y el ciclo de mejora. La sección 9.3 muestra dónde quedan esas actividades en la EDT y en el cronograma.

El plan se conecta con el resto de la propuesta. Toma los requisitos y criterios de aceptación del Subdocumento 3 (SD3) y del Formulario T-12; los ambientes, la cadena de entrega, los umbrales de respuesta y el dimensionamiento del Subdocumento 4 (SD4); las reglas de calidad de datos y de migración del Subdocumento 5 (SD5); las compuertas y herramientas del Subdocumento 6 (SD6) y su Formulario T-10; los paquetes, fechas y horas del Subdocumento 7 (SD7) y sus Formularios T-14 y T-15; y la coordinación con la gestión de riesgos. El detalle se entrega por separado. El **Formulario T-13** contiene el plan de pruebas y validación. El **Formulario T-17** contiene el protocolo de aceptación de cada hito y del producto final. Los **Anexos 9.A a 9.D** contienen las métricas por subcaracterística, las reglas de las puertas, el cálculo del costo de la calidad y la trazabilidad de los resultados del caso.

En este capítulo, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. El mes 1 del contrato es febrero de 2027.

9.1 Plan de Calidad

Esta sección fija qué significa calidad para este proyecto y cómo se mide. Sigue los componentes que el PMBOK asigna al plan de gestión de la calidad: estándares, objetivos, roles, entregables sujetos a revisión, actividades, herramientas y tratamiento de las no conformidades (PMI, 2017, p. 286).



Media firma: Alex Aravena

9.1.1 Objetivos y gobierno de la calidad

El plan parte de un principio del PMBOK: la prevención es preferible a la inspección, porque corregir un error cuesta menos cuanto antes se detecta (PMI, 2017, p. 274). Por eso la mayor parte del control ocurre mientras el código se escribe y no al final de cada etapa.

Objetivos. Los objetivos de calidad del proyecto se derivan de lo que el CLIENTE usará para juzgar el éxito: los dieciséis resultados del Caso, capítulo 18, y las condiciones de cierre de marcha blanca del Art. 17.3. La Tabla 9.1 los agrupa en cuatro objetivos medibles (BA, p. 13).

Tabla 9.1 Objetivos de calidad del proyecto. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13); (Bases Técnicas del caso, caps. 17 y 18, pp. 31–35); (Formulario T-17, sección 5).

Objetivo	Indicador	Meta	Origen
Entregar lo ofertado, probado	Requisitos ofertados del T-12 con prueba aprobada	100 % antes de su hito	Caso, 17.1
Llegar a producción sin defectos graves	Defectos críticos o altos abiertos al cierre de cada marcha blanca	0	BA, Art. 17.3 (BA, p. 13)
Sostener la operación de Puelche	Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00; p95 de las cuatro transacciones críticas	0 minutos; dentro del umbral del Caso	Caso, RT-10.05 y RT-09.01
Lograr los resultados del negocio	Resultados del Caso, cap. 18, aceptados en su momento	16 de 16	Caso, cap. 18

Los cuatro objetivos van de lo técnico a lo comercial. Los dos primeros los controla LafroX con sus puertas y sus pruebas. El tercero se mide en operación real durante la marcha blanca. El cuarto depende además de la adopción por las personas del CLIENTE, y por eso se acepta con medición en operación y no con una prueba de laboratorio (Formulario T-17, sección 5).

Gobierno. El gobierno separa el aseguramiento del control (PMI, 2017, p. 290). El aseguramiento comprueba que el proceso produzca calidad y está a cargo del Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño, con dedicación en los meses 1 a 56 (SD1, sección 1.5). Lo apoya el Comité de Calidad y Procesos de LafroX, que sesiona mensualmente y analiza la adherencia metodológica y las métricas de defectos (SD1, sección 1.3.1). El control comprueba que cada entregable cumpla y lo ejecutan las puertas automáticas y el equipo de pruebas. La aceptación la decide el CLIENTE por medio de su Contraparte Técnica (BA, Art. 70.2, p. 37).

El Líder de Calidad no responde ante el Líder de Desarrollo. Puede vetar una promoción y, si hay desacuerdo, el Comité de Calidad lo resuelve y escala a la Gerencia General de LafroX (SD1, sección 1.2). Esa independencia evita que la presión del plazo relaje un umbral. Se trata de gobierno interno de LafroX, no de una facultad adicional atribuida al Art. 71 de las Bases Administrativas. Su composición y escalamiento se explicitan en el Subdocumento 6, sección

Alex

6.1.6, y en el Formulario T-9, apartado Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno; ningún comité interno sustituye la aceptación del CLIENTE ni dispensa una puerta fallida.

La Figura 9.1 presenta el marco completo, desde las normas hasta la aceptación.

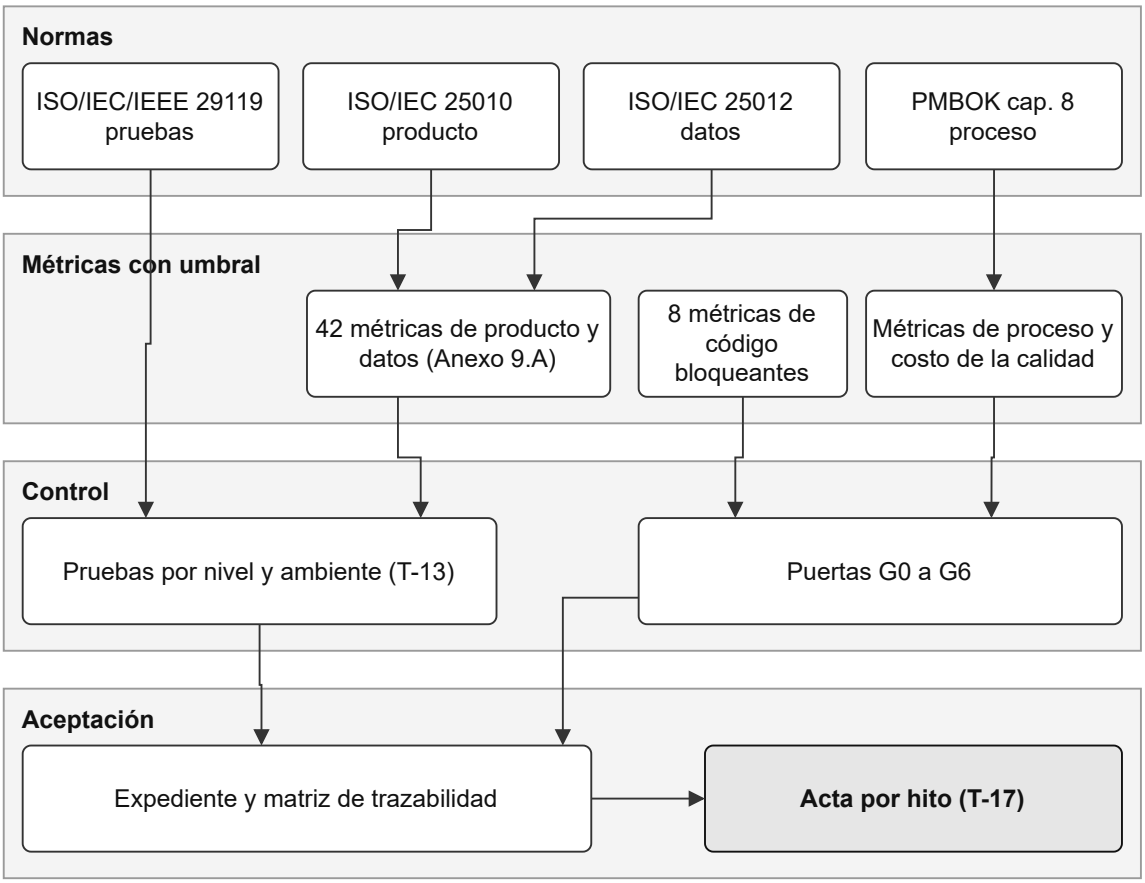


Figura 9.1 Marco de aseguramiento de la calidad. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 4.3, 18.2 y 24, pp. 5–6, 13, 17); (Subdocumento 9, anexos 9.A y 9.B); (Formulario T-13, secciones 3 y 6); (Formulario T-17, secciones 3 y 4).

Todo el marco converge en una sola salida: la evidencia que la Contraparte Técnica revisa para firmar cada acta (BA, Art. 18.2, p. 13). Cada norma gobierna un objeto distinto y ninguna se queda en una mención: cada una se traduce en métricas con umbral, y esas métricas se aplican en una puerta o en una prueba. Las métricas no llegan al CLIENTE como declaraciones, sino como resultados de ejecución en el expediente. Las puertas G0 a G6 que aparecen en la figura son los siete puntos de control de la cadena de entrega, desde el computador del desarrollador hasta la operación; la sección 9.2.1 las describe una por una.

9.1.2 Estándares aplicados y forma de acreditarlos

El Art. 4.3 de las BA exige acreditar cada estándar y advierte que mencionarlo sin evidencia de cómo se satisface vale puntaje cero. La Tabla 9.2 indica, para cada estándar del ámbito de

Alex

la calidad, cómo se aplica y dónde queda la evidencia (BA, pp. 5–6).


Tabla 9.2 Estándares de calidad y su mecanismo de verificación. Fuente: (Bases Administrativas, art. 4.3, pp. 5–6); (Bases Técnicas Transversales, RT-13.01, p. 26); (Subdocumento 1, sección 1.3.1); (Formulario T-13, secciones 2, 3 y 12); (Subdocumento 9, anexo 9.A).

Estándar	Objeto	Mecanismo en este plan	Evidencia
ISO/IEC 25010	Calidad del producto	Ocho características con métrica y umbral (9.1.3)	Anexo 9.A; informes del T-13
ISO/IEC 25012	Calidad de los datos	Completitud, exactitud, consistencia y actualidad medidas (9.1.3)	Anexo 9.A.9; conciliaciones
ISO/IEC/IEEE 29119	Proceso, documentación y técnicas de prueba	Tres niveles de proceso; técnicas de diseño por tipo de regla (9.2.3)	T-13, secciones 2 y 3
PMBOK (PMI, 2017)	Gestión de la calidad del proyecto	Planificar, gestionar y controlar la calidad; costo de la calidad (9.1.6)	Informes mensuales; Anexo 9.C
WCAG 2.2 AA (W3C, 2023)	Accesibilidad	Herramienta automática y revisión manual (9.2.2)	Informe de conformidad (RT-13.01) (BTT, p. 26)
OWASP ASVS, Top 10 y SAMM (OWASP Foundation, 2019, 2020, 2021)	Seguridad del software	Análisis estático y dinámico; evaluación de madurez (9.1.4, 9.2.2)	Informes de G2, G4 y de intrusión

Con estos seis estándares el plan cubre la calidad del producto, la de los datos y la de las pruebas, y cada uno tiene un responsable de evidencia distinto. Los estándares de seguridad, continuidad y arquitectura se acreditan en el SD4; este plan solo verifica su cumplimiento mediante pruebas.

9.1.3 Modelo de calidad del producto según ISO/IEC 25010

El Art. 24 de las BA exige criterios de calidad conforme a ISO/IEC 25010, con umbrales numéricos para ocho características: funcionalidad, desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Son las características de la versión de 2011 de la norma (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 2011). La revisión de 2023 renombra usabilidad como capaci-



dad de interacción y portabilidad como flexibilidad, y agrega la seguridad operacional (ISO & IEC, 2023). El plan usa los nombres de las Bases para que el contrato y el plan hablen el mismo idioma, y cubre la seguridad operacional dentro de la fiabilidad: el bloqueo del despacho ante una excursión térmica es un comportamiento seguro ante una falla del producto (BA, p. 17).

Cada umbral se escribe como un requisito verificable: ante un estímulo, en una condición de operación, la solución responde con una métrica y un valor. No se usan promedios para el desempeño. El p95 representa la experiencia de casi todas las personas usuarias, y un promedio esconde la cola lenta que sufre el preparador en la cámara o el conductor sin señal (BTT, cap. D, «Percentil 95», p. 50).

La Figura 9.2 presenta las ocho características con el umbral que las hace exigibles en Puelche.

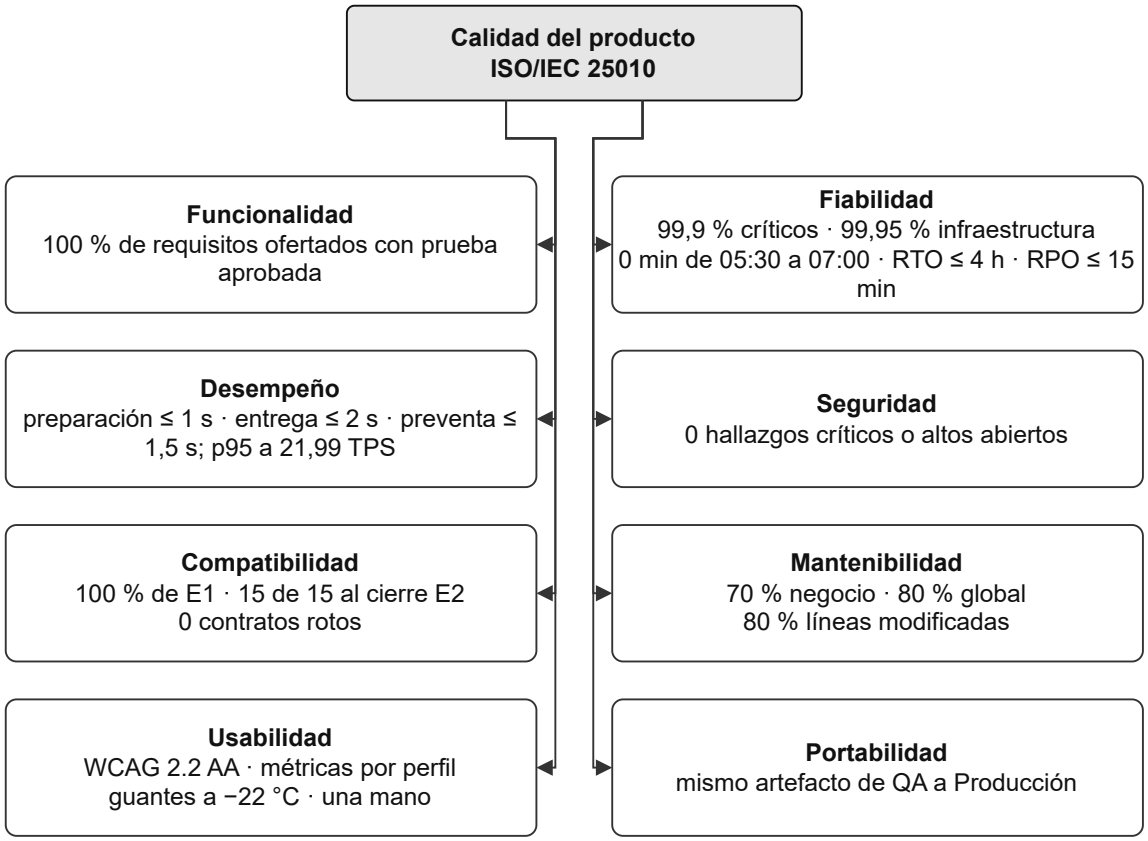


Figura 9.2 Modelo de calidad del producto aplicado a la solución. Fuente: (Bases Administrativas, art. 24, p. 17); (Subdocumento 9, anexo 9.A, métricas 9A-01 a 9A-38).

Ninguna de las ocho características queda con un valor genérico: cada una tiene al menos una métrica que nace de la operación de Puelche. La Tabla 9.3 resume la métrica principal de cada una. El Anexo 9.A detalla las 42 métricas por subcaracterística, con método de verificación y paquete de la EDT, e incluye cuatro métricas de calidad de datos según ISO/IEC 25012 (ISO & IEC, 2008).


Seis de los ocho umbrales los fijan las Bases o el Caso. Los otros dos son compromisos de

Alex

Tabla 9.3 Umbral principal por característica. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 24 y 78.2, pp. 17, 40); (Bases Técnicas Transversales, secciones 7.2, 13 y 20.1, pp. 17–18, 26, 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-09.01 y RT-10.05; sección 17.1, pp. 26–27, 31–32); (Subdocumento 3, Tabla 3.A.4a); (Subdocumento 9, anexo 9.A).

Característica	Métrica principal	Umbral	Origen
Funcionalidad	Requisitos ofertados con prueba aprobada	100 %	Caso, 17.1
Desempeño	p95 de las transacciones críticas a 1,5 × el peak	Preparación ≤ 1 s; entrega ≤ 2 s; preventa ≤ 1,5 s; stock y crédito ≤ 2 s	Caso, RT-09.01
Compatibilidad	Integraciones sin error por etapa	100 % aplicables E1; 15 de 15 al cierre de E2	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)
Usabilidad	Tasa de error y aprendizaje por perfil; accesibilidad	Error ≤ 5 %; aprendizaje ≤ 2 h en bodega, ≤ 4 h preventista, ≤ 30 min conductor; WCAG 2.2 AA sin incumplimientos	RT-13.04 (SD3, Tabla 3.A.4a); RT-13.01 (BTT, p. 26)
Fiabilidad	Disponibilidad mensual	Transacción crítica ≥ 99,9 %; infraestructura ≥ 99,95 %; 0 minutos entre 05:30 y 07:00	BA, Art. 78.2; BTT 7.2; Caso, RT-10.05 (BA, p. 40; BTT, pp. 17–18)
Seguridad	Hallazgos críticos o altos abiertos	0	RT-04.05; RT-11.20 (BTT, pp. 10, 24)
Mantenibilidad	Cobertura de lógica de negocio y global	≥ 70 % y ≥ 80 %	BA, Art. 24; SD1, 1.3.1 (BA, p. 17)
Portabilidad	Despliegues con el mismo artefacto	100 %	RT-04.08 (BTT, p. 11)

LafroX sobre una exigencia de las Bases: la usabilidad toma los indicadores por perfil que el SD3, Tabla 3.A.4a, compromete para el RT-13.04, y la mantenibilidad suma al 70 % exigido en la lógica de negocio el 80 % de cobertura global que es política de LafroX (SD1, sección 1.3.1). El desempeño y la fiabilidad concentran el modelo porque la operación de Puelche depende de transacciones de segundos en la ventana de despacho y de que el despacho continúe sin enlace y sin señal.



9.1.4 Modelos de madurez

El plan usa tres referentes con funciones distintas. ISO 9001:2015 es el sistema de gestión de calidad de LafroX y aporta el marco de auditoría de los registros del proyecto (ISO, 2015). CMMI-DEV es el modelo de madurez del proceso de desarrollo y de pruebas (CMMI Institute, 2018). El SD1, sección 1.4, identifica la evaluación Benchmark n.º 58190, de noviembre de 2023, y su renovación mediante una nueva evaluación Benchmark antes de noviembre de 2026, que se presenta a la Contraparte Técnica junto con el H1. Mientras no se acredite la renovación, no se invoca el nivel como garantía del proyecto. Los procesos del proyecto se auditan, además, con el sistema de gestión ISO 9001, de modo que su control no depende de una sola certificación. OWASP SAMM es el modelo de madurez del desarrollo seguro que exige el Art. 4.3 de las BA (BA, pp. 5–6).

El nivel 3 de CMMI-DEV significa procesos definidos para la organización y adaptados al proyecto. En este contrato se traduce en tres áreas de práctica que el plan mide: verificación y validación, que es el proceso de pruebas de 9.2.3; revisión entre pares, de 9.2.2; y aseguramiento de la calidad del proceso, ejercido por las auditorías trimestrales de trazabilidad entre requisito, código y prueba que exige la política de LafroX (SD1, sección 1.3.1). Esas auditorías siguen el criterio del PMBOK: las hace un equipo independiente del proyecto y buscan no conformidades, buenas prácticas y lecciones para otros proyectos (PMI, 2017, p. 294).

El modelo se usa para mejorar el proceso durante el contrato. El Líder de Calidad hace una autoevaluación de las tres áreas al aprobar el plan, en el H1, y la repite cada seis meses. El Encargado de Seguridad hace lo mismo con SAMM al iniciar el desarrollo y cada año. Cada brecha entra al ciclo de mejora de 9.2.6. La meta es el cuarto de los cinco niveles de gestión de la calidad que describe el PMBOK: incorporar la calidad en la planificación y el diseño, y no solo detectar defectos (PMI, 2017, p. 275).

9.1.5 Métricas de código con umbral bloqueante

La mantenibilidad se juzga sobre el código mientras se escribe. La columna «Puerta» de la Tabla 9.4 indica el punto de control donde se aplica cada umbral: G2 es la integración continua, que se ejecuta sobre cada cambio (sección 9.2.1). La Tabla 9.4 fija los umbrales que bloquean una fusión en los tres lenguajes de la solución: PHP con Laravel en el monolito modular, Kotlin en la aplicación Android y TypeScript con Angular en consolas y portales (SD4, sección 4.1.1).

Las ocho métricas bloquean en la misma puerta, la integración continua, porque ahí el costo de corregir es mínimo: el autor todavía tiene el cambio en la cabeza. Los tres controles de cobertura tienen denominadores independientes y se exigen conjuntamente: lógica de negocio, código global y líneas modificadas. El 80 % global de SD1/SD7 no sustituye el 80 % sobre líneas modificadas declarado en T-10, ni a la inversa. Una cobertura global alta lograda con pruebas sobre controladores y vistas podría dejar sin probar la regla de asignación de stock o la de excursión térmica; el 70 % medido sobre las clases de dominio y de casos de uso lo impide. El límite de complejidad de 10 es la cota que McCabe (1976) propone para un módulo comprobable. El acoplamiento se controla en dos niveles. Entre módulos, ninguno invoca

Alex

Tabla 9.4 Métricas de código con umbral bloqueante. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 19 y 24, pp. 14, 17); (Bases Técnicas Transversales, RT-04.11, p. 11); (Subdocumento 1, sección 1.3.1); (Formulario T-10, apartado DevSecOps); (Subdocumento 9, anexo 9.B); McCabe (1976, sección III).

Métrica	Umbral bloqueante	Puerta	Origen del umbral
Cobertura de lógica de negocio	≥ 70 %	G2	BA, Art. 24; RT-04.11 (BA, p. 17; BTT, p. 11)
Cobertura unitaria global	≥ 80 %	G2	Política de LafroX (SD1, 1.3.1)
Cobertura unitaria de líneas modificadas	≥ 80 %	G2	T-10, apartado DevSecOps
Complejidad ciclomática por método	≤ 10	G2	McCabe (1976)
Dependencias prohibidas entre módulos	0	G2	BA, Art. 19 (acoplamiento débil) (BA, p. 14)
Acoplamiento eferente por clase	≤ 20 clases	G2	Regla de LafroX sobre BA, Art. 19 (BA, p. 14)
Duplicación de código	≤ 3 % de las líneas	G2	Regla de LafroX
Deuda técnica clasificada como bloqueante	0	G2	BA, Art. 24; Formulario T-10 (BA, p. 17)

clases internas de otro fuera de su contrato. Dentro de cada módulo, ninguna clase depende de más de 20 clases distintas; ese límite, que PhpMetrics y detekt miden en cada ejecución, detecta una clase que concentra demasiadas responsabilidades antes de que se vuelva difícil de probar. Las herramientas por lenguaje están en el Anexo 9.B.

Los umbrales contractuales y las reglas bloqueantes del SD4 y del T-10 no se relajan mediante un acta interna. El Comité de Calidad puede proponer controles adicionales o más estrictos; si afectan la línea base, se aprueban por el control de cambios del SD6 antes de aplicarlos. Esa actualización prospectiva no autoriza a promover un artefacto que incumpla el umbral vigente: ninguna persona ni comité levanta una puerta fallida.

9.1.6 Métricas de proceso y costo de la calidad

El código puede cumplir sus umbrales y el proceso puede seguir dejando escapar defectos. Por eso el plan mide también el proceso. La Tabla 9.5 fija las métricas con que el Comité de Calidad lo juzga cada mes.


Las cuatro métricas de entrega del RT-04.12 (frecuencia de despliegue, tiempo del cambio a producción, tasa de cambios fallidos y tiempo de restauración) se miden con las metas que declara el SD4; la frecuencia es quincenal y se mide solo en los períodos que las ventanas del

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 9.5 Métricas de proceso. Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.3, 18.3 y 78.3, pp. 13, 40); (Bases Técnicas Transversales, RT-04.12, p. 11); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1.4); (Formulario T-17, secciones 2 y 4).

Métrica	Fórmula	Meta	Origen
Defectos escapados	Defectos críticos o altos hallados en un ambiente posterior al que debió detectarlos / total de críticos o altos	0 en Producción durante la marcha blanca	BA, Art. 17.3 (BA, p. 13)
Densidad de defectos	Defectos confirmados / casos ejecutados, por módulo	Un módulo sobre 1,5 veces la mediana del proyecto pasa a análisis de causa raíz	Regla de LafroX
Observaciones repetidas del CLIENTE	Observaciones de la misma naturaleza en una segunda presentación	0	BA, Art. 18.3 (BA, p. 13)
Frecuencia de despliegue	Despliegues a producción por período habilitado	Quincenal	RT-04.12; SD4 (BTT, p. 11)
Tasa de cambios fallidos	Despliegues que requieren reversión o corrección / despliegues del mes	≤ 5 %	BA, Art. 78.3; SD4 (BA, p. 40)
Tiempo del cambio a producción	Días hábiles habilitados desde que se confirma el cambio	≤ 5 días	RT-04.12; SD4 (BTT, p. 11)
Tiempo medio de restauración de incidentes críticos	Suma de tiempos de restauración / incidentes críticos del mes	≤ 4 h	BA, Art. 78.3 (BA, p. 40)
Reincidencia por la misma causa raíz	Incidentes con causa raíz repetida	≤ 1 por trimestre	BA, Art. 78.3 (BA, p. 40)



Caso habilitan. Dos de esas metas (tasa de cambios fallidos y tiempo de restauración) vienen del Art. 78.3 y rigen en la Operación. La reincidencia también proviene del Art. 78.3, pero no es una métrica de entrega. Otras dos, la de defectos escapados y la de observaciones repetidas, protegen la aceptación de los hitos de la implementación (BA, p. 40).

Costo de la calidad y subtotal de conformidad. El PMBOK distingue el costo de conformidad, que se gasta para evitar fallas (prevención y evaluación), del costo de no conformidad, que se paga por las fallas (internas, si las encuentra el proyecto; externas, si las encuentra el cliente) (PMI, 2017, pp. 274 y 282–283). El plan lo calcula en horas-hombre, porque la Oferta Técnica no puede contener montos (BA, Art. 50.2, p. 29). La Tabla 9.6 sintetiza el subtotal de conformidad del Anexo 9.C.1; el Anexo 9.C.2 estima separadamente el retrabajo interno y externo por evento y evita sumarlo dos veces a la línea base.

Tabla 9.6 Subtotal de conformidad en horas-hombre. Fuente: (Subdocumento 9, secciones 9.C.1 y 9.C.3); (Formulario T-14, paquetes indicados en 9.C.1); (Formulario T-15, estimación por paquete y rol).

Categoría	HH	Proporción	Paquetes principales
Prevención	4.224,00	35,2 %	2.6, 3.10.2 y 8.2.4
Evaluación	7.792,00	64,8 %	Banco, mapeo y piloto de frío; certificaciones, restauraciones y pruebas en Operación
Total programado	**12.016,00**	**100,0 %**	Sin importes esperados de fallas

La conformidad programada suma 12.016 HH, el 5,5 % de las 220.023 HH de la línea base (12.016 / 220.023 = 0,0546). Incluye 880 HH de banco, mapeo y piloto de frío, ya programadas en 2.4.3, 2.4.4 y 4.1.4, sin aumentar ni duplicar la línea base; además, incluye 128 HH de restauraciones anteriores a Operación y la reestimación por ocurrencia del T-15. La evaluación pesa más que la prevención por las certificaciones y pruebas periódicas exigidas. La no conformidad se estima por evento y por rol: los escenarios de referencia del Anexo 9.C.2 suman 95,5 HH por falla interna y 111,5 HH por falla externa, incluida una regresión manual completa. Son parámetros de planificación, no frecuencia prevista ni reserva garantizada. Para calcular el costo integral se añade el esfuerzo de fallas efectivamente previsto o consumido, descontando el trabajo ya incluido en la línea base. El mantenimiento correctivo comparte 8.2.1 con el evolutivo y los defectos escapados se siguen como métrica.

9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad

Esta sección describe cómo se aplican los umbrales de 9.1. Las puertas y la revisión del código aseguran el proceso; las pruebas controlan el producto; la trazabilidad une ambos con la aceptación; y el ciclo de mejora corrige el proceso cuando los resultados lo piden.

Alex

Media firma: Alex Aravena

9.2.1 Puertas de calidad

Una puerta de calidad es un punto del recorrido de un cambio donde un criterio objetivo decide si avanza. La Figura 9.3 presenta las siete puertas sobre la cadena de entrega del SD4, desde el computador del desarrollador hasta la operación.

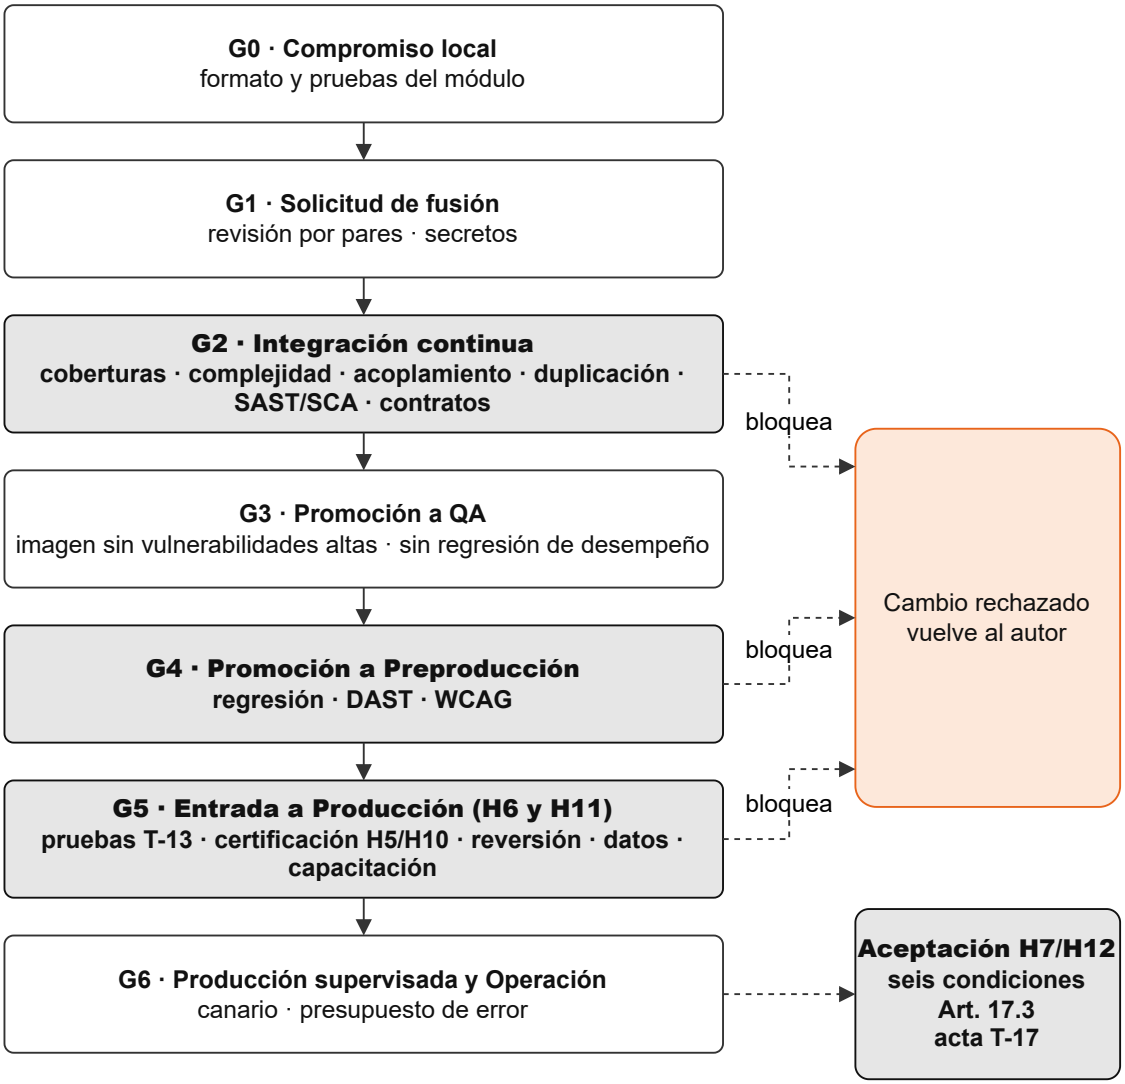


Figura 9.3 Puertas de calidad en la cadena de entrega. Fuente: (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Formulario T-10, apartado DevSecOps); (Subdocumento 9, anexo 9.B); (Formulario T-17, sección 4.3).

G5 se aplica en el momento en que cada etapa entra a Producción, al iniciar su marcha blanca (H6 y H11), porque desde ese día la solución opera con datos y pedidos reales de Puelche. Exige el H5 o el H10 aceptado, las pruebas aplicables del T-13 aprobadas, la reversión ensayada, la conciliación sin diferencias no explicadas y los usuarios de la ola capacitados (T-17, 4.3). Los hitos H7 y H12 no son una puerta técnica: son las actas de aceptación contractual del Formulario E-25. Cada una sigue al paso a producción, que habilita el acta de cierre de

Alex

la marcha blanca firmada con las seis condiciones copulativas del Art. 17.3 (paquetes 4.2.1 y 4.3.1). G5 no adelanta ese paso; habilita el ambiente de Producción para que la marcha blanca opere con datos reales bajo control (BA, p. 13).

Las puertas están ordenadas por costo: el control es más barato cuanto antes ocurre. G0 a G2 se ejecutan en minutos sobre cada cambio; G5 se ejecuta dos veces en el contrato y exige semanas de prueba. La Tabla 9.7 resume qué bloquea cada puerta y quién puede levantarla; el Anexo 9.B detalla las reglas y herramientas.

Tabla 9.7 Bloqueo y autoridad por puerta. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-04.05, p. 10); (Subdocumento 9, anexo 9.B); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1.4); (Formulario T-17, sección 4.3).

Puerta	Momento	Bloquea si	Quién puede levantar el bloqueo
G0–G1	Compromiso y solicitud de fusión	Falta la aprobación de un par; hay un secreto o un error de formato	Nadie; se corrige
G2	Integración continua	Falla un umbral de la Tabla 9.4; hallazgo crítico o alto; contrato roto	Nadie
G3	Promoción a QA	Imagen con vulnerabilidad crítica o alta; p95, errores o colas peores que en la última versión aceptada	Nadie; se corrige
G4	Promoción a Preproducción	Regresión con fallas; alerta alta de DAST; incumplimiento WCAG; defecto crítico o alto abierto	Nadie
G5	Entrada de cada etapa a Producción (H6 y H11)	Prueba habilitante no aprobada; defecto crítico o alto abierto; falta el acta de certificación (H5 o H10)	Nadie; el acta no levanta una prueba fallida
G6	Producción desde H6/H11 y Operación	Canario fuera de umbral; presupuesto de error crítico del mes agotado	Nadie; reversión automática y suspensión de despliegues no correctivos

Ninguna puerta admite excepciones. Una regresión de desempeño en G3 bloquea la promoción hasta corregirla, como dispone el SD4, sección 4.2.4.1.1, y ningún hallazgo de seguridad crítico o alto se acepta con registro de deuda, como exige el RT-04.05. Las correcciones durante una marcha blanca no repiten G5: pasan por G0 a G4 y G6, con regresión completa, y repiten la prueba de certificación que su cambio afecta (sección 9.3.2) (BTT, p. 10).

9.2.2 Revisión por pares y análisis estático y dinámico

Toda modificación entra a la rama principal por una solicitud de fusión. La rama está protegida y la escritura directa está prohibida (RT-04.03). La fusión requiere la aprobación de un par que no haya escrito el cambio. Los cambios en servicios de nivel crítico o alto del SD4, sección 4.2.4.3, requieren además al arquitecto del frente, y los cambios en autenticación, cifrado o datos personales, al Encargado de Seguridad. La revisión entre pares es una forma de inspección (PMI, 2017, p. 303): el revisor verifica lo que una herramienta no ve, es decir, que el cambio implemente el requisito citado, que las pruebas prueben la regla y no solo recorran líneas, y que los nombres de los componentes sean los del SD3 y del SD4 (BTT, p. 10).

Análisis estático. Se ejecuta en G1 y G2 sobre cada cambio. En PHP: PHPStan con Larastan, PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics y deptrac; en Kotlin: detekt; en TypeScript: ESLint. El análisis de seguridad cubre los cinco controles mínimos del RT-04.05: análisis estático de código, composición de software, secretos, imágenes de contenedor y pruebas unitarias, con bloqueo automático. Los contratos OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 se validan con Spectral y se prueban con Pact (Formulario T-10) (BTT, p. 10).


Análisis dinámico. Ejecuta el software. En QA, OWASP ZAP recorre portales y API, y MobSF analiza la aplicación Android sobre un dispositivo; una alerta alta detiene G4. La accesibilidad se evalúa con axe-core y con revisión manual (teclado, lector de pantalla y contraste bajo sol directo), porque el RT-13.01 exige ambas verificaciones. La carga, el estrés y la inyección de fallas también son análisis dinámico y se describen en 9.2.3 (BTT, p. 26).

9.2.3 Estrategia de pruebas conforme a ISO/IEC/IEEE 29119

La estrategia sigue los tres niveles de proceso de ISO/IEC/IEEE 29119-2. En el nivel organizacional rige la política de pruebas de LafroX. En el nivel de gestión, el plan de pruebas del proyecto, que es el Formulario T-13, se monitorea y se cierra en cada hito. En el nivel dinámico se diseñan, ejecutan e informan los casos (ISO, IEC & Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2021a). La intensidad de la prueba sigue el riesgo (ISO, IEC & IEEE, 2022). La regla de dimensionamiento por riesgo de LafroX asigna cinco casos a un requisito de prioridad crítica, tres a uno alto y dos a uno medio; el plan del H1 la contrasta con el diseño real de los casos. Las técnicas de diseño se eligen por tipo de regla (ISO, IEC & IEEE, 2021b): valores límite para los umbrales térmicos y de crédito, tablas de decisión para la asignación de stock, transición de estados para el ciclo del pedido y de la guía, y casos de uso para los flujos del SD3.

Niveles, tipos y ambientes. La Figura 9.4 ubica cada nivel y tipo de prueba en el ambiente donde se ejecuta.

La figura sigue la regla de los ambientes del SD4: el software se prueba en un ambiente cada vez más parecido a producción y lo que se promueve es la misma imagen. Desarrollo concentra las pruebas rápidas y aisladas; QA, las de integración y regresión con datos controlados; Preproducción, equivalente a producción en topología y configuración (RT-04.02), las que dependen de la escala y de las fallas. Las pruebas propias del caso, como el turno sin se-



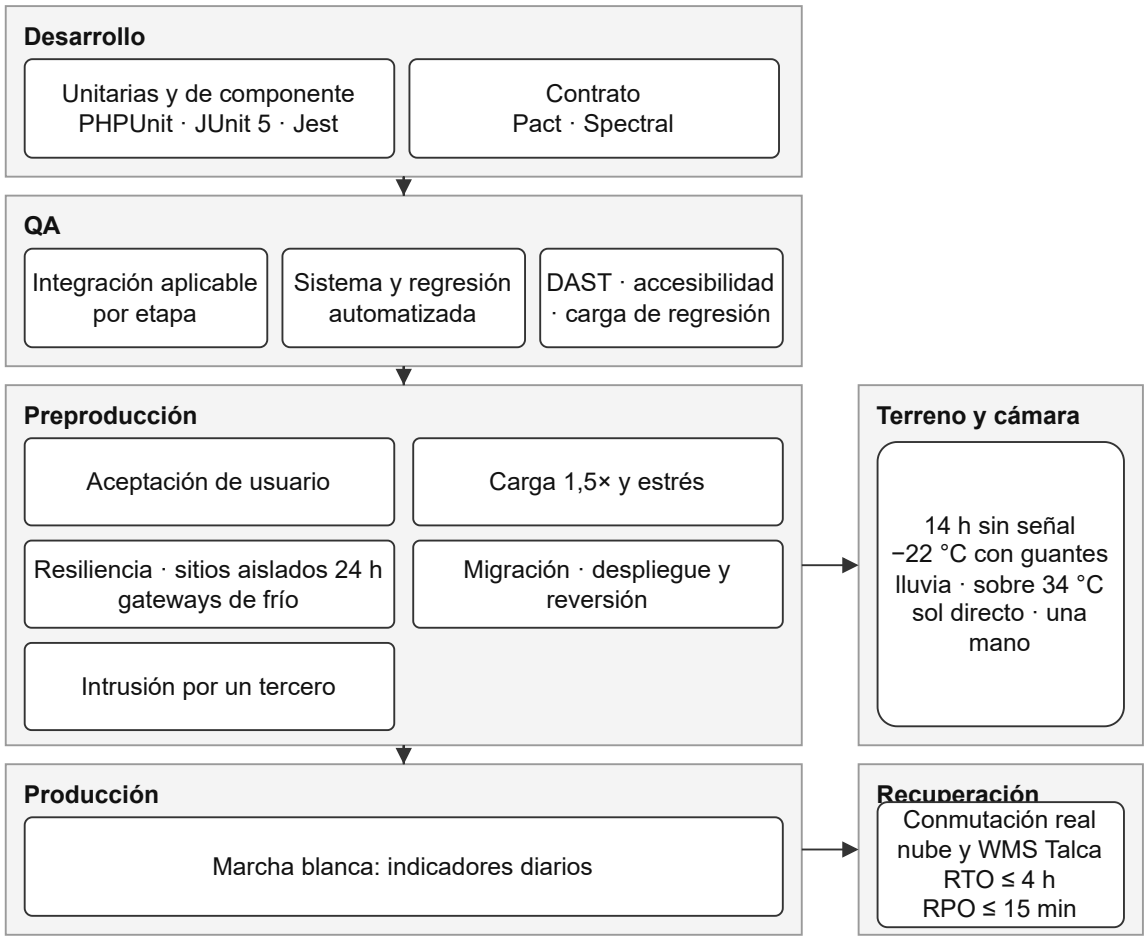


Figura 9.4 Niveles y tipos de prueba por ambiente. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, secciones 4.1 y 20.1, pp. 10, 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Formulario T-13, secciones 3, 4 y 7).

ñal y la cámara de congelado, no caben en un ambiente de nube y se ejecutan en terreno con dispositivos reales.

Las campañas de certificación con estados incompatibles no pueden compartir la misma instancia al mismo tiempo: la resiliencia necesita carga sostenida, la intrusión exige una versión congelada y la aceptación necesita datos estables. Migración, intrusión y aceptación usan instancias separadas; carga, resiliencia y despliegue comparten PRE-C en sesiones sucesivas con restitución entre ellas (T-13, sección 4.1). Todas se reconstruyen desde el mismo código y siguen siendo Preproducción, no un sexto ambiente.

Pruebas aplicables por etapa y antes de cada entrada a Producción. La BTT, sección 20.1, fija diez tipos de prueba con su momento y su criterio de salida. La Tabla 9.8 presenta los diez tipos y dos pruebas adicionales, con alcance en ambas etapas; el T-13, secciones 6 y 7, los especifica con sus criterios de entrada y salida (BTT, pp. 34–35).

Respecto de la BTT, se suman dos pruebas, adicionales a los diez tipos: el perfil operacional, por los RT-03.10, RT-03.13 y RT-13.08, y el despliegue sin interrupción, por las BA, Art. 24. Ninguna prueba tiene un criterio de salida cualitativo: todas terminan en un número o en

Alex

Tabla 9.8 Pruebas aplicables por etapa y antes de cada entrada a Producción. Fuente: (Bases Administrativas, art. 24, p. 17); (Bases Técnicas Transversales, sección 20.1, pp. 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Formulario T-13, secciones 3, 6 y 7).

Prueba	Ambiente	Carga o escenario	Criterio de salida
Unitarias y de componente	Desarrollo/CI	Lógica de negocio y componentes, ambas etapas	Cobertura ≥ 70 % negocio y ≥ 80 % global; 0 pruebas fallidas
Integración	QA	Interfaces de E1; en E2, las 15 y regresión E1	0 flujos con error
Sistema y regresión	QA y Preproducción	Batería completa antes de promover, ambas etapas	0 fallas y 0 regresiones
Aceptación de usuario	Preproducción	Casos del SD3 con preventistas, conductores y bodega	Casos firmados por la Contraparte Técnica
Carga y estrés	Preproducción	21,99 TPS; escalones de 3× y 4×	p95 de la Tabla 9.3; punto de quiebre sin pérdida
Resiliencia	Preproducción	Caída de instancia, zona y dependencia; latencia; disco; 24 h sin enlace en cada sitio; caída de un gateway de frío; pérdida de fibra y LTE	Recuperación sin intervención; bloqueo térmico local ≤ 5 s
Perfil operacional	Terreno	−22 °C con guantes; lluvia; > 34 °C; sol; una mano (E1 y regresión del alcance cambiado en E2); desconexión de 14 h por separado	5 de 5 condiciones; 0 pérdidas/duplicados y sincronización ≤ 10 min en desconexión
Recuperación ante desastres	Recuperación	Conmutación regional real y recuperación de la sala de Talca en la nube	RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min
Seguridad ofensiva	Preproducción	Tercero independiente	0 hallazgos críticos o altos abiertos
Accesibilidad	QA y Preproducción	axe-core y revisión manual	0 incumplimientos WCAG 2.2 A/AA, con informe
Migración	Preproducción	Dos ensayos con 32,11 GB	0 diferencias no explicadas
Despliegue sin interrupción	Preproducción	Canario con reversión	Sin interrupción ni intervención manual

Alex

una firma (BA, p. 17).

Pruebas de la arquitectura híbrida. La solución opera en la nube y en cinco sitios con servicio local: los CD de Talca y Concepción y tres cross-docking (SD4, secciones 4.1.3.2 y 4.1.21). Las pruebas de la Tabla 9.8 incluyen los nueve protocolos de aceptación que el SD4, Anexo 4-V, define para esa arquitectura. Entre ellos están el aislamiento de cada sitio por 24 horas con despacho de guías preemitidas (AL-OFF-01), las 96 guías emitidas por fibra, LTE y Starlink con fallas inyectadas (AL-DTE-01) y la recuperación en la nube del WMS de Talca dentro del RTO y el RPO (AL-DR-01). La resiliencia agrega la caída de uno de los dos gateways de frío de Talca: el otro lee ambas cámaras y el bloqueo térmico local actúa en menos de cinco segundos (SD4, sección 4.1.11, ADR-22). El T-13, sección 7.5, asigna cada protocolo a su campaña.

Carga derivada del dimensionamiento. La carga de prueba no se elige: se deriva del SD4, sección 4.2.6, aplicando el factor 1,5 que exigen el Art. 24 y el RT-09.06. La Tabla 9.9 muestra la derivación (BA, p. 17; BTT, p. 21).

Tabla 9.9 Derivación de la carga de prueba. Fuente: (Bases Administrativas, art. 24, p. 17); (Bases Técnicas Transversales, RT-09.03 y RT-09.06, p. 21); (Subdocumento 4, secciones 4.2.6.3 y 4.2.6.4); (Subdocumento 4, secciones 4-W.2 y 4-W.3); (Formulario T-13, sección 7.1).

Magnitud	Peak declarado	Carga de prueba
TPS máximo de septiembre	14,66 TPS	1,5 × 14,66 = 21,99 TPS
TPS máximo de la ventana de 05:30 a 07:00	6,94 TPS	1,5 × 6,94 = 10,41 TPS, durante 90 minutos
Personas usuarias concurrentes	775,33	1,5 × 775,33 = 1.163
Dispositivos de terreno simultáneos	158	1,5 × 158 = 237
Crecimiento sin rediseño (RT-09.03) (BTT, p. 21)	14,66 TPS	3 × 14,66 = 43,98 TPS

La prueba de la ventana de despacho tiene un criterio adicional: cero minutos de indisponibilidad, porque el Caso no admite ninguno entre 05:30 y 07:00 (RT-10.05). El escalón de 3× comprueba el crecimiento que exige el RT-09.03; el de 4× busca el punto de quiebre y verifica que, al superarse la capacidad, la solución encole y avise en vez de perder transacciones (RT-09.08).

Automatización. La prioridad del SD3 comprende 270 RF/RNF: 64 críticos, 163 altos y 43 medios. El T-12 contiene 334 RT cumplidos, 18 parciales y 22 no cumplidos: 352 RT con casos previstos y 22 brechas visibles. Con cinco, tres y dos casos por prioridad, uno por RT ofertado y siete por cada una de quince interfaces, el catálogo suma 1.352 casos únicos. La matriz individual y sus criterios de origen están en T-13, sección 8.2.

El reparto de planificación es 1.082 automáticos y 270 manuales. A treinta segundos por

Alex

caso, la parte automática requiere unas 9,0 horas de ejecutor o 4,5 con dos ejecutores; a quince minutos por caso manual, la otra parte requiere 67,5 HH por ciclo. La regresión completa incluye ambas: una ejecución nocturna automática no acredita por sí sola los casos manuales ni su disponibilidad de personas. El T-13, sección 8.3, define la programación de ventanas y dotación sin introducir una excepción a G4. En E1 se ejecuta todo el alcance aplicable a esa etapa; E2 agrega portales/EDI y regresa E1.

9.2.4 Datos de prueba

Ningún ambiente no productivo contiene datos productivos reales sin anonimización verificada. La regla protege los datos personales de clientes, de conductores de terceros y la geolocalización de trabajadores (Ley N.º 21.719, 2024), y los campos que el Caso, RT-11.10, exige cifrar. El ambiente de Recuperación ante Desastres no es un ambiente de prueba funcional: es una réplica productiva protegida que solo se usa para la conmutación real.

La Figura 9.5 muestra de dónde vienen los datos de cada ambiente.

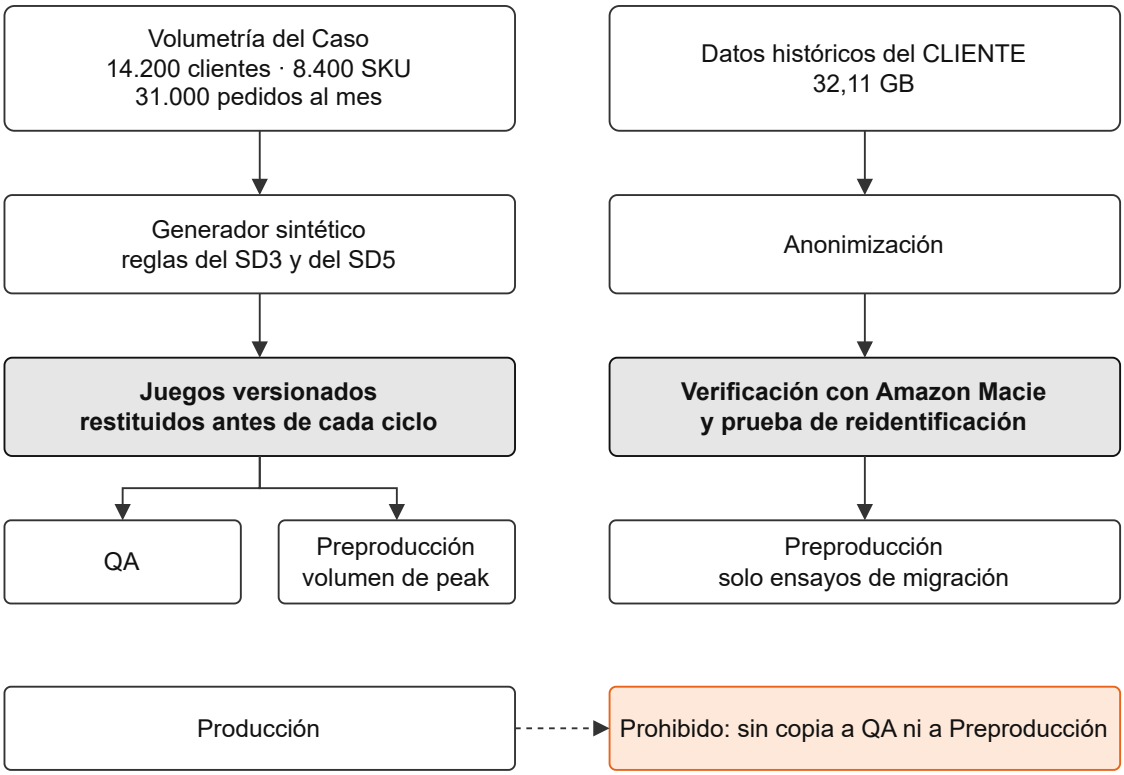


Figura 9.5 Origen y control de los datos de prueba. Fuente: (Bases Técnicas del caso, sección 14.1, pp. 24–25); (Subdocumento 5, sección 5.3); (Formulario T-13, secciones 4 y 5).

Los ambientes de prueba se alimentan de dos fuentes. Los datos sintéticos se generan desde la volumetría del Caso, sección 14.1, y respetan las reglas del negocio: lotes con vencimiento, productos refrigerados con su rango térmico y clientes con crédito. Así, la prueba de carga opera sobre un volumen comparable al del peak. Los datos históricos se usan solo en

Alex

los ensayos de migración, después de anonimizarlos y de verificar con Amazon Macie que no queden datos personales. QA restituye sus juegos a un estado conocido antes de cada ciclo, para que un fallo sea reproducible. Esa misma propiedad usa la innovación INN-02 para convertir un incidente de terreno en una prueba de regresión permanente (SD13, sección 13.2). El T-13, sección 5, especifica cada juego.

9.2.5 Verificación, validación y trazabilidad

La verificación comprueba que cada producto cumpla su especificación; la validación comprueba que la solución resuelva el problema de Puelche. El PMBOK separa ambos momentos: controlar la calidad lo hace el equipo y produce entregables verificados; validar el alcance lo hace el cliente y produce entregables aceptados (PMI, 2017, p. 305). La Figura 9.6 empareja cada artefacto de diseño con la prueba que lo verifica o lo valida y con el hito que lo cierra.

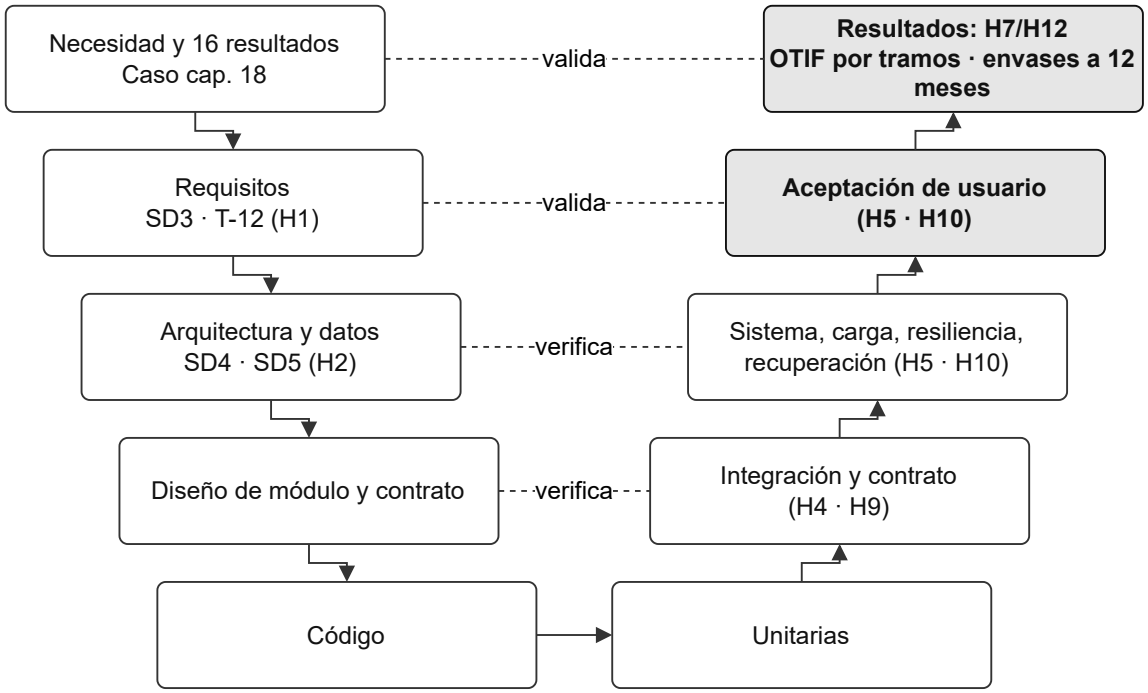


Figura 9.6 Verificación y validación por nivel y por hito. Fuente: (Bases Administrativas, Formulario E-25, pp. 74–75); PMI (2017, sección 8.3.3.2); (Formulario T-13, secciones 3 y 6); (Formulario T-17, secciones 4 y 5).

La certificación técnica de cada etapa (H5 y H10) no basta para aceptar los resultados del negocio. Los dieciséis resultados del Caso, capítulo 18, tienen aceptación diferenciada según el T-17, sección 5, y el Anexo 9.D: doce se aceptan definitivamente en H7 y dos en H12. R18-04 (OTIF) se acepta por tramos en los meses 15, 19 y 32; R18-12 (envases) tiene aceptación provisional en H7 y final tras doce meses de operación medida. Las actas H7/H12 no anticipan estas dos aceptaciones pendientes. La aceptación no libera de responsabilidad por defectos posteriores (BA, Art. 18.4, p. 13).

Alex

Trazabilidad. La cadena que exige el Caso, sección 17.1, va del origen al criterio de aceptación: origen, requisito, componente, paquete de la EDT, prueba y criterio. El RT-04.04 le agrega el cambio de código y el despliegue. La Figura 9.7 presenta la cadena con un requisito crítico como ejemplo: la lista de clientes afectados por un lote en menos de dos horas.

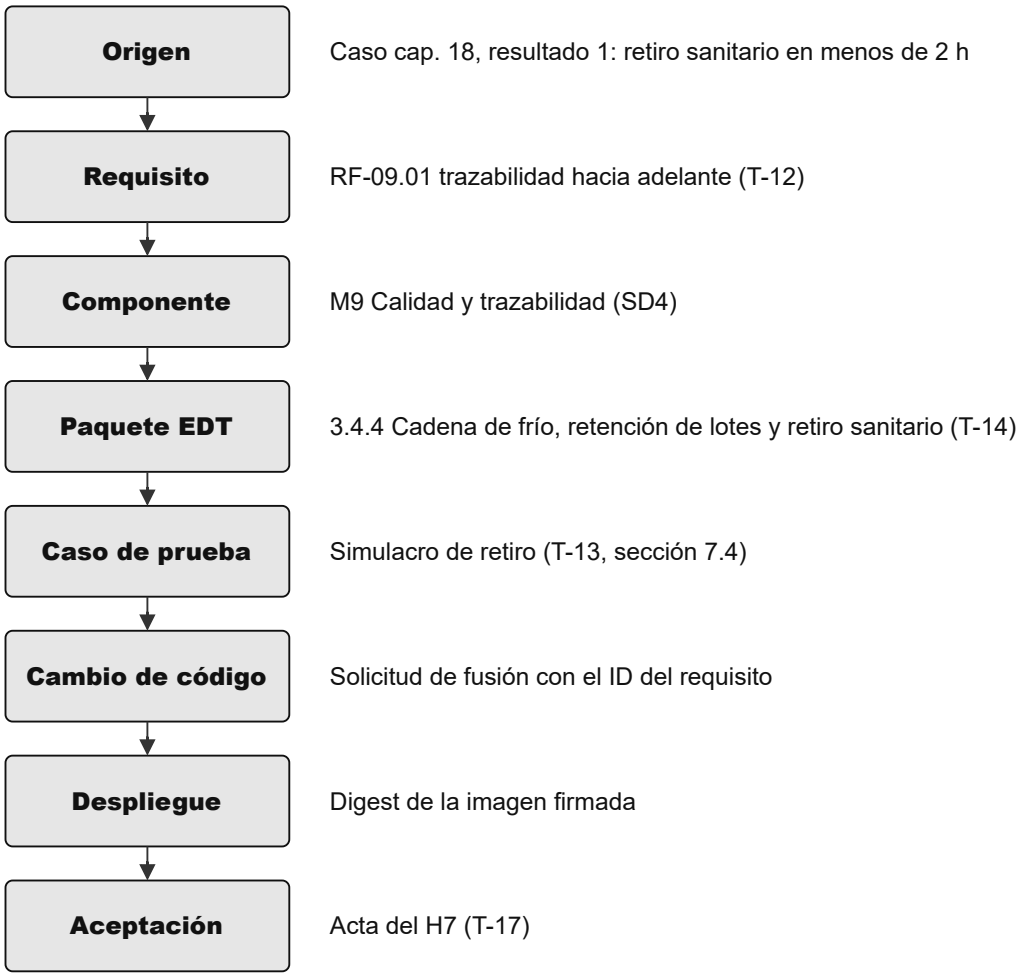


Figura 9.7 Cadena de trazabilidad de extremo a extremo. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-04.04, p. 10); (Bases Técnicas del caso, sección 17.1 y cap. 18, pp. 31–35); (Subdocumento 9, anexo 9.D); (Formulario T-13, sección 7.4); (Formulario T-17, sección 5).

Ningún eslabón de la cadena es nuevo: cada uno se apoya en un identificador que ya existe en la propuesta. La matriz se lee en dos sentidos: hacia atrás explica por qué existe cada componente; hacia adelante, dónde quedó implementado y probado cada requisito. Cada caso de prueba lleva el identificador de su requisito, cada solicitud de fusión cita el requisito o la incidencia que atiende, y cada despliegue registra el digest de su imagen. La matriz prevista individual se publica en T-13, sección 8.2: 270 RF/RNF, 374 RT y nueve filas absorbidas o alias identificadas aparte, con criterio de origen, casos previstos, etapa y paquete del T-12. Esta sección es su índice de trazabilidad. El generador del SD9 conserva los identificadores y la versión del catálogo SD3/T-12; el historial de integración agregará después el cambio de

Alex

Media firma: Alex Aravena

código, digest, resultado y acta. No se presenta la matriz prevista como evidencia de pruebas ya ejecutadas. La meta es que el 100 % de los requisitos ofertados tenga al menos una prueba aprobada antes de su hito. Los 22 RT en estado «No cumple» quedan en la matriz sin prueba, para que la Contraparte Técnica vea la brecha en lugar de un vacío. El Anexo 9.D muestra el tramo final de la cadena para los dieciséis resultados del caso.

9.2.6 Control de la calidad y mejora continua

Controlar la calidad es comparar el resultado con su criterio y actuar cuando no lo cumple (PMI, 2017, p. 298). Esta sección describe cómo se tratan los defectos, cómo se detecta un proceso que se sale de control y cómo se mejora.

Defectos. Un defecto es toda diferencia entre el resultado esperado de una prueba y el obtenido. Se registra en GitLab con el caso de prueba, el requisito, el ambiente, la versión y la evidencia. La severidad usa las cuatro clases de nivel de servicio del SD4, sección 4.2.4.3, para que un defecto y un incidente se midan con la misma vara: es crítico si afecta la preparación, el despacho o la emisión de la guía en la ventana de 05:30 a 07:00, el bloqueo por excursión térmica o la identidad de bodega. Un defecto se cierra solo cuando la prueba que lo detectó pasa y queda incorporada a la regresión. Ningún defecto crítico o alto abierto pasa G4, y ninguna marcha blanca se cierra con uno abierto (BA, Art. 17.3, p. 13).

Detección de un proceso fuera de control. El plan distingue tolerancia de límite de control (PMI, 2017, pp. 274 y 304). La tolerancia es el rango aceptable que fija un requisito; por ejemplo, el p95 de la línea de preparación no puede superar 1 s. El límite de control se calcula con la variación histórica de una métrica y marca cuándo el proceso deja de ser estable, aunque siga dentro de la tolerancia. El Comité de Calidad lleva diagramas de control de dos métricas: el p95 de la carga de regresión semanal en QA y la densidad de defectos por módulo. Como regla propuesta por LafroX, los límites se calculan con las primeras ocho mediciones de cada métrica y se actualizan cada trimestre; antes de esas ocho mediciones no hay límites, porque no existe historia que los sustente. Un punto fuera de los límites, o siete puntos seguidos del mismo lado de la media, abre un análisis antes de que la tendencia llegue a la tolerancia. Las causas de los defectos se ordenan cada mes en un diagrama de Pareto, para atacar primero las que explican la mayor parte.

Causa raíz. Un defecto reabierto dos veces por la misma causa, un defecto escapado a Producción y todo incidente crítico pasan a análisis de causa raíz (PMI, 2017, p. 292). El análisis usa un diagrama de causa y efecto con las categorías de personas, proceso, herramientas, datos, ambiente y gestión, y el formato que el Art. 25 de las BA exige para los incidentes críticos. La reincidencia por la misma causa raíz no puede superar un evento por trimestre en la Operación (BA, Art. 78.3, p. 40).

Ciclo de mejora. Las acciones siguen el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PMI, 2017, p. 296). La Figura 9.8 muestra el ciclo y sus entradas.

El ciclo tiene dos salidas que el PMBOK exige y que suelen faltar en un plan de calidad. La primera es el registro de lecciones aprendidas, que se alimenta de cada acción cerrada y de una retrospectiva al término de cada certificación (H5 y H10) y de cada marcha blanca (H7 y

Alex

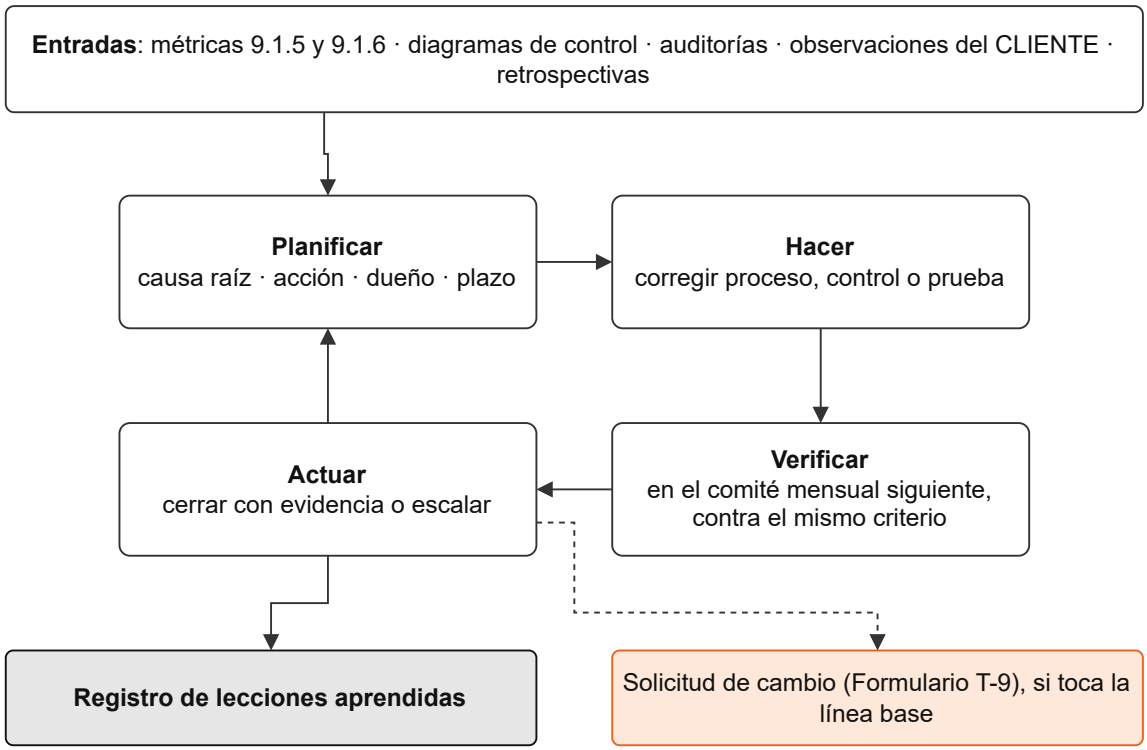


Figura 9.8 Ciclo de mejora de la calidad. Fuente: elaboración a partir de PMI (2017, sección 8.2.2.8); (Formulario T-9, procedimiento de control de cambios); (Formulario T-13, secciones 10 y 12).

H12); cada retrospectiva revisa qué funcionó, qué se debe cambiar y qué se lleva a la Etapa 2 o a la Operación (PMI, 2017, p. 305). La segunda es la solicitud de cambio: si una acción de mejora toca la línea base del alcance, del cronograma o de un umbral, pasa por el control integrado de cambios del Formulario T-9 (PMI, 2017, p. 296). Una acción se cierra solo cuando el comité siguiente comprueba su eficacia con el mismo criterio que detectó la desviación.

Informes de calidad. El Líder de Calidad emite un informe mensual al Comité de Calidad y a la Contraparte Técnica con las métricas de proceso, los defectos por severidad y por módulo, el estado de la matriz de trazabilidad, los diagramas de control y las acciones de mejora abiertas (T-13, sección 12).

9.3 Alineación con Plan de Trabajo

Esta sección muestra dónde quedan las actividades de calidad en la EDT del Formulario T-14 y en el cronograma del SD7, con sus horas, sus meses y los hitos que habilitan.

9.3.1 Actividades de calidad en la EDT

La EDT no tiene una rama de calidad aislada. Las actividades de calidad están en las cuentas donde se produce lo que verifican, y el diccionario de cada paquete registra su criterio

Alex

de aceptación, como indica el PMBOK para los requisitos de calidad (PMI, 2017, p. 287). La Tabla 9.10 agrupa esos paquetes.

Tabla 9.10 Paquetes de calidad de la EDT. Fuente: (Formulario T-14, cuentas y paquetes indicados); (Formulario T-15, secciones 5.2 y 6.1); (Subdocumento 9, anexos, sección 9.C.1).

Cuenta	Paquetes	Meses	HH
1.2 y 1.5: trazabilidad, plan y puertas	1.2.4; 1.5.1; 1.5.2	2; 6 a 20	240
2.6: usabilidad con personas usuarias	2.6.1 a 2.6.3	2 a 4	720
2.4 y 4.1: validación física de frío	2.4.3; 2.4.4; 4.1.4	3; 4; 10 y 11	880
3.8: pruebas y certificación de la Etapa 1	3.8.1 a 3.8.8	9 a 11	2.240
3.9: pruebas y certificación de la Etapa 2	3.9.1 a 3.9.7	16 y 17	1.600
3.10.2: INN-02, reproducción de incidentes	3.10.2.1 a 3.10.2.4	2 a 15	960
4.1.2: ensayo de reversión	4.1.2	11	80
8.1 a 8.3: pruebas y deuda en la Operación	8.1.3; 8.1.6; 8.2.2; 8.2.4; 8.3.1	21 a 56	5.168
4.2.1; 4.2.2; 4.3.1: restauraciones previas	Componentes SRE separados	13 a 20	128
Total			**12.016**

La tabla suma las mismas 12.016 HH de conformidad del costo de la calidad (9.1.6). La cuenta 3.8 ocupa los meses 9 a 11: las pruebas terminan en noviembre y la preparación del acta 3.8.7 concluye el 1 de diciembre, sin intervenir sistemas en el congelamiento. La cuenta 3.9 ocupa los meses 16 y 17. Banco, mapeo y piloto de frío tienen sus propias ventanas en los meses 3, 4 y 10–11. Las pruebas de certificación empiezan con los módulos integrados; las holguras publicadas para revisión y eventual subsanación se muestran por hito, sin presumir que siempre basten. La disponibilidad posterior a las campañas cubre subsanaciones y repetición de pruebas, no una campaña ininterrumpida. Durante esos bloques, el equipo de calidad toma como previsión los evaluadores subcontratados hasta 16 externos por día definidos en el Subdocumento 6, sección 6.1.3, y previstos por el Formulario T-15, sección 5.7, Tabla 9, para las campañas de los meses 9 a 12 y 16 a 18. El Jefe de Proyecto confirma la asignación nominal y su capacidad neta antes de reservar cada sesión; el máximo previsto no equivale a personas ya disponibles. La concurrencia diaria máxima de CAL que resulta de los paquetes del T-15 es de 82,9 HH en E1 y 64,0 HH en E2, es decir, 13 y 10 evaluadores-día, bajo el techo de 102,4 HH netas (T-13, sección 8.3). La jornada nominal de planificación es de 8 horas, con 6,4 HH netas al 80 % por persona y día; sólo se cuentan los días efectivamente contratados y asignados. El límite diario de 102,4 HH externas no se suma a la reserva ni acredita por sí solo la disponibilidad de la plantilla interna. Las 5.168 HH de la Operación muestran que la calidad no termina

Alex

con la aceptación final.

9.3.2 Calidad en el cronograma y en los hitos

La Figura 9.9 presenta la vista general de los 56 meses del contrato: las fases de cada etapa, las certificaciones, los doce hitos del Formulario E-25 y cada prueba periódica de la Operación en el mes en que se ejecuta, sobre las bandas de congelamiento del Caso.

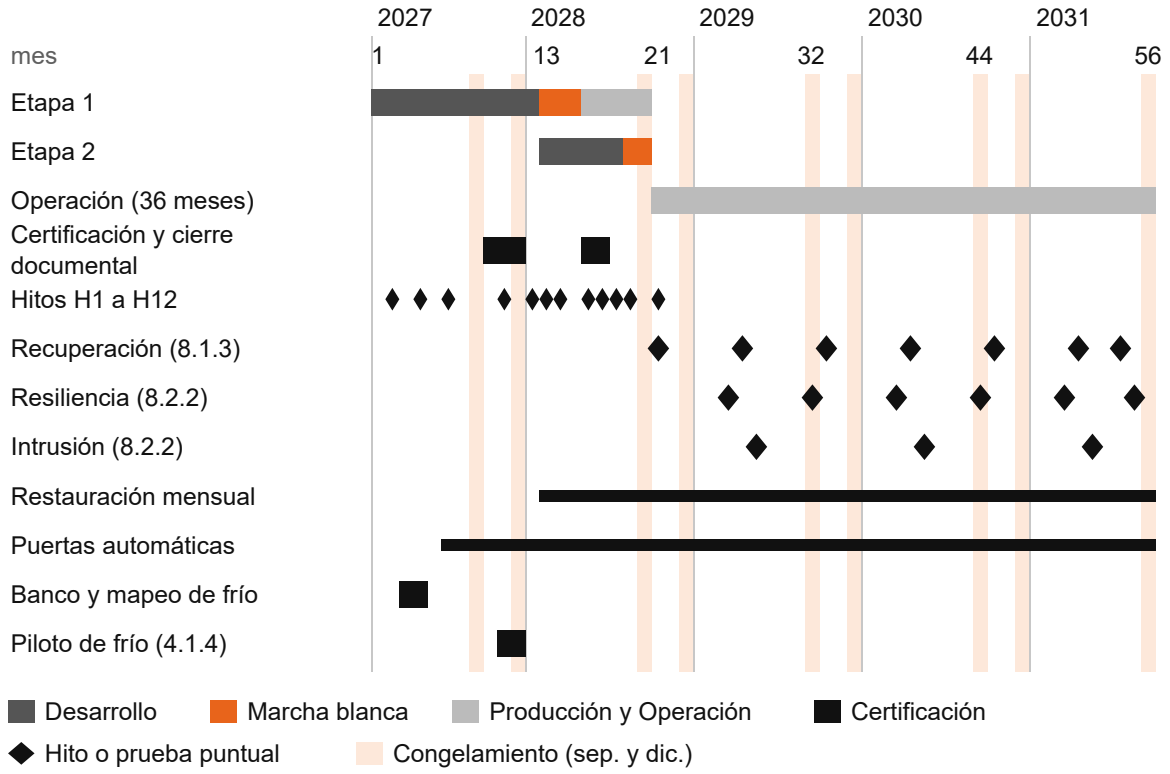


Figura 9.9 Vista general de las actividades de calidad en el cronograma del contrato. Fuente: (Bases Administrativas, Formulario E-25, pp. 74–75); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27); (Formulario T-14, cuentas 3, 4 y 8); (Formulario T-15, sección 6.1); (Formulario T-13, sección 9); (Formulario T-17, sección 4).

La vista general muestra dos concentraciones de calidad. La primera son las pruebas de certificación de los meses 9 y 10 y 16 y 17, con cierre documental E1 en el mes 11, que preceden a cada marcha blanca. La segunda son las pruebas periódicas de la Operación: siete recuperaciones, seis resiliencias y tres intrusiones, con separación máxima de seis meses para recuperación y resiliencia y de doce meses para intrusión. Solo dos de esas pruebas caen en una banda de congelamiento, las resiliencias de los meses 32 y 44, y por eso se ejecutan en Preproducción. La restauración de respaldos corre todos los meses desde el 13, cuando la marcha blanca empieza a operar con datos reales. Las Tablas 9.11 y 9.12 detallan mes a mes la implementación, meses 1 a 21. La fila que encabeza cada fase indica las actividades que corren durante toda la fase; cada mes muestra lo que empieza o se entrega en él, con su paquete

Alex

de la EDT, y el hito que se acepta. Los meses 8, 11 y 20 están congelados por el Caso.

En E1, INN-02 es continua desde el mes 2, las puertas automáticas desde el mes 6 y el refuerzo de evaluadores se prevé en los meses 9 a 12.

Tabla 9.11 Actividades de calidad mes a mes en la Etapa 1, meses 1 a 12. Fuente: (Bases Administrativas, Formulario E-25, pp. 74–75); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27); (Formulario T-14, cuentas 1 a 4); (Formulario T-15, sección 6.1); (Formulario T-13, sección 9.1); (Formulario T-17, sección 4).

Mes	Actividades de calidad que empiezan o se entregan (paquete EDT)	Hito
1 · feb 2027	—	
2 · mar 2027	Matriz de trazabilidad (1.2.4); plan de calidad y de pruebas (1.5.1); investigación con usuarios (2.6.1)	**H1**
3 · abr 2027	Prototipos y usabilidad (2.6.2); banco de frío (2.4.3)	
4 · may 2027	Indicadores de usabilidad (2.6.3); mapeo de frío por carrocería (2.4.4)	**H2**
5 · jun 2027	—	
6 · jul 2027	Puertas automáticas activas en la cadena de integración (1.5.2)	**H3**
7 · ago 2027	—	
8 · sep 2027, congelado	—	
9 · oct 2027	Integración y regresión (3.8.1), entregable del H4; inicio de la certificación (3.8.2 a 3.8.8); ensayo de migración 1 (3.7.2)	
10 · nov 2027	Revisión del H4; cierre de pruebas E1 e inicio del expediente 3.8.7; piloto de frío (4.1.4)	**H4**
11 · dic 2027, congelado	Entrega documental 3.8.7 del H5 el día 1; cierre del piloto sin cambios productivos; reversión (4.1.2) y ensayo de migración 2 en Preproducción (3.7.3 y 3.7.4)	
12 · ene 2028	Acta de conciliación y corte (3.7.5)	**H5**

En los meses 13 a 15 se mantienen los indicadores diarios y la restauración mensual de 4.2.1, y continúa INN-02 hasta el mes 15. En los meses 16 a 18 se mantiene la restauración mensual de 4.2.2 y se prevé el refuerzo de evaluadores; en los meses 19 y 20 los indicadores y restauraciones corresponden a 4.3.1. La Operación comienza en el mes 21.

Las dos tablas distinguen ejecución de pruebas, entrega documental y acta: las pruebas de certificación se concentran en los meses 9 y 10 y 16 y 17; el expediente E1 se entrega el 1 de diciembre y el acta H5 se calcula en enero. El piloto de frío sigue hasta diciembre sin modificar sistemas productivos. El calendario detallado de T-13, sección 9.1, reproduce las ventanas publicadas del T-15; la asignación nominal se confirma conforme a las condiciones


Alex

Tabla 9.12 Actividades de calidad mes a mes en las marchas blancas, la Etapa 2 y la entrada a la Operación, meses 13 a 21. Fuente: (Bases Administrativas, Formulario E-25, pp. 74–75); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27); (Formulario T-14, cuentas 3, 4 y 8); (Formulario T-15, sección 6.1); (Formulario T-13, secciones 9.1 y 9.2); (Formulario T-17, sección 4).

Mes	Actividades de calidad que empiezan o se entregan (paquete EDT)	Hito
13 · feb 2028	Puerta G5: entrada de la Etapa 1 a Producción; inicio de la marcha blanca (4.2.1)	**H6**
14 · mar 2028	Revisión y acta H8 del alcance y diseño E2, entregados en febrero (1.2.5; 2.4.2)	**H8**
15 · abr 2028	Cierre de INN-02 en la implementación (3.10.2.4); primer tramo del OTIF (R18-04)	
16 · may 2028	Acta de aceptación de la Etapa 1 (4.2.3); integración y regresión E2 (3.9.1), entregable del H9; certificación E2 (3.9.2 a 3.9.7), con el perfil operacional del alcance cambiado	**H7**
17 · jun 2028	Revisión del H9 por el CLIENTE; acta de certificación E2 (3.9.6), entregable del H10	**H9**
18 · jul 2028	Revisión del H10 por el CLIENTE	**H10**
19 · ago 2028	Puerta G5: entrada de la Etapa 2 a Producción; inicio de la marcha blanca en convivencia con la Etapa 1 (4.3.1); segundo tramo del OTIF	**H11**
20 · sep 2028, congelado	Marcha blanca con el peak de septiembre	
21 · oct 2028	Acta de aceptación final (4.3.3); primera conmutación periódica de Operación (8.1.3); restauración mensual (8.1.6)	**H12**

del T-15.

El cierre documental de una certificación no equivale a intervenir sistemas en Producción. La ventana total de 3.8.5 incluye preparación/análisis; su intervención real se ejecuta del 26 al 29 de octubre de 2027, fuera del feriado del 1 de noviembre y de los primeros tres hábiles (2, 3 y 4). Las pruebas de la Etapa 1 terminan en noviembre de 2027, antes de diciembre; los ensayos de migración que coinciden con diciembre corren en Preproducción y no tocan Producción. La marcha blanca de la Etapa 2 coincide con el peak de septiembre de 2028 y con su congelamiento: es la exigencia más dura sobre la solución, porque se mide con el mayor volumen del año (Caso, cap. B, sección B.2). Durante ese congelamiento solo se corrige un defecto crítico o alto que impediría cumplir el Art. 17.3, por el procedimiento de cambio de emergencia del SD4, sección 4.2.4.1.4, con autorización escrita de la Contraparte Técnica y después de pasar G0 a G4 y repetir en Preproducción la prueba afectada (BA, p. 13).



Hitos y holgura. Cada hito se acepta con el protocolo del T-17: el entregable se presenta con su evidencia y su trazabilidad (BA, Art. 18.2, p. 13), el CLIENTE tiene 10 días hábiles para revisarlo y LafroX tiene otros 10 para subsanar observaciones (BA, Art. 18.3, p. 13). La Tabla 9.13 compara la reserva de cada hito con la duración de una subsanación.

Tabla 9.13 Reserva y holgura de los hitos ante una subsanación. Fuente: (Bases Administrativas, art. 18.3, p. 13); (Formulario T-17, secciones 2.3 y 4.1); (Formulario T-15, secciones 5.2 y 5.5).

Hito (mes)	Entregable que lo habilita	Holgura (días hábiles)	Margen tras 10 días de subsanación (días hábiles)
H1 (2)	Matriz de trazabilidad y plan de calidad	5	5 − 10 = -5
H2 (4)	Arquitectura, seguridad y datos	11	11 − 10 = 1
H3 (6)	Ambientes y puertas activas	17	17 − 10 = 7
H4 (10)	Integración y regresión E1	16	16 − 10 = 6
H5 (12)	Certificación E1	20	20 − 10 = 10
H8 (14)	Alcance y diseño E2	14	14 − 10 = 4
H7 (16)	Aceptación de marcha blanca E1	2	2 − 10 = -8
H9 (17)	Integración y regresión E2	19	19 − 10 = 9
H10 (18)	Certificación E2	13	13 − 10 = 3
H12 (21)	Aceptación final E2 y garantía	3	3 − 10 = -7

La holgura se mide después de la revisión formal del CLIENTE y no constituye personal de reserva. La tabla descuenta diez días de subsanación, pero no añade una segunda revisión: por tanto, un saldo positivo no garantiza aceptación y uno negativo exige medidas previas. H1, H7 y H12 tienen cinco, dos y tres días, menos que el plazo de subsanación; sus expedientes se revisan con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal (T-17, sección 2.3). H8 dispone de catorce días. La segunda revisión nunca se presume instantánea. Las fechas de la tabla son las del T-15; H6/H11 inician marcha blanca; el acta de cierre de cada marcha blanca, con las seis condiciones del Art. 17.3, habilita el paso a producción, y H7/H12 son las actas de aceptación posteriores. La cobertura de Operación de ambos alcances comienza desde el primer día del mes 21 y no espera el acta H12; no se introduce un cambio unilateral al calendario del SD7 en este capítulo.

Repetición de una prueba tras una corrección. Si una corrección durante la marcha blanca modifica un componente que cubrió una prueba de certificación, el Líder de Calidad repite esa prueba sobre la versión corregida antes de promoverla. Su alcance, HH por especialidad y ventana se estiman a partir del defecto y se autorizan por control de cambios. Primero se comprueba capacidad disponible sin consumir la cobertura de servicio ni la reserva protegida

Alex

Media firma: Alex Aravena

de otra etapa; si no alcanza, se acuerdan recursos y medidas correctivas. No se garantiza que baste el paquete original ni se presupone una reserva de un riesgo concreto.

extbfCorrecciones en congelamiento. Ninguna corrección se promueve a Producción durante un congelamiento (1 al 25 de septiembre, diciembre y los tres primeros días hábiles de cada mes) ni causa indisponibilidad en la ventana de 05:30 a 07:00 (Caso, RT-10.05). Un defecto detectado en esas fechas se contiene sin intervenir los sistemas, con la operación en convivencia con la forma actual de trabajar y seguimiento de los indicadores; su corrección se certifica en Preproducción y se promueve en la primera fecha permitida. Las Bases no prevén excepciones a esa prohibición y este plan no las presume: solo una instrucción escrita del CLIENTE, tramitada por el control integrado de cambios del Formulario T-9, puede ordenar una intervención en esas fechas, y aun así el cambio pasa por las mismas puertas.


9.3.3 Pruebas periódicas durante la Operación

Durante los 36 meses de Operación, las Bases exigen pruebas con frecuencia mínima. Toda prueba que intervenga Producción o el sitio de recuperación se programa fuera de los congelamientos de septiembre y diciembre y de los tres primeros días hábiles de cada mes (Caso, RT-10.05). La Tabla 9.14 resume el calendario; el T-13, sección 9.3, lo detalla.

Tabla 9.14 Pruebas periódicas de la Operación. Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07 y RT-11.20, pp. 17–18, 22, 24); (Formulario T-14, cuentas 4 y 8); (Formulario T-13, sección 9.3).

Prueba	Exigencia	Meses	Paquete
Recuperación con conmutación real	Dos veces al año (RT-07.07) (BTT, p. 17)	21, 27, 33, 39, 45, 51 y 54	8.1.3
Resiliencia por inyección de fallas	Una vez por semestre (RT-10.07) (BTT, p. 22)	26, 32, 38, 44, 50 y 55	8.2.2
Intrusión por un tercero	Anual (RT-11.20) (BTT, p. 24)	28, 40 y 52	8.2.2
Restauración de respaldos	Mensual (RT-07.12) (BTT, p. 18)	13 a 20 y 21 a 56	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6

Las cantidades coinciden con los entregables del T-14: siete pruebas de recuperación, seis de resiliencia, tres de intrusión y 36 restauraciones. La restauración mensual empieza antes, en el mes 13, porque desde la marcha blanca hay datos productivos: en los meses 13–15 la ejecuta SRE en 4.2.1, en 16–18 en el soporte puente 4.2.2 y en 19–20 en 4.3.1; esos ocho informes y sus 128 HH son distintos de los 36 informes de 8.1.6, con el mismo procedimiento de 8.1.6. Recuperación y resiliencia mantienen una separación máxima de seis meses; intrusión mantiene periodicidad anual (meses 28, 40 y 52). Las resiliencias de los meses 32 y 44 caen en septiembre y por eso se ejecutan en Preproducción, que no está congelada. Cada prueba



produce un informe con el resultado medido, la comparación con su umbral y el plan de corrección de las brechas (RT-07.07); las brechas entran al registro de deuda técnica (8.2.4) y a la gestión de la capacidad (8.4.1) (BTT, p. 17).

Referencias

Las fuentes citadas en este subdocumento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- CMMI Institute. (2018). *CMMI Development V2.0*. CMMI Institute.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *ISO/IEC 25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.
- McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.
- OWASP Foundation. (2019). *Application Security Verification Standard 4.0*. OWASP Foundation.
- OWASP Foundation. (2020). *Software Assurance Maturity Model (SAMM) v2.0*. OWASP Foundation.

Alex

Media firma: Alex Aravena

- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. OWASP Foundation.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation.

Declaración de uso de IA

El grupo usó inteligencia artificial generativa como apoyo en la redacción, en el diseño de las nueve figuras y en la verificación cruzada de cifras de este subdocumento, de sus anexos y de sus formularios. Las figuras se generaron con un script escrito con asistencia de IA que produce los archivos editables de draw.io. Las decisiones, las cifras y los cálculos derivan de las Bases y de los demás subdocumentos de la propuesta. La revisión humana de cada sección la registran los integrantes que la efectuaron. La Tabla 9.15 distingue el registro histórico de esta actualización. Junto con Patricio Henríquez y Guillermo Castillo, realizamos la revisión humana que se detalla a continuación.

Tabla 9.15 Declaración de uso de inteligencia artificial. Fuente: registro de asistencia de IA de este subdocumento.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code	Redacción a partir de las Bases (BA/BTT) y del Caso Logística	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Verificamos la alineación de los antecedentes del Caso 02 (retiro sanitario y excursión térmica), la consistencia de las referencias cruzadas con SD1 a SD7 y la trazabilidad frente a los artículos de las BA/BTT.

continúa en la página siguiente




Tabla 9.15 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
9.1 Plan de Calidad	Claude Code; Codex	Redacción, umbrales y actualización del costo de calidad	Alto	Alto	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Revisamos los 4 objetivos de calidad, las 8 características de ISO/IEC 25010 y las 8 métricas de código bloqueantes de la Tabla 9.4. También comprobamos el cuadre de las 12.016 HH del costo de la calidad y la sintaxis lógica de las Figuras 9.1 y 9.2.
9.2 Estrategia de Aseguramiento de Calidad	Claude Code; Codex	Reglas de calidad, actualización del catálogo, matriz y alcance por etapa	Alto	Alto	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Verificamos las reglas y los bloqueos de las compuertas G0–G6, el dimensionamiento de carga con un factor de 1,5× y un peak de 21,99 TPS, y el catálogo de 1.352 casos. Además, revisamos el protocolo de datos sintéticos y anonimizados y la consistencia técnica de las Figuras 9.3 a 9.8.

continúa en la página siguiente




Tabla 9.15 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
9.3 Alineación con Plan de Trabajo	Claude Code; Codex	Conciliación con T-14/T-15, calendario de campañas y actualización de diagramas	Alto	Alto	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Comprobamos la conciliación de las 12.016 HH en los paquetes EDT del T-15 y revisamos el calendario de hitos H1–H12. También verificamos que las pruebas quedaran fuera de los períodos de congelamiento de los meses 8, 11 y 20, el cálculo de holguras ante subsanaciones y el diagrama Gantt de la Figura 9.9.
Anexos 9.A a 9.D	Claude Code; Codex	Redacción, cálculos y actualización de conformidad y trazabilidad de frío	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Revisamos la consistencia matemática de las 42 métricas por subcaracterística, las reglas de las puertas de calidad, el desglose de HH de prevención y evaluación del Anexo 9.C, y la matriz de trazabilidad de los 16 resultados del caso, incluida la trazabilidad de frío de R18-03.

continúa en la página siguiente

Tabla 9.15 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-13	Claude Code; Codex	Calendario desde T-15 y trazabilidad de las validaciones de frío	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Verificamos la estructura del plan de pruebas bajo ISO/IEC/IEEE 29119, los criterios de aceptación por tipo de prueba, los protocolos de resiliencia híbrida y las validaciones de frío. Asimismo, comprobamos la concordancia de las fechas y las HH con el formulario T-15.
Formulario T-17	Claude Code; Codex	Entregas, actas, holguras y protocolo de subsanación	Alto	Ninguno	Patricio Henríquez y Guillermo Castillo. Revisamos el protocolo de actas de aceptación técnica y administrativa, las condiciones de cierre de la marcha blanca establecidas en el Art. 17.3 y el esquema de aceptación diferida de los resultados de negocio. También contrastamos las entregas, actas y holguras de los diez hitos con el formulario T-15.

