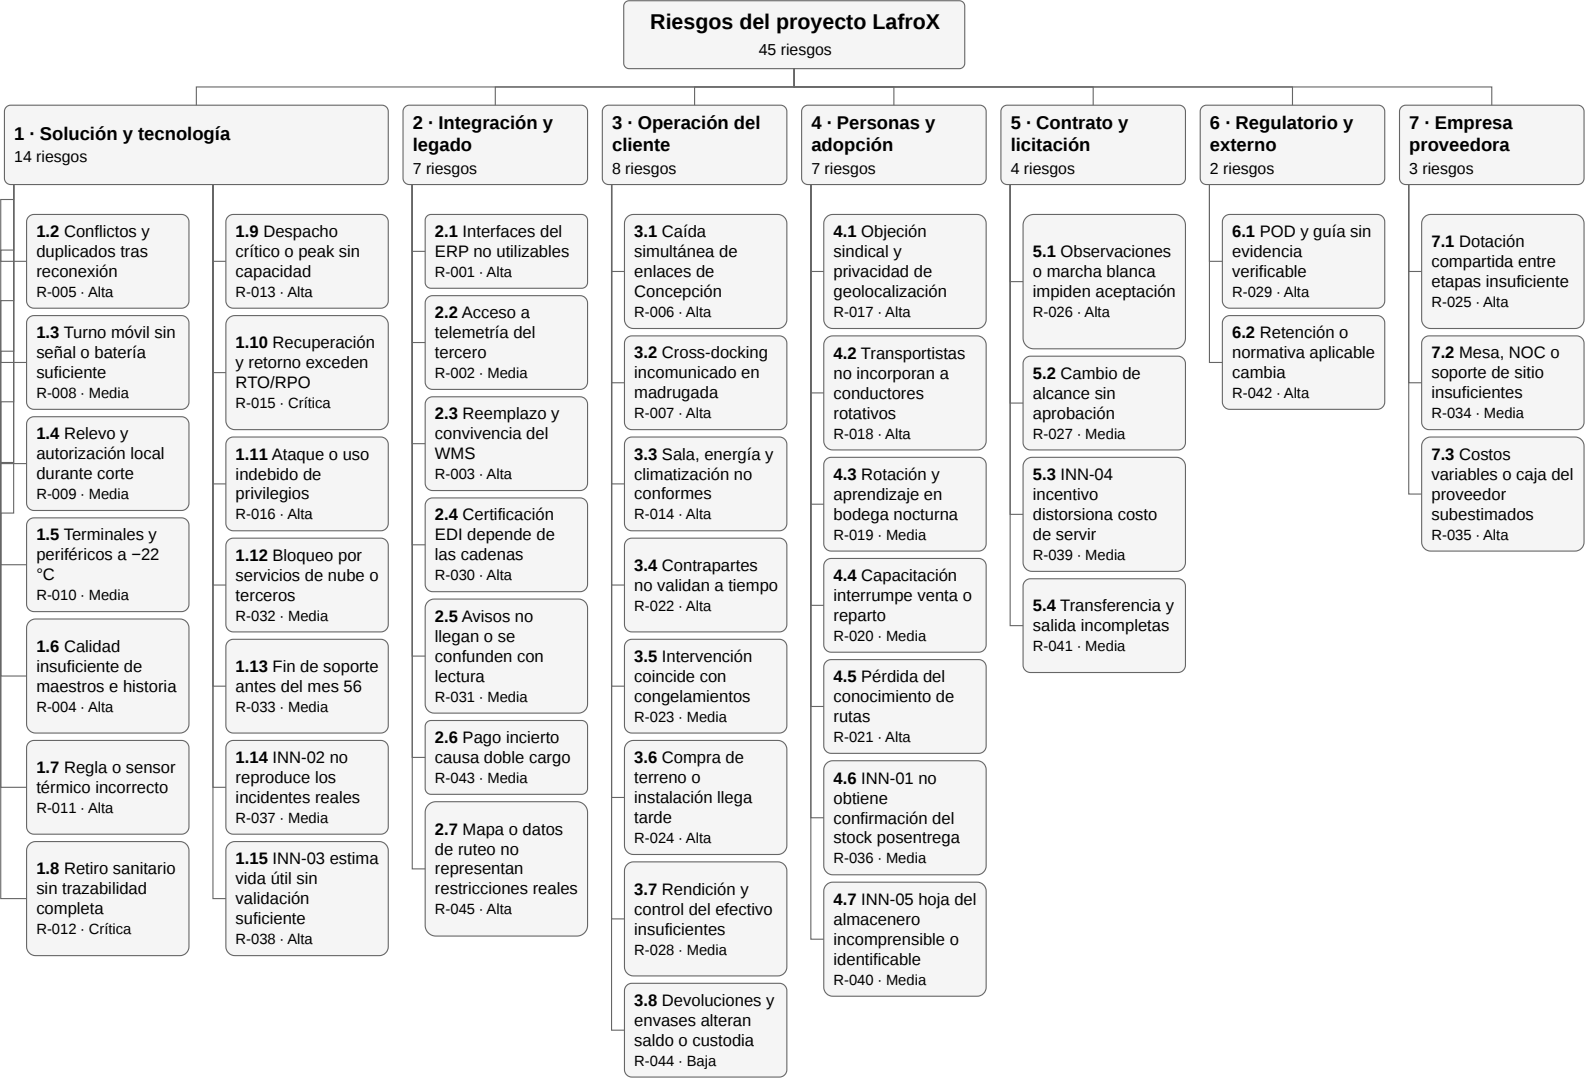

Riesgos del proyecto LafroX
45 riesgos
1 · Solución y tecnología
14 riesgos
1.2 Conflictos y duplicados tras reconexión
R-005 · Alta
1.3 Turno móvil sin señal o batería suficiente
R-008 · Media
1.4 Relevo y autorización local durante corte
R-009 · Media
1.5 Terminales y periféricos a −22 °C
R-010 · Media
1.6 Calidad insuficiente de maestros e historia
R-004 · Alta
1.7 Regla o sensor térmico incorrecto
R-011 · Alta
1.8 Retiro sanitario sin trazabilidad completa
R-012 · Crítica
1.9 Despacho crítico o peak sin capacidad
R-013 · Alta
1.10 Recuperación y retorno exceden RTO/RPO
R-015 · Crítica
1.11 Ataque o uso indebido de privilegios
R-016 · Alta
1.12 Bloqueo por servicios de nube o terceros
R-032 · Media
1.13 Fin de soporte antes del mes 56
R-033 · Media
1.14 INN-02 no reproduce los incidentes reales
R-037 · Media
1.15 INN-03 estima vida útil sin validación suficiente
R-038 · Alta
2 · Integración y legado
7 riesgos
2.1 Interfaces del ERP no utilizables
R-001 · Alta
2.2 Acceso a telemetría del tercero
R-002 · Media
2.3 Reemplazo y convivencia del WMS
R-003 · Alta
2.4 Certificación EDI depende de las cadenas
R-030 · Alta
2.5 Avisos no llegan o se confunden con lectura
R-031 · Media
2.6 Pago incierto causa doble cargo
R-043 · Media
2.7 Mapa o datos de ruteo no representan restricciones reales
R-045 · Alta
3 · Operación del cliente
8 riesgos
3.1 Caída simultánea de enlaces de Concepción
R-006 · Alta
3.2 Cross-docking incomunicado en madrugada
R-007 · Alta
3.3 Sala, energía y climatización no conformes
R-014 · Alta
3.4 Contrapartes no validan a tiempo
R-022 · Alta
3.5 Intervención coincide con congelamientos
R-023 · Media
3.6 Compra de terreno o instalación llega tarde
R-024 · Alta
3.7 Rendición y control del efectivo insuficientes
R-028 · Media
3.8 Devoluciones y envases alteran saldo o custodia
R-044 · Baja
4 · Personas y adopción
7 riesgos
4.1 Objeción sindical y privacidad de geolocalización
R-017 · Alta
4.2 Transportistas no incorporan a conductores rotativos
R-018 · Alta
4.3 Rotación y aprendizaje en bodega nocturna
R-019 · Media
4.4 Capacitación interrumpe venta o reparto
R-020 · Media
4.5 Pérdida del conocimiento de rutas
R-021 · Alta
4.6 INN-01 no obtiene confirmación del stock posentrega
R-036 · Media
4.7 INN-05 hoja del almacenero incomprensible o identificable
R-040 · Media
5 · Contrato y licitación
4 riesgos
5.1 Observaciones o marcha blanca impiden aceptación
R-026 · Alta
5.2 Cambio de alcance sin aprobación
R-027 · Media
5.3 INN-04 incentivo distorsiona costo de servir
R-039 · Media
5.4 Transferencia y salida incompletas
R-041 · Media
6 · Regulatorio y externo
2 riesgos
6.1 POD y guía sin evidencia verificable
R-029 · Alta
6.2 Retención o normativa aplicable cambia
R-042 · Alta
7 · Empresa proveedora
3 riesgos
7.1 Dotación compartida entre etapas insuficiente
R-025 · Alta
7.2 Mesa, NOC o soporte de sitio insuficientes
R-034 · Media
7.3 Costos variables o caja del proveedor subestimados
R-035 · Alta
