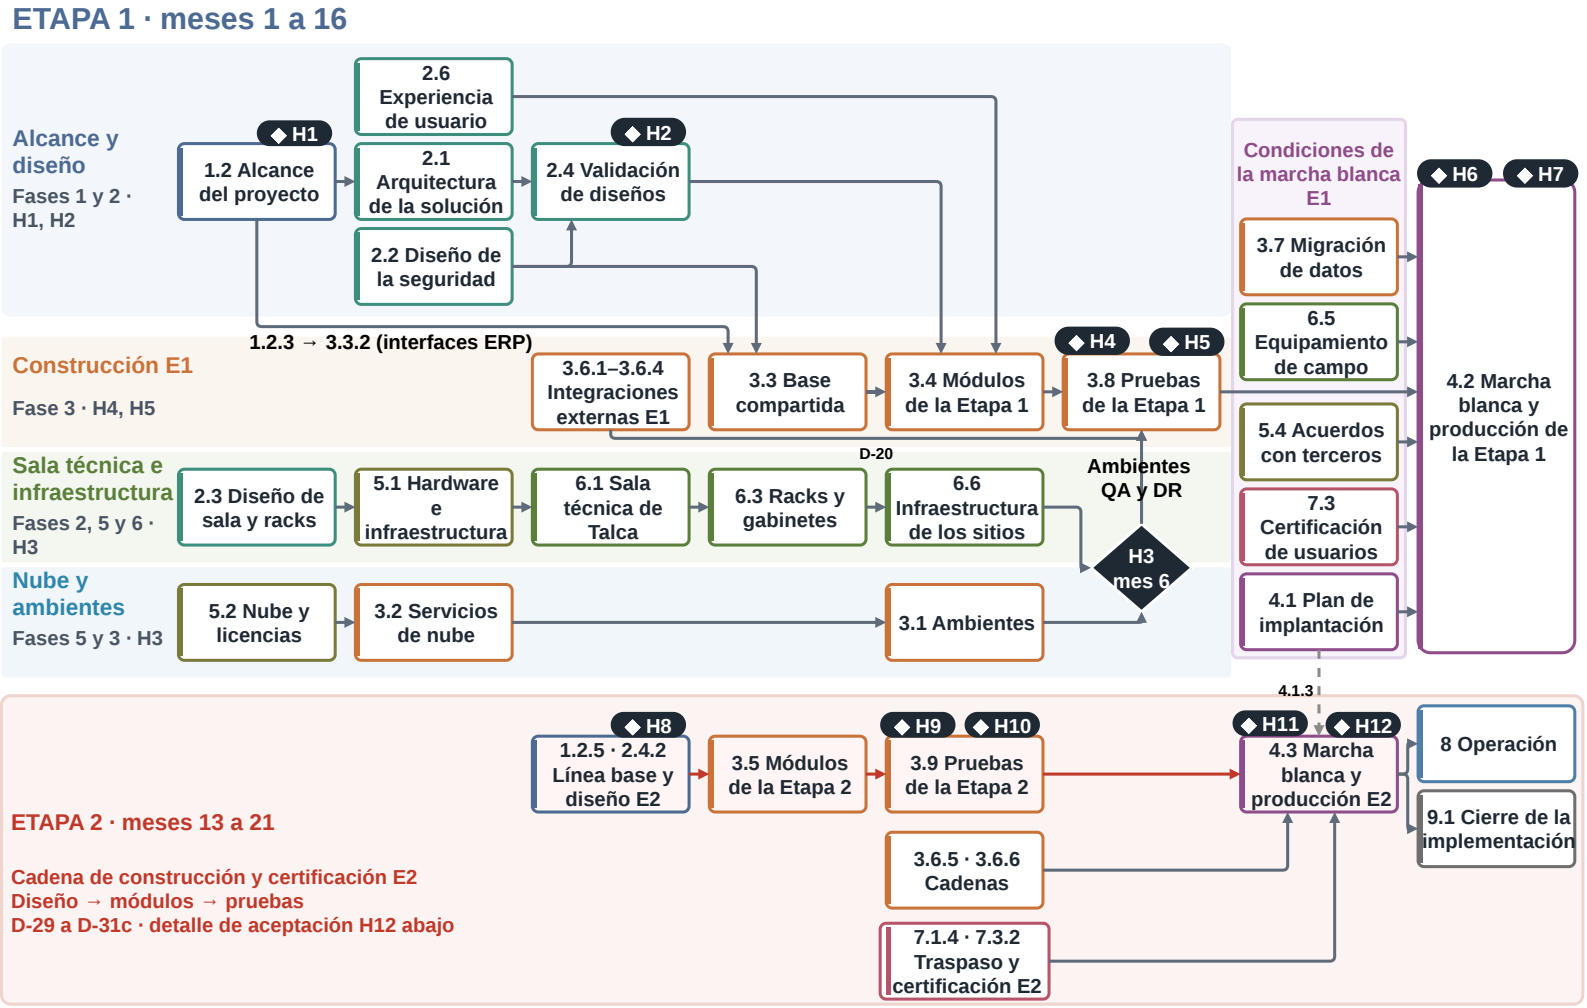
ETAPA 1 · meses 1 a 16
Alcance y diseño
Fases 1 y 2 · H1, H2
H1
1.2 Alcance del proyecto
2.6 Experiencia de usuario
2.1 Arquitectura de la solución
2.2 Diseño de la seguridad
H2
2.4 Validación de diseños
1.2.3 → 3.3.2 (interfaces ERP)
Construcción E1
Fase 3 · H4, H5
3.6.1–3.6.4 Integraciones externas E1
3.3 Base compartida
3.4 Módulos de la Etapa 1
H4
H5
3.8 Pruebas de la Etapa 1
D-20
Ambientes QA y DR
H3 mes 6
Sala técnica e infraestructura
Fases 2, 5 y 6 · H3
2.3 Diseño de sala y racks
5.1 Hardware e infraestructura
6.1 Sala técnica de Talca
6.3 Racks y gabinetes
6.6 Infraestructura de los sitios
Nube y ambientes
Fases 5 y 3 · H3
5.2 Nube y licencias
3.2 Servicios de nube
3.1 Ambientes
Condiciones de la marcha blanca E1
3.7 Migración de datos
6.5 Equipamiento de campo
5.4 Acuerdos con terceros
7.3 Certificación de usuarios
4.1 Plan de implantación
H6
H7
4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1
4.1.3
ETAPA 2 · meses 13 a 21
Cadena de construcción y certificación E2
Diseño → módulos → pruebas
D-29 a D-31c · detalle de aceptación H12 abajo
H8
1.2.5 · 2.4.2 Línea base y diseño E2
3.5 Módulos de la Etapa 2
H9
H10
3.9 Pruebas de la Etapa 2
3.6.5 · 3.6.6 Cadenas
7.1.4 · 7.3.2 Traspaso y certificación E2
H11
H12
4.3 Marcha blanca y producción E2
8 Operación
9.1 Cierre de la implementación
