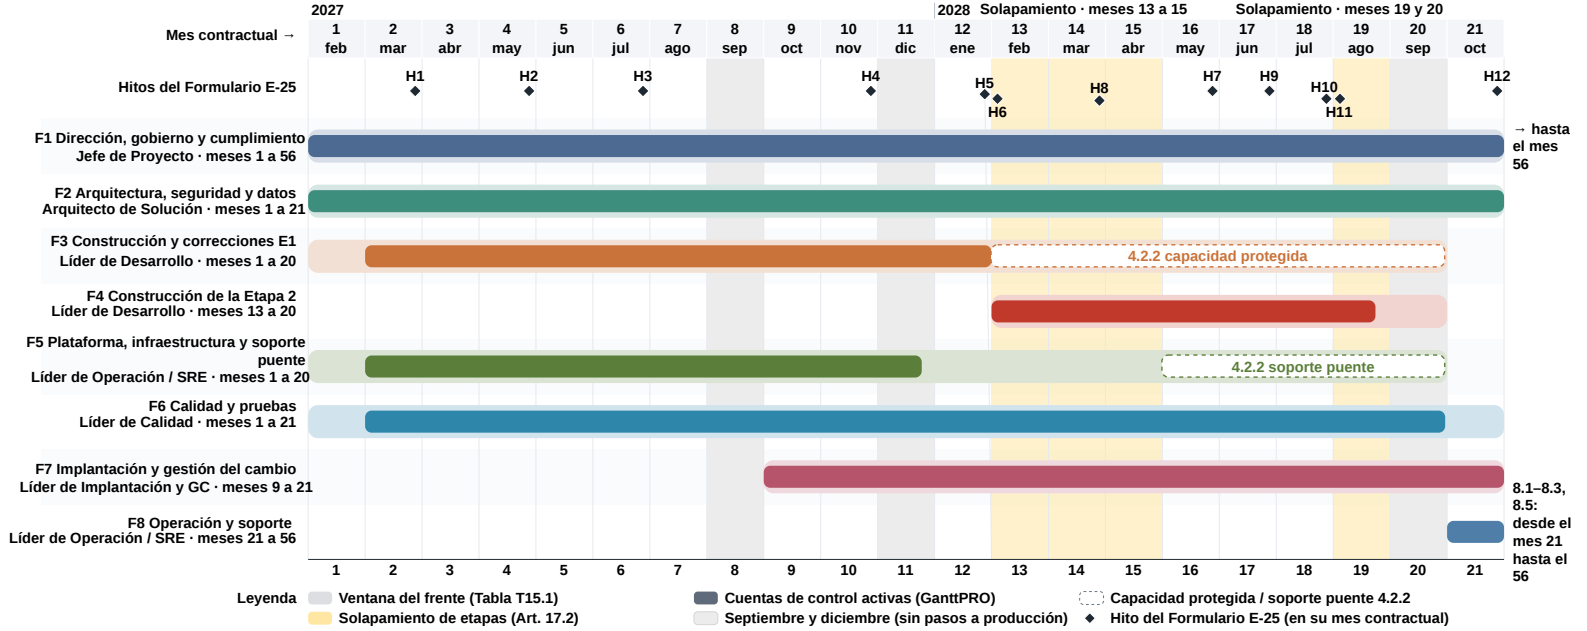
2027
2028 Solapamiento · meses 13 a 15
Solapamiento · meses 19 y 20
Mes contractual →
1 feb
2 mar
3 abr
4 may
5 jun
6 jul
7 ago
8 sep
9 oct
10 nov
11 dic
12 ene
13 feb
14 mar
15 abr
16 may
17 jun
18 jul
19 ago
20 sep
21 oct
Hitos del Formulario E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento
Jefe de Proyecto · meses 1 a 56
→ hasta el mes 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos
Arquitecto de Solución · meses 1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1
Líder de Desarrollo · meses 1 a 20
4.2.2 capacidad protegida
F4 Construcción de la Etapa 2
Líder de Desarrollo · meses 13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente
Líder de Operación / SRE · meses 1 a 20
4.2.2 soporte puente
F6 Calidad y pruebas
Líder de Calidad · meses 1 a 21
F7 Implantación y gestión del cambio
Líder de Implantación y GC · meses 9 a 21
F8 Operación y soporte
Líder de Operación / SRE · meses 21 a 56
8.1–8.3, 8.5: desde el mes 21 hasta el 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leyenda
Ventana del frente (Tabla T15.1)
Solapamiento de etapas (Art. 17.2)
Cuentas de control activas (GanttPRO)
Septiembre y diciembre (sin pasos a producción)
Capacidad protegida / soporte puente 4.2.2
Hito del Formulario E-25 (en su mes contractual)
