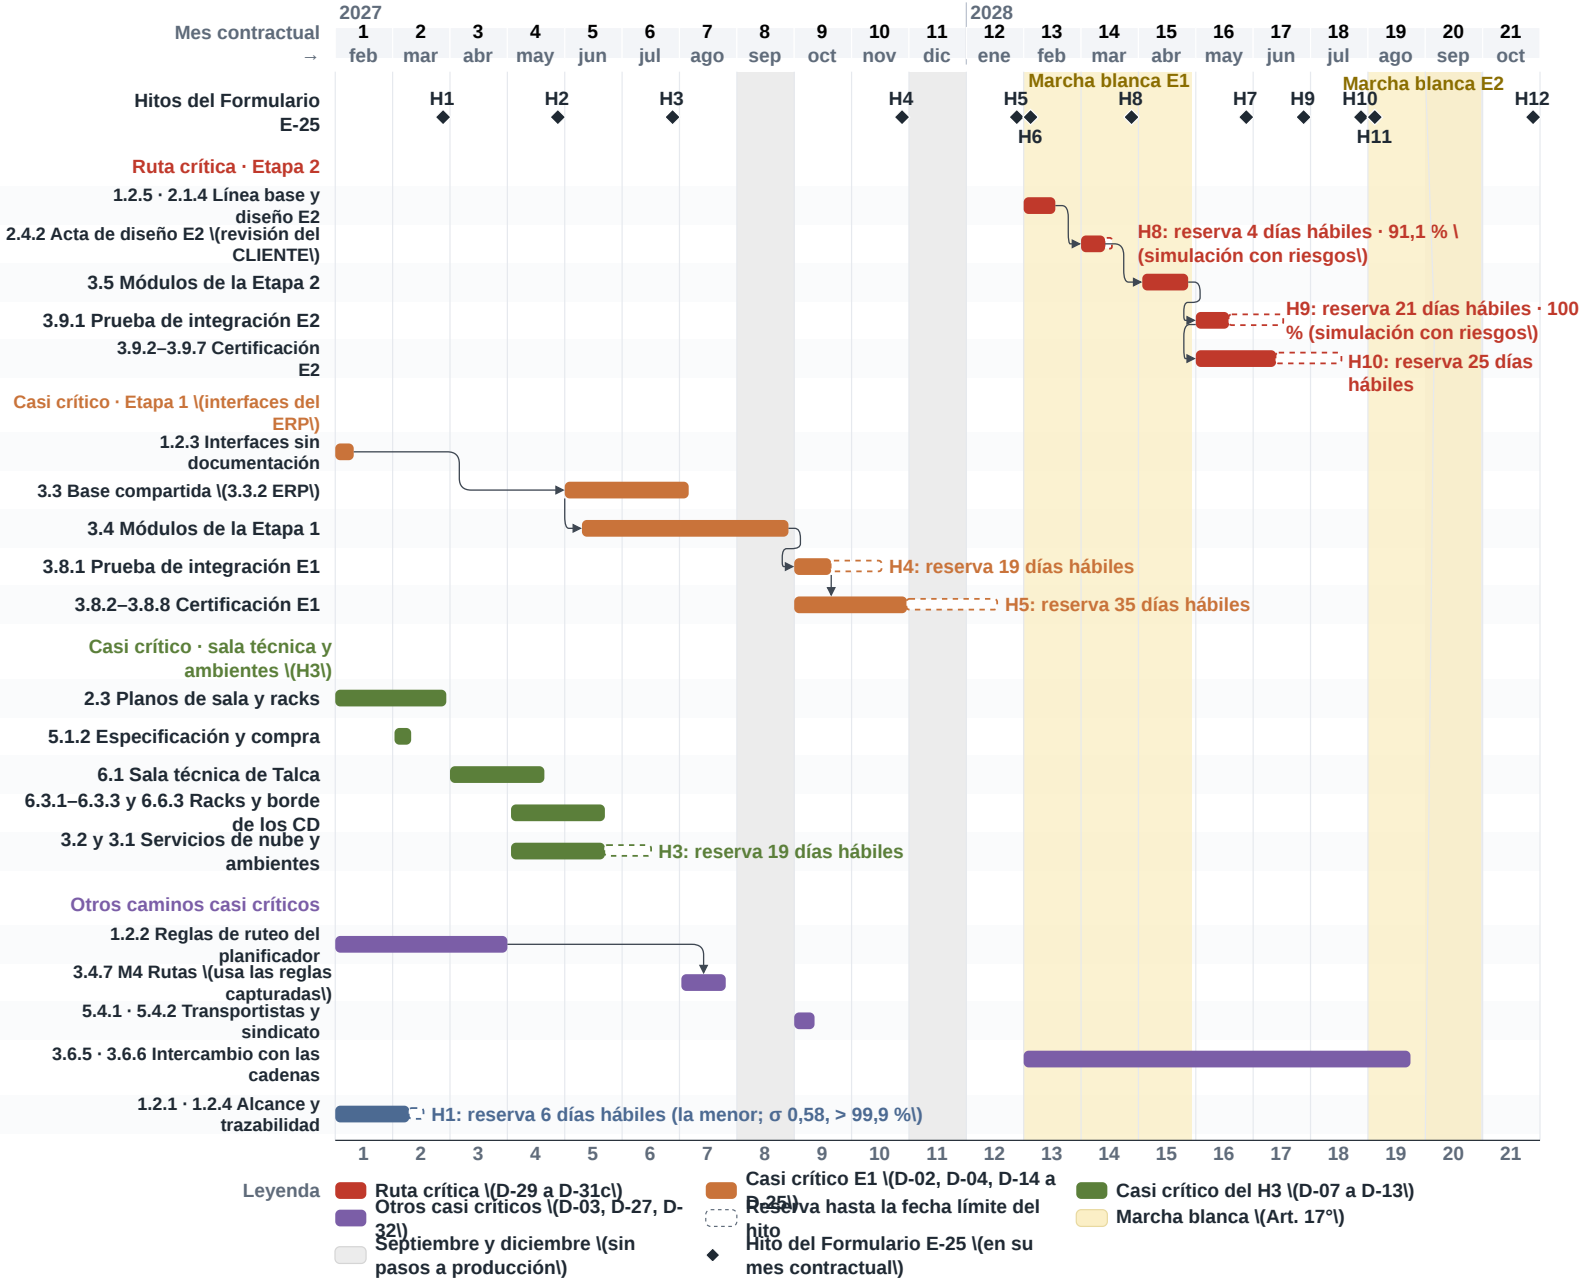

2027
2028
Mes contractual →
1 feb
2 mar
3 abr
4 may
5 jun
6 jul
7 ago
8 sep
9 oct
10 nov
11 dic
12 ene
13 feb
14 mar
15 abr
16 may
17 jun
18 jul
19 ago
20 sep
21 oct
Marcha blanca E1
Marcha blanca E2
Hitos del Formulario E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Ruta crítica · Etapa 2
1.2.5 · 2.1.4 Línea base y diseño E2
2.4.2 Acta de diseño E2 \(revisión del CLIENTE\)
H8: reserva 4 días hábiles · 91,1 % \(simulación con riesgos\)
3.5 Módulos de la Etapa 2
3.9.1 Prueba de integración E2
H9: reserva 21 días hábiles · 100 % (simulación con riesgos\)
3.9.2–3.9.7 Certificación E2
H10: reserva 25 días hábiles
Casi crítico · Etapa 1 \(interfaces del ERP\)
1.2.3 Interfaces sin documentación
3.3 Base compartida \(3.3.2 ERP\)
3.4 Módulos de la Etapa 1
3.8.1 Prueba de integración E1
H4: reserva 19 días hábiles
3.8.2–3.8.8 Certificación E1
H5: reserva 35 días hábiles
Casi crítico · sala técnica y ambientes \(H3\)
2.3 Planos de sala y racks
5.1.2 Especificación y compra
6.1 Sala técnica de Talca
6.3.1–6.3.3 y 6.6.3 Racks y borde de los CD
3.2 y 3.1 Servicios de nube y ambientes
H3: reserva 19 días hábiles
Otros caminos casi críticos
1.2.2 Reglas de ruteo del planificador
3.4.7 M4 Rutas \(usa las reglas capturadas\)
5.4.1 · 5.4.2 Transportistas y sindicato
3.6.5 · 3.6.6 Intercambio con las cadenas
1.2.1 · 1.2.4 Alcance y trazabilidad
H1: reserva 6 días hábiles (la menor; σ 0,58, > 99,9 %\)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leyenda
Ruta crítica \(D-29 a D-31c\)
Otros casi críticos \(D-03, D-27, D-32\)
Septiembre y diciembre \(sin pasos a producción\)
Casi crítico E1 \(D-02, D-04, D-14 a D-25\)
Reserva hasta la fecha límite del hito
Hito del Formulario E-25 \(en su mes contractual\)
Casi crítico del H3 \(D-07 a D-13\)
Marcha blanca \(Art. 17°\)
