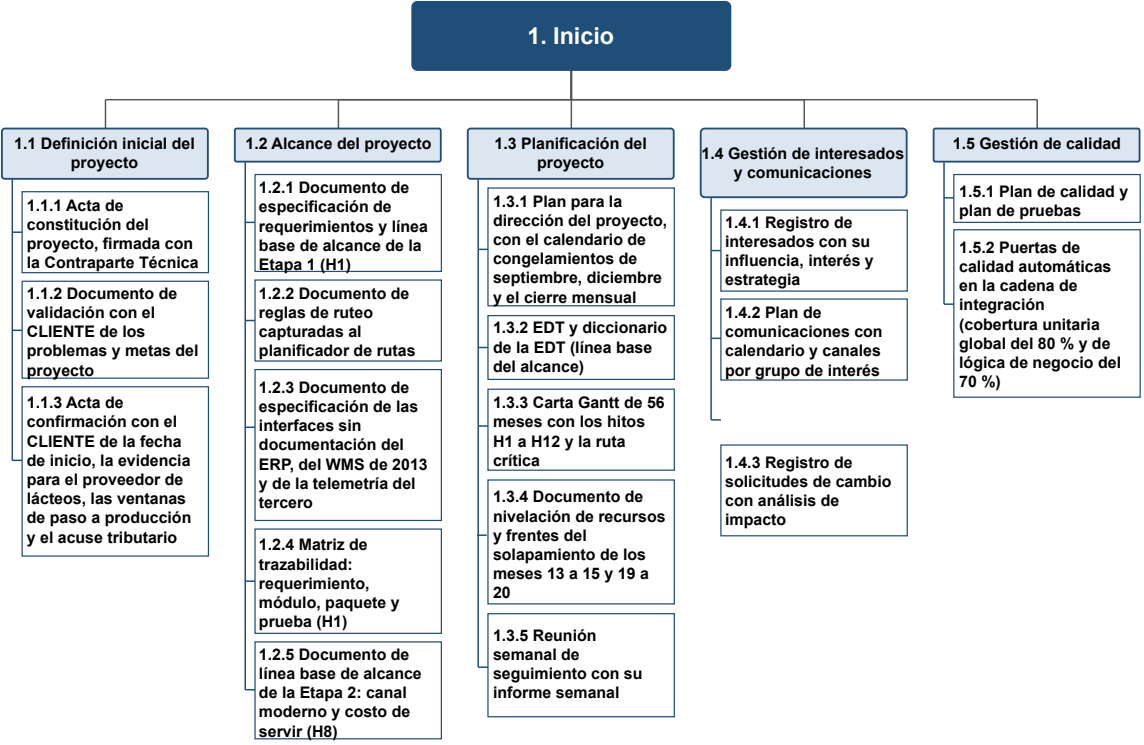
1. Inicio
1.1 Definición inicial del proyecto
1.1.1 Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica
1.1.2 Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto
1.1.3 Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario
1.2 Alcance del proyecto
1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)
1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas
1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero
1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)
1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)
1.3 Planificación del proyecto
1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual
1.3.2 EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)
1.3.3 Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica
1.3.4 Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20
1.3.5 Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal
1.4 Gestión de interesados y comunicaciones
1.4.1 Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia
1.4.2 Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés
1.4.3 Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto
1.5 Gestión de calidad
1.5.1 Plan de calidad y plan de pruebas
1.5.2 Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura unitaria global del 80 % y de lógica de negocio del 70 %)
