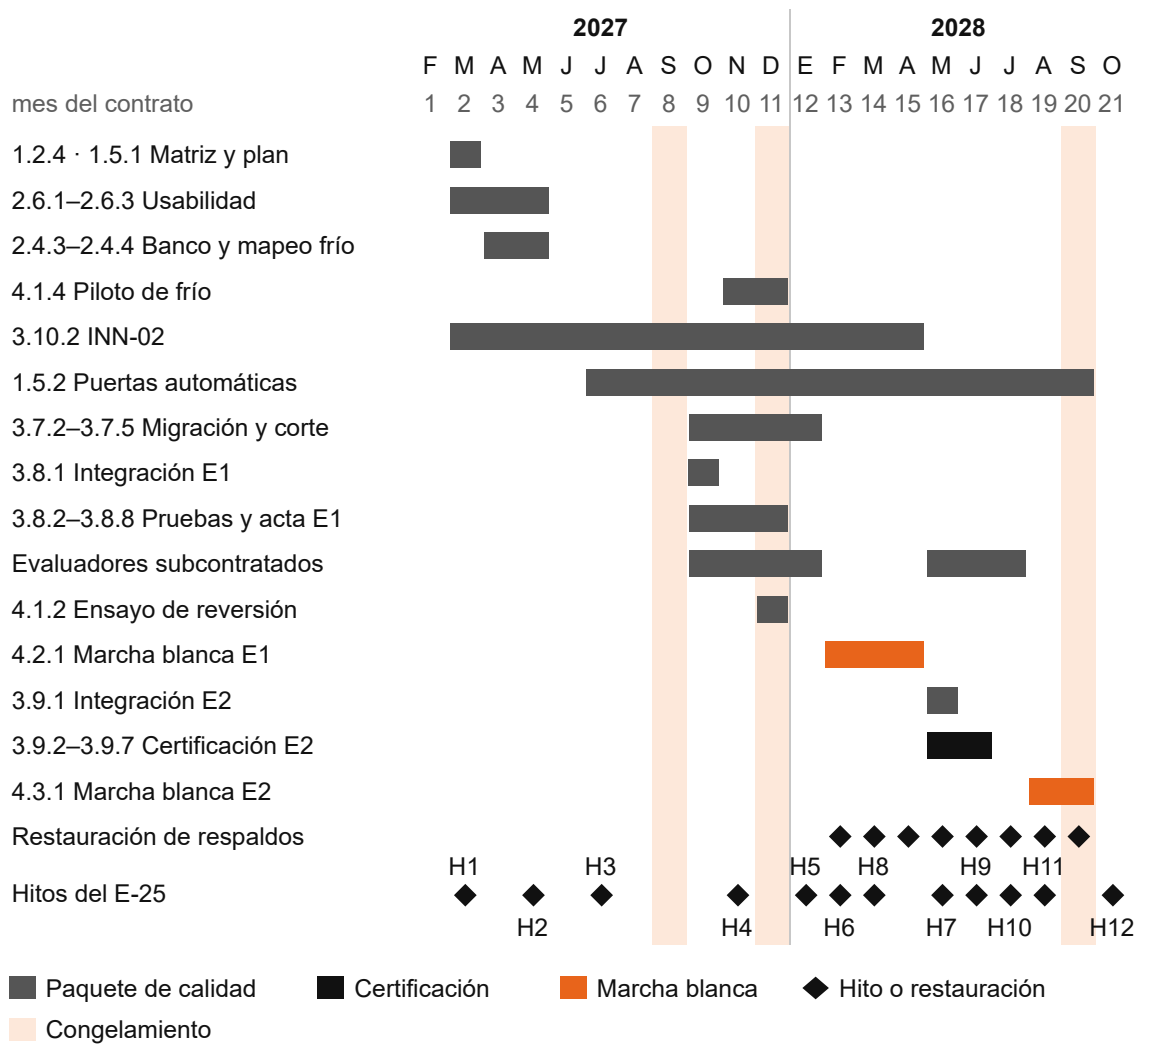
2027
2028
F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
mes del contrato
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2.4 · 1.5.1 Matriz y plan
2.6.1–2.6.3 Usabilidad
2.4.3–2.4.4 Banco y mapeo frío
4.1.4 Piloto de frío
3.10.2 INN-02
1.5.2 Puertas automáticas
3.7.2–3.7.5 Migración y corte
3.8.1 Integración E1
3.8.2–3.8.8 Pruebas y acta E1
Evaluadores subcontratados
4.1.2 Ensayo de reversión
4.2.1 Marcha blanca E1
3.9.1 Integración E2
3.9.2–3.9.7 Certificación E2
4.3.1 Marcha blanca E2
Restauración de respaldos
Hitos del E-25
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Paquete de calidad
Certificación
Marcha blanca
Hito o restauración
Congelamiento
