LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 7

Plan de Trabajo, EDT, Cronograma e Implantación

Subdocumento 7 · Formulario T-14

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

7 Introducción al Plan de trabajo 6

7.1 EDT 6

7.1.1 Criterio de descomposición 6

7.1.2 Estructura general 9

7.1.2.1 Fase 1. Inicio 9

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración 11

7.1.2.3 Fase 3. Construcción 13

7.1.2.4 Fase 4. Transición 18

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones 19

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios 20

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio 22

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte 23

7.1.2.9 Fase 9. Cierre 25

7.1.3 Cobertura del alcance 26

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables 29

7.2 Plan de trabajo 30

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias 30

7.2.2 Estimación 34

7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización 36

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20 38

7.3 Cronograma e implantación 38

7.3.1 Ruta crítica y holguras 38

7.3.2 Carta Gantt y calendario 41

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha 45

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1 49

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia 52


7.3.6 Estabilización y transferencia 53

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos 54

7.3.8 Base de planificación y recursos 56

Referencias 58

Declaración de uso de IA 58



Lista de tablas

Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes por fase. 8
Tabla 7.2 Cobertura del alcance en la EDT. 27
Tabla 7.3 Paquetes por responsable. 29
Tabla 7.4 Horas hombre programadas por etapa — 35
Tabla 7.5 Hitos del Formulario E-25 en el cronograma. 41
Tabla 7.6 Meses contractuales según la fecha de inicio. 43
Tabla 7.7 Olas de implantación de la Etapa 1. 45
Tabla 7.8 Niveles de reversión. 47
Tabla 7.9 Indicadores diarios de la marcha blanca. 50
Tabla 7.10 Estabilización por ola. 53
Tabla 7.11 Momento de los resultados de aceptación del caso. 54
Tabla 7.12 Innovaciones en el cronograma. 55
Tabla 7.13 Declaración de uso de IA. 59



Lista de figuras

Figura 7.1 Vista del primer nivel de la EDT: raíz del proyecto y sus nueve fases. 9

Figura 7.2 Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. 10

Figura 7.3 Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual. 11

Figura 7.4 Fase 2 — Elaboración, primera parte: arquitectura, seguridad y sala técnica, cuentas 2.1 a 2.3. 12

Figura 7.5 Fase 2 — Elaboración, segunda parte: validación, continuidad y experiencia de usuario, cuentas 2.4 a 2.6. 13

Figura 7.6 Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3. 14

Figura 7.7 Fase 3 — Construcción, segunda parte: módulos de la Etapa 1, cuenta 3.4. 15

Figura 7.8 Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8. 16

Figura 7.9 Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11. 17

Figura 7.10 Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10. 18

Figura 7.11 Fase 4 — Transición: plan de implantación y marchas blancas de las etapas 1 y 2, cuentas 4.1 a 4.3. 19

Figura 7.12 Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4. 20

Figura 7.13 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3. 21


Figura 7.14 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, segunda parte: seguridad física, equipamiento de campo y configuración, cuentas 6.4 a 6.6. 22

Figura 7.15 Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3. 23

Figura 7.16 Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2. 24

Figura 7.17 Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5. 25

Figura 7.18 Fase 9 — Cierre: cierre de implementación y salida al término del contrato, cuentas 9.1 y 9.2. 26



Media firma: Alex Aravena

Figura 7.19 Ubicación en la EDT de las innovaciones y la seguridad, la calidad, la migración y la implantación. 28
Figura 7.20 Red de precedencias entre cuentas de control e hitos. 33
Figura 7.21 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. 37
Figura 7.22 Dependencias y caminos de menor holgura del escenario nominal histórico; sujetos a recálculo. 40
Figura 7.23 Carta Gantt resumida de los 56 meses, con inicio en febrero de 2027. 44
Figura 7.24 Secuencia de olas de la Etapa 1 durante la marcha blanca. 47
Figura 7.25 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 en la ventana de despacho. 49
Figura 7.26 Ciclo diario de la marcha blanca. 51
Figura 7.27 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. 53



Introducción al Plan de trabajo

Este capítulo presenta cómo LafroX ejecutará el proyecto de Distribuidora Puelche dentro del cronograma contractual obligatorio de 56 meses (BA, art. 17, pp. 12–13): qué trabajo se hace, en qué orden, con qué esfuerzo y cómo la solución entra en operación sin detener la venta, la bodega ni el reparto.

La sección 7.1 descompone el 100 % del alcance en una estructura de descomposición del trabajo (EDT) con paquetes estimables y asignables. La sección 7.2 secuencia ese trabajo y lo organiza en frentes paralelos, con especial atención a los meses 13 a 15 y 19 a 20, en que dos esfuerzos coexisten. La sección 7.3 presenta la ruta crítica, la carta Gantt con los hitos del Formulario E-25 y el plan de implantación y de marcha blanca de cada etapa.

El capítulo se apoya en otros tres capítulos de la oferta: el Capítulo 3 fija el alcance de cada etapa y los criterios de olas y estabilización; la sección 6 del Formulario T-18 concreta una propuesta de calendario, dotación y decisiones; el Capítulo 4 define los módulos M1 a M12 y las interfaces que la EDT construye; y el Capítulo 6 (LafroX, 2026o) establece el proceso de desarrollo cuyas fases organizan la EDT y la gestión del proyecto que la controla. El detalle va en tres formularios y un archivo de anexos: el Formulario T-14 contiene la EDT completa, su diccionario y la carta Gantt; el Formulario T-15, el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo; el Formulario T-18, la implantación y la puesta en marcha controlada; y los Anexos 7.A a 7.F, los listados de apoyo y la preparación de riesgos.

En este capítulo, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso Logística (2026c).

7.1 EDT

La EDT es la base común del plan: el cronograma, la estimación y la asignación de responsables se construyen sobre sus paquetes, y su diccionario fija qué se entrega y cómo se acepta cada uno. Esta sección explica cómo se descompuso el trabajo, cómo queda la estructura, cómo cubre el alcance y cómo se asignan los responsables.

7.1.1 Criterio de descomposición

La EDT de Puelche se organiza en nueve fases. Las cuatro primeras son las fases del proceso de desarrollo del Capítulo 6 (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y se recorren una vez por cada etapa del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El primer recorrido produce la Etapa 1, con la trazabilidad de recepción, la bodega, la cadena de frío, la preventa, las rutas, el reparto y la rendición, y termina con el paso a producción del mes 16. El segundo

produce la Etapa 2, con el canal moderno, los portales y el costo de servir, y termina con el paso a producción del mes 21.

Las otras cinco fases agrupan el trabajo que no es desarrollo de software, pero sin el cual la solución no entra en operación: adquisiciones y contrataciones; infraestructura física y sitios; capacitación y gestión del cambio; operación y soporte durante 36 meses; y cierre.

La descomposición sigue la regla del 100 %: la suma del trabajo de los niveles inferiores reproduce el trabajo del nivel superior, sin omitir ni agregar alcance (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 161). El segundo nivel son 49 cuentas de control, puntos de gestión donde se integran el alcance, el cronograma y el esfuerzo para medir el desempeño. El nivel inferior son 222 paquetes de trabajo, cada uno con un entregable verificable, un criterio de aceptación y un único responsable (PMI, 2017, pp. 161–162). En la cuenta de las innovaciones, cada innovación agrupa sus paquetes en un cuarto nivel.

El último nivel de la EDT es el paquete de trabajo, con su entregable, su responsable y su criterio de aceptación. Fuera de la EDT, cada paquete se descompone en actividades que cumplen la regla del 8/80, entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo, y la regla del período de reporte: ninguna actividad dura más de una quincena, el período con que informa el Comité de Proyecto (PMI, 2017, pp. 183–185). Los paquetes de producto se dividen con una plantilla por clase; por ejemplo, un módulo de 960 HH se divide en 12 actividades de 80 HH, desde el análisis de sus requerimientos hasta su entrega en QA. Los 163 paquetes con entregable se programan con fecha, personas y predecesoras; sus actividades se detallan hasta el H2 y, después, por planificación gradual antes de cada fase, cuando el equipo conoce el trabajo (PMI, 2017, p. 185). Así el cronograma no fija hoy el día de una actividad que ocurrirá en 2028, y cada fase se planifica como las iteraciones del proceso RUP del Capítulo 6. El Formulario T-15, Figura T15.3, muestra los puntos de replanificación (antes del H2, el H4, el H8 y el H9). Los 59 paquetes de esfuerzo continuo, como la cobertura del NOC, las reuniones periódicas o la mentoría posterior al H12, no se descomponen en actividades distintas: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La lista de actividades y las reglas de programación están en el Formulario T-15, sección 6.

Los paquetes de la fase de Operación son paquetes de esfuerzo continuo. Cada uno cubre un servicio durante los 36 meses y se controla con entregables periódicos, como los informes mensuales de servicio, los informes de pruebas y las actualizaciones anuales, que funcionan como sus puntos de verificación.

La Tabla 7.1 muestra el tamaño de cada fase y los hitos que produce.



Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes por fase. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y el Formulario E-25.

Fase	CC	PT	Etapa	Hitos
1 Inicio	9	35	E1 y E2	H1, H8
2 Elaboración	6	18	E1 y E2	H2, H8
3 Construcción	11	79	E1 y E2	H3, H4, H5, H9, H10
4 Transición	3	10	E1 y E2	H6, H7, H11, H12
5 Adquisiciones y contrataciones	4	13	E1 y E2	Habilita H3
6 Infraestructura física y sitios	6	24	E1	Habilita H3 y H6
7 Capacitación y gestión del cambio	3	13	E1, E2 y Operación	Condición de H7 y H12
8 Operación y soporte (36 meses)	5	26	Operación	Hito mensual
9 Cierre	2	4	Meses 21 y 56	Después de H12
Total	**49**	**222**		

La construcción concentra el 36 % de los paquetes (79 de 222), porque contiene los quince desarrollos de módulos, las integraciones, la migración, las pruebas de ambas etapas y las innovaciones. Las fases 5 a 7, que no producen software, suman 50 paquetes (23 %). Ese peso muestra que, en Puelche, la compra y la instalación del equipamiento de cinco sitios, los acuerdos con diez transportistas y con el sindicato y la capacitación de una operación que no puede detenerse son trabajo planificado y controlado, no supuestos.

La Figura 7.1 resume el primer nivel de la EDT: la raíz del proyecto y sus nueve fases.





Figura 7.1 Vista del primer nivel de la EDT: raíz del proyecto y sus nueve fases. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Las fases de desarrollo (1 a 4) se recorren una vez por etapa; las fases 5 a 7 las habilitan en paralelo, y las fases 8 y 9 cubren la operación y el cierre. La figura muestra la estructura, no la secuencia temporal: el número de una fase no indica cuándo ocurre; sus fechas están en la carta Gantt de la sección 7.3.2.

7.1.2 Estructura general

Las láminas siguientes desglosan las cuentas de control y los paquetes por fase. Cada imagen se presenta inmediatamente después de su descripción. La fase 3 se divide en cinco láminas para facilitar la lectura: las dos primeras separan la base técnica de los módulos de la Etapa 1; las tres restantes muestran las cuentas 3.5 a 3.11, con una lámina adicional para ampliar los paquetes de innovación de la cuenta 3.10.

7.1.2.1 Fase 1. Inicio

La fase de Inicio define el proyecto, fija su alcance y planificación y establece cómo se gobierna y controla. Sus cuentas 1.1 a 1.5 abarcan el acta, la línea base, la planificación, los interesados y la calidad.

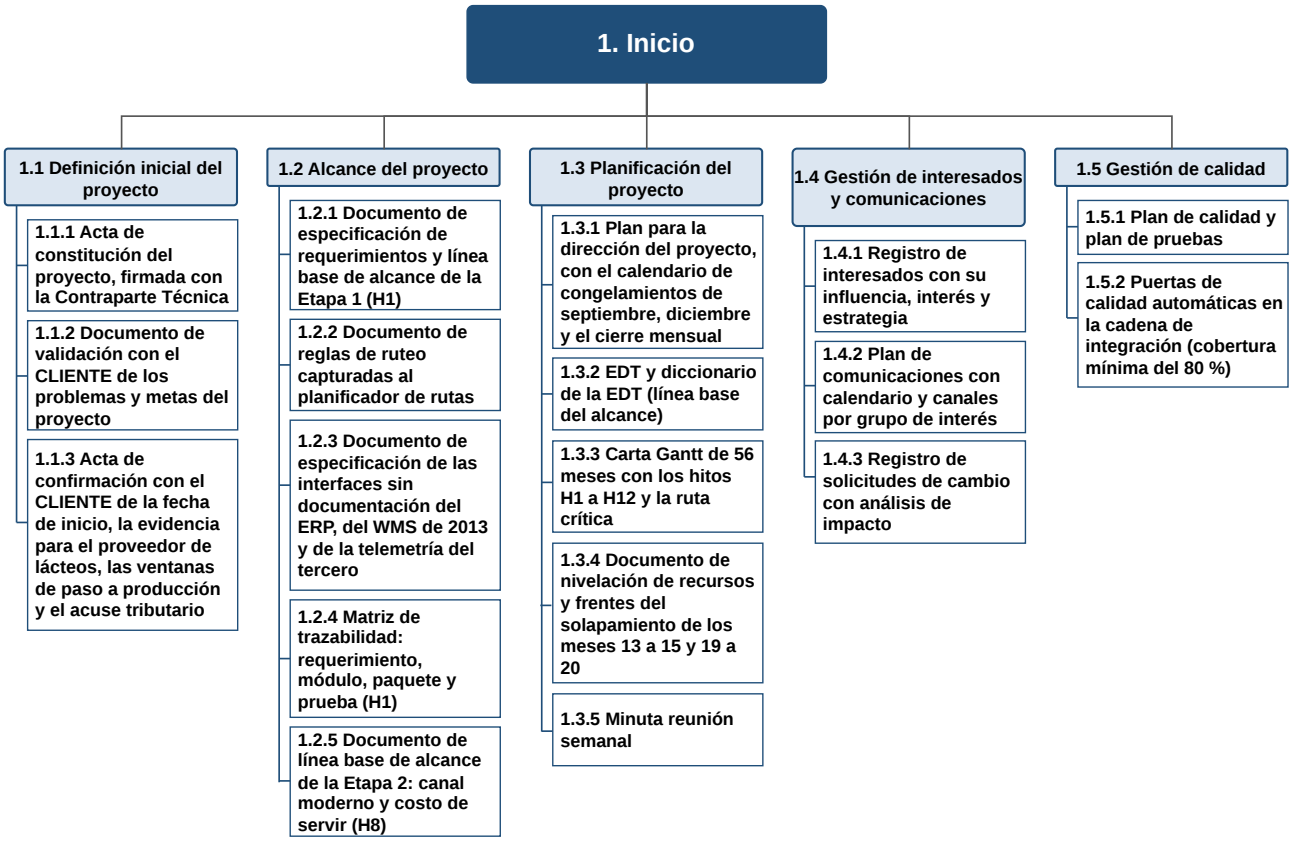


Figura 7.2 Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

La segunda lámina completa Inicio con gestión de riesgos, reversibilidad, gobierno, control y cumplimiento normativo. Incluye los paquetes 1.2.2 y 1.2.3, que capturan las reglas de ruteo cuya fuente experta se jubila y las interfaces del sistema de gestión que el CLIENTE reconoce no tener documentadas; también incluye los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), el informe de valor ganado y el tablero (RT-19.06 a RT-19.09).

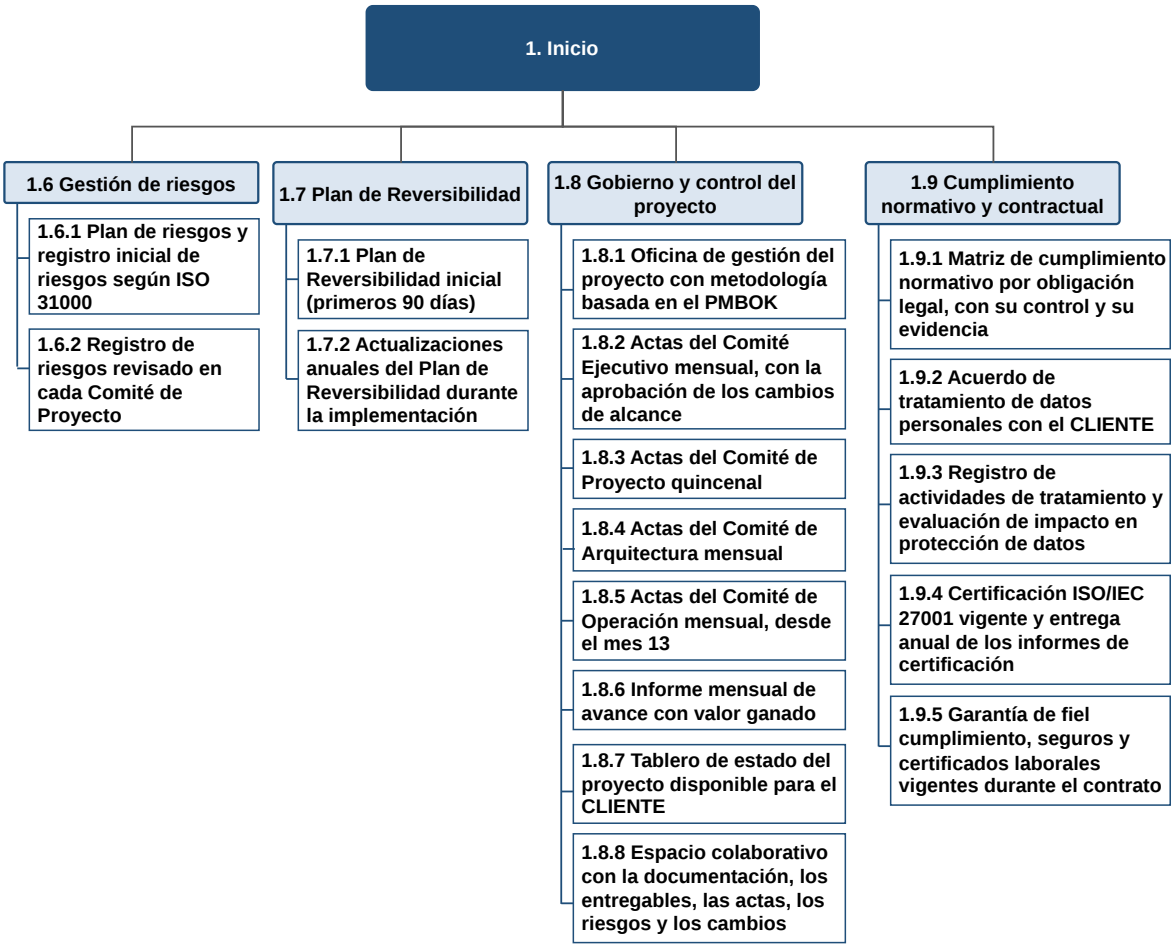


Figura 7.3 Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual.

Estas cuentas completan Inicio: identifican los riesgos y la reversibilidad, establecen el gobierno y control del proyecto y cierran con el cumplimiento normativo y contractual.

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración

Elaboración diseña la solución antes de programar: arquitectura lógica y física, datos trazables por lote, seguridad, sala técnica de Talca, continuidad y experiencia de usuario. La aprobación de arquitectura, seguridad y modelo de datos corresponde al H2 del mes 4. La primera lámina muestra las cuentas 2.1 a 2.3.

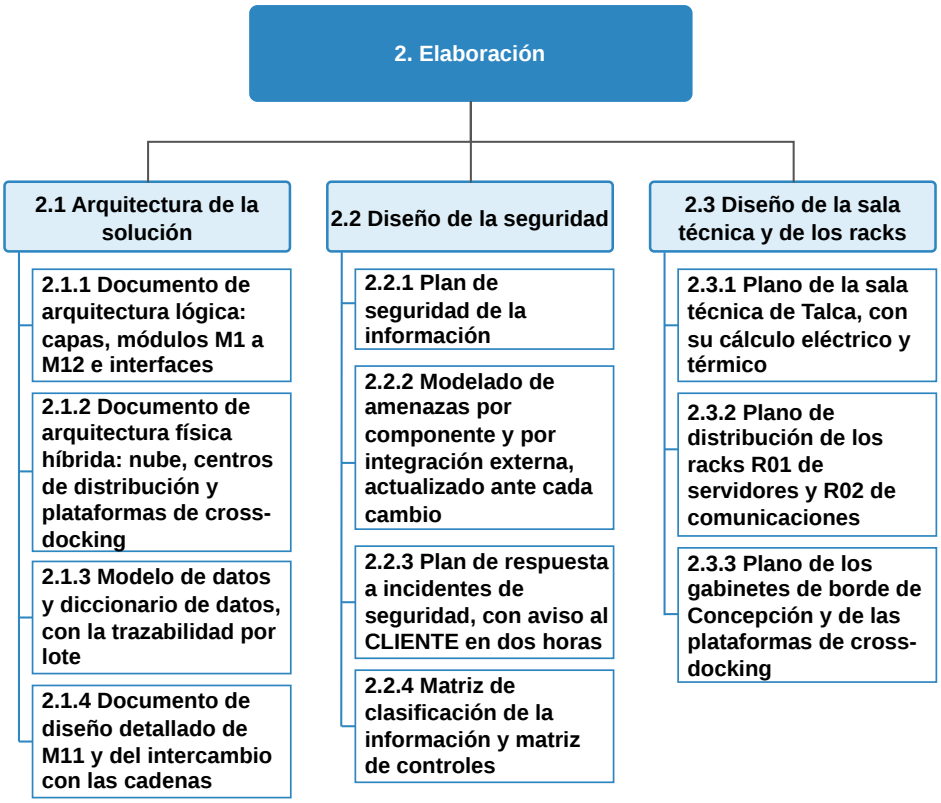


Figura 7.4 Fase 2 — Elaboración, primera parte: arquitectura, seguridad y sala técnica, cuentas 2.1 a 2.3.

La continuación cubre la validación de diseños, continuidad del negocio y experiencia de usuario (cuentas 2.4 a 2.6), incluidos los procedimientos manuales y la recuperación ante desastres.

Alex

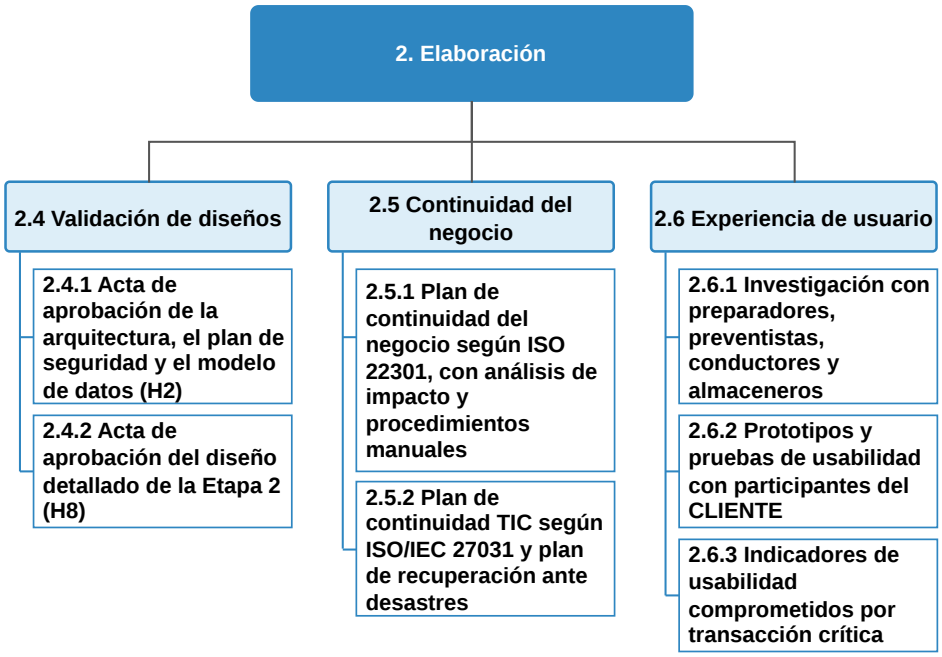


Figura 7.5 Fase 2 — Elaboración, segunda parte: validación, continuidad y experiencia de usuario, cuentas 2.4 a 2.6.

Con estas cuentas, los diseños quedan sometidos a validación y se completan los planes de continuidad y experiencia de usuario que orientan la fase de Construcción.

7.1.2.3 Fase 3. Construcción

Construcción produce los ambientes y servicios de nube, la base compartida, los módulos de ambas etapas, las integraciones, la migración, las pruebas, las innovaciones y la documentación. La primera lámina reúne los ambientes de desarrollo, los servicios de nube y la base compartida (cuentas 3.1 a 3.3).

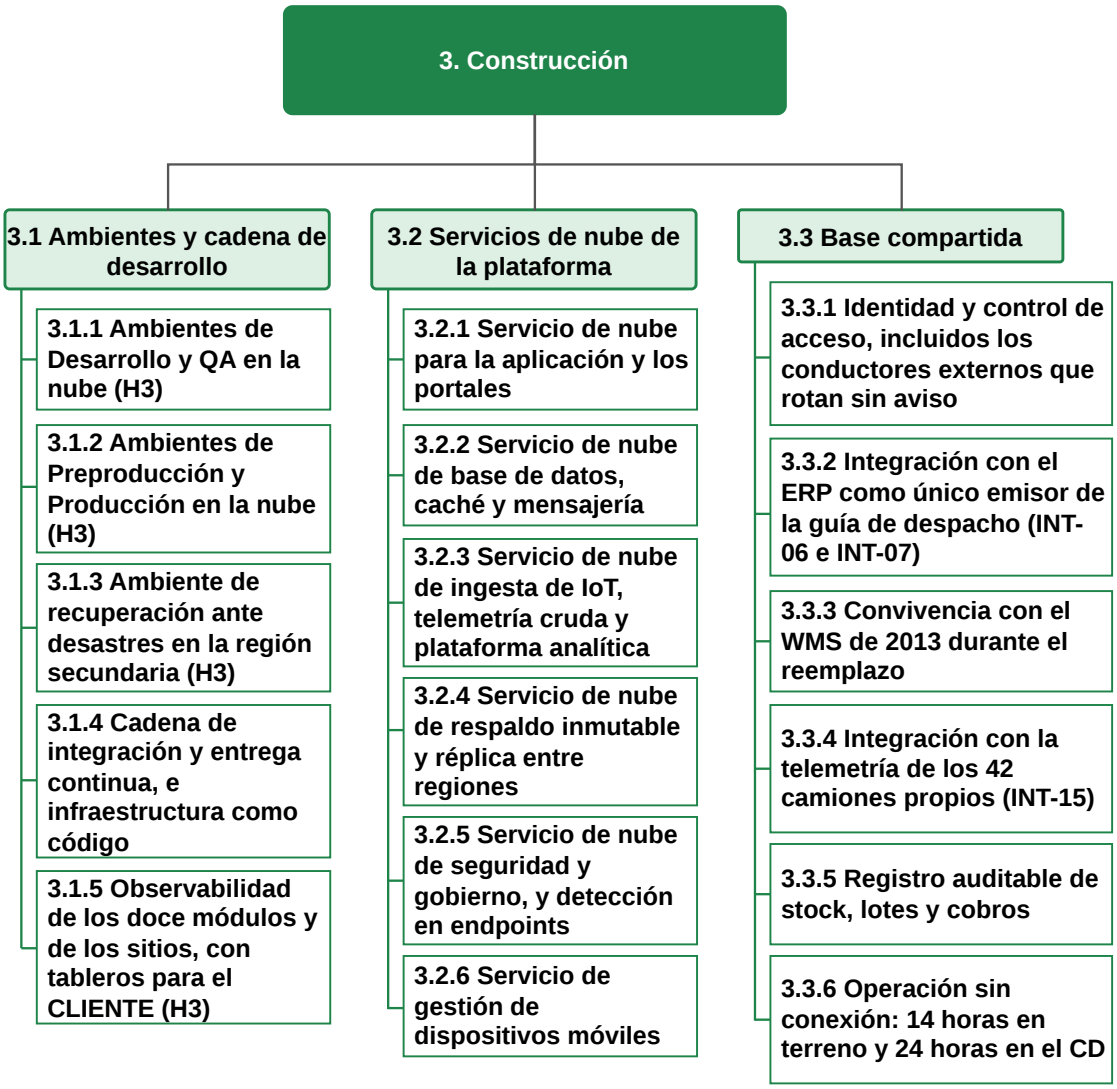


Figura 7.6 Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3.

La segunda lámina desglosa los módulos de la Etapa 1 (cuenta 3.4), con los componentes de recepción, inventario, preparación de pedidos, cadena de frío, aplicaciones y operación de tiendas.

Alex

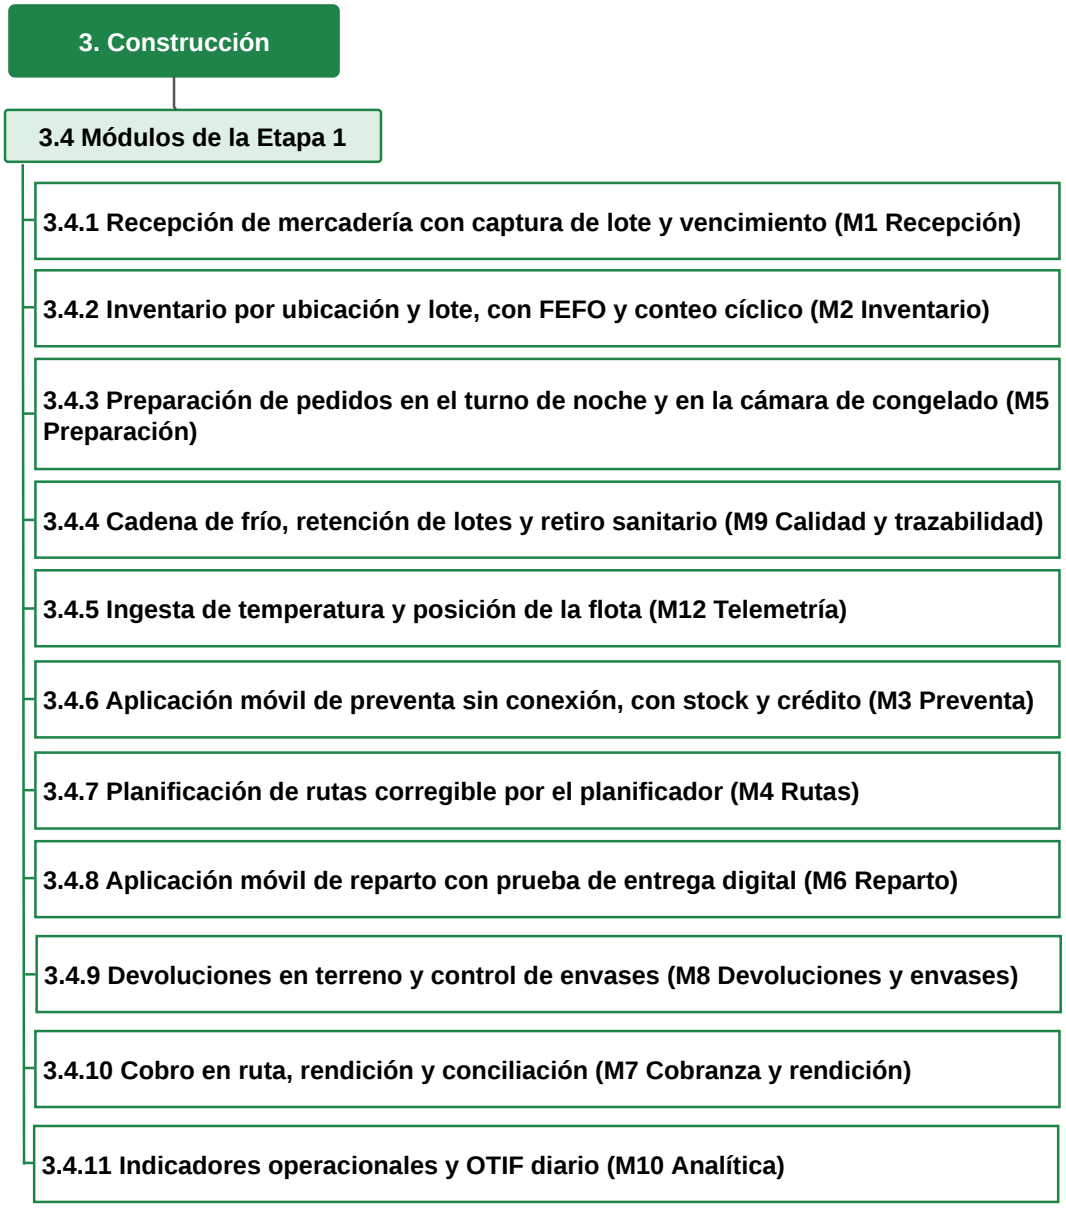


Figura 7.7 Fase 3 — Construcción, segunda parte: módulos de la Etapa 1, cuenta 3.4.

La tercera lámina presenta los módulos de la Etapa 2, las integraciones externas, la migración y las pruebas de la Etapa 1 (cuentas 3.5 a 3.8). La integración con el ERP conserva su función de emisor único de la guía de despacho.

Alex

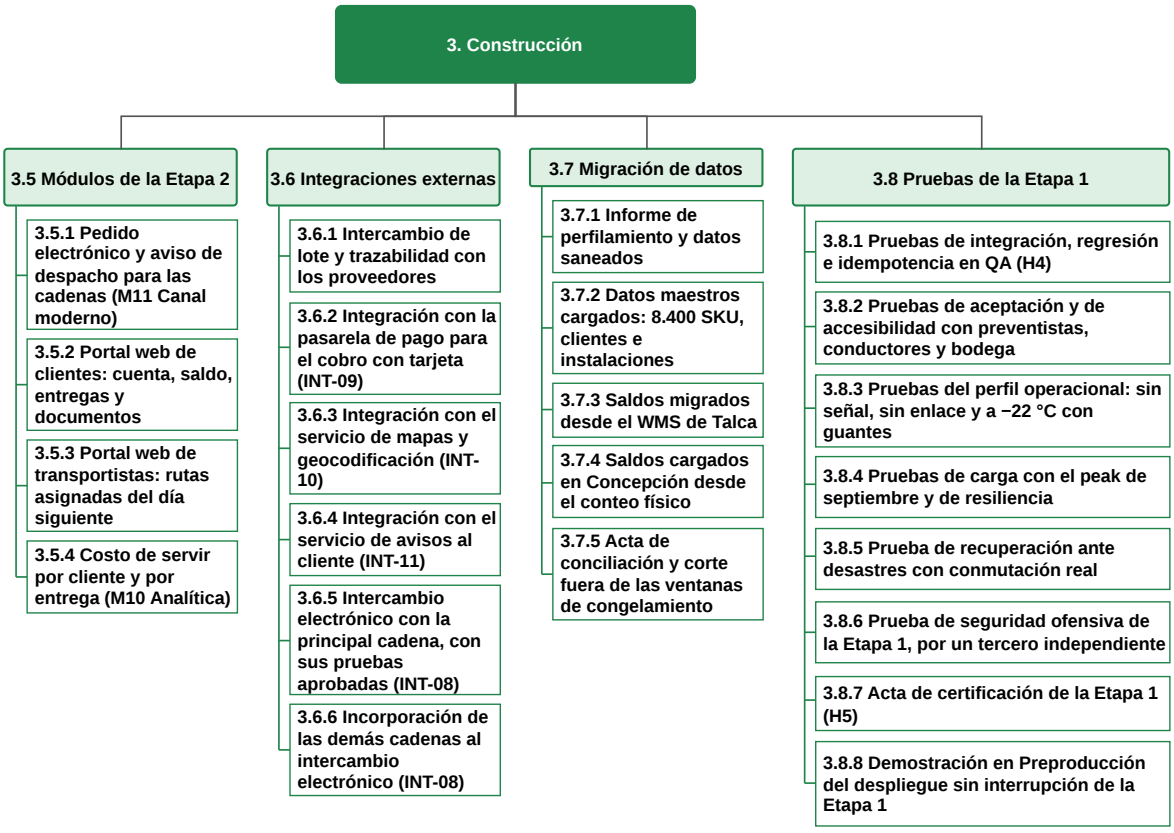


Figura 7.8 Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8.

La cuarta lámina reúne las pruebas de la Etapa 2, las innovaciones y la documentación técnica (cuentas 3.9 a 3.11).

Alex

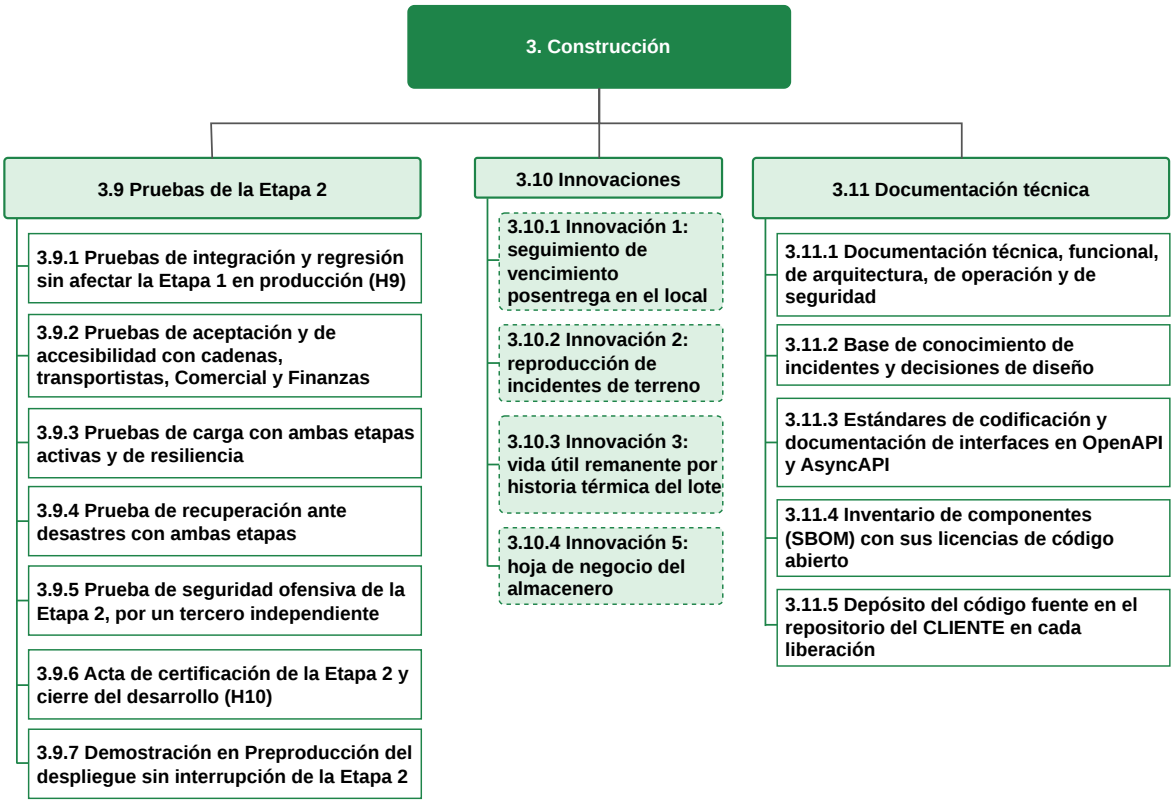


Figura 7.9 Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11.

La quinta lámina amplía la cuenta 3.10 para que se lean sus paquetes de innovación: seguimiento de vencimientos, reproducción de incidentes, vida útil remanente y hoja de negocio del almacenero.

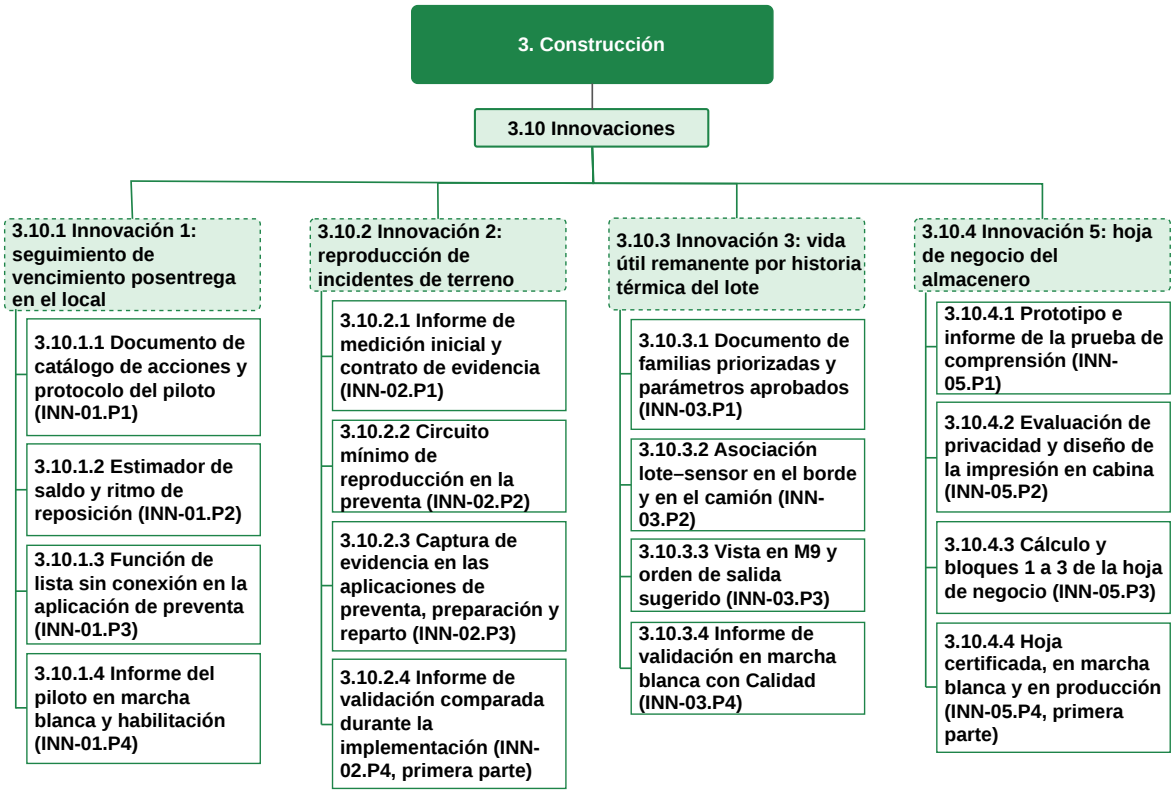


Figura 7.10 Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10.

El detalle identifica los paquetes de INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 dentro de 3.10. INN-04 conserva su tratamiento distinto: su fórmula contractual se acuerda en la cuenta 5.4, como muestra la fase de Adquisiciones y contrataciones.

7.1.2.4 Fase 4. Transición

Transición convierte la solución probada en el registro oficial. Su plan contempla las olas y la reversión; luego coordina las marchas blancas, la estabilización y las actas de aceptación de ambas etapas (H7 y H12).

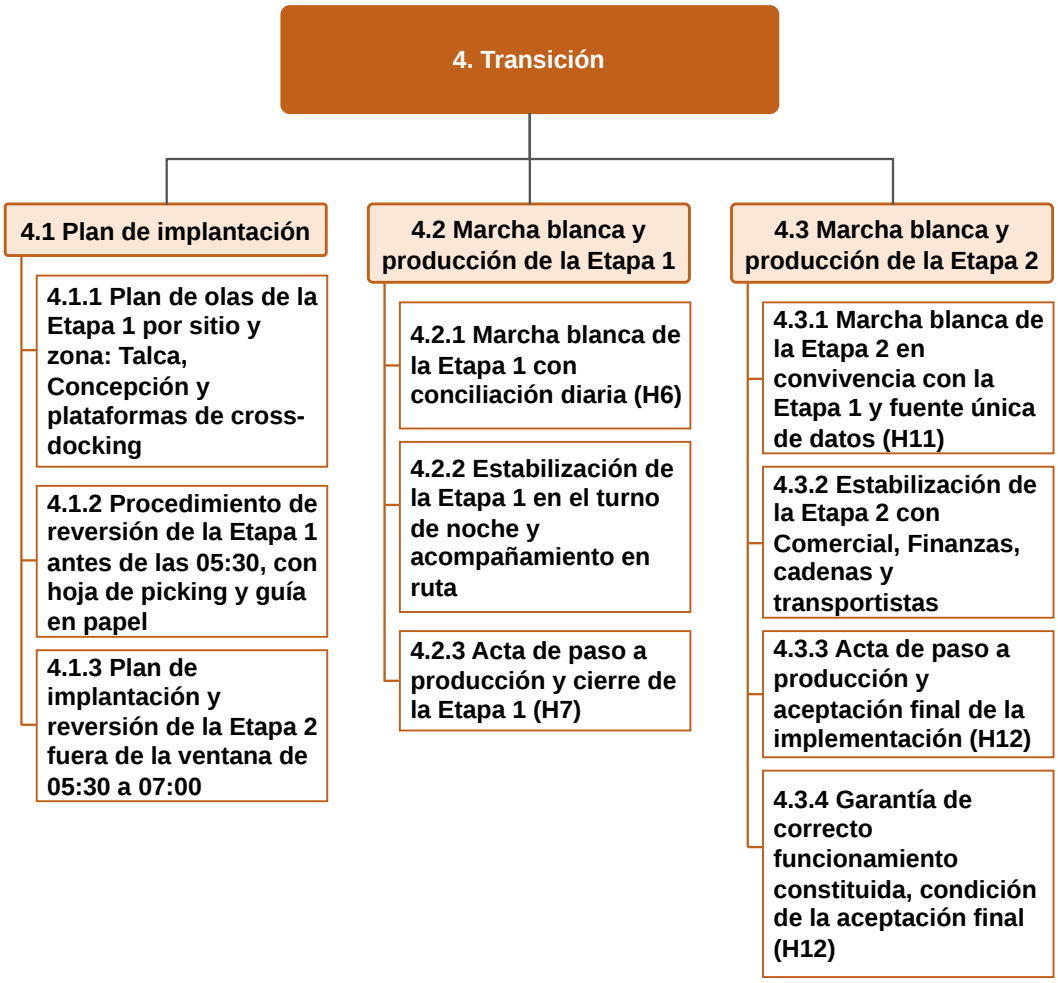


Figura 7.11 Fase 4 — Transición: plan de implantación y marchas blancas de las etapas 1 y 2, cuentas 4.1 a 4.3.

La cuenta 4.1 prepara las olas y la reversión; las cuentas 4.2 y 4.3 separan la marcha blanca y producción de cada etapa, asociadas a los hitos H7 y H12.

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones

Esta fase distingue el equipamiento de terreno, que el CLIENTE compra según la especificación de LafroX, de la infraestructura de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde, que LafroX especifica, compra y provee. LafroX incorpora el costo de esta infraestructura en su Oferta Económica; el CLIENTE no la adquiere mediante una compra separada. LafroX también contrata nube, enlaces y licencias. La fase formaliza, además, los acuerdos con transportistas y sindicato y la fórmula contractual de la innovación 4.

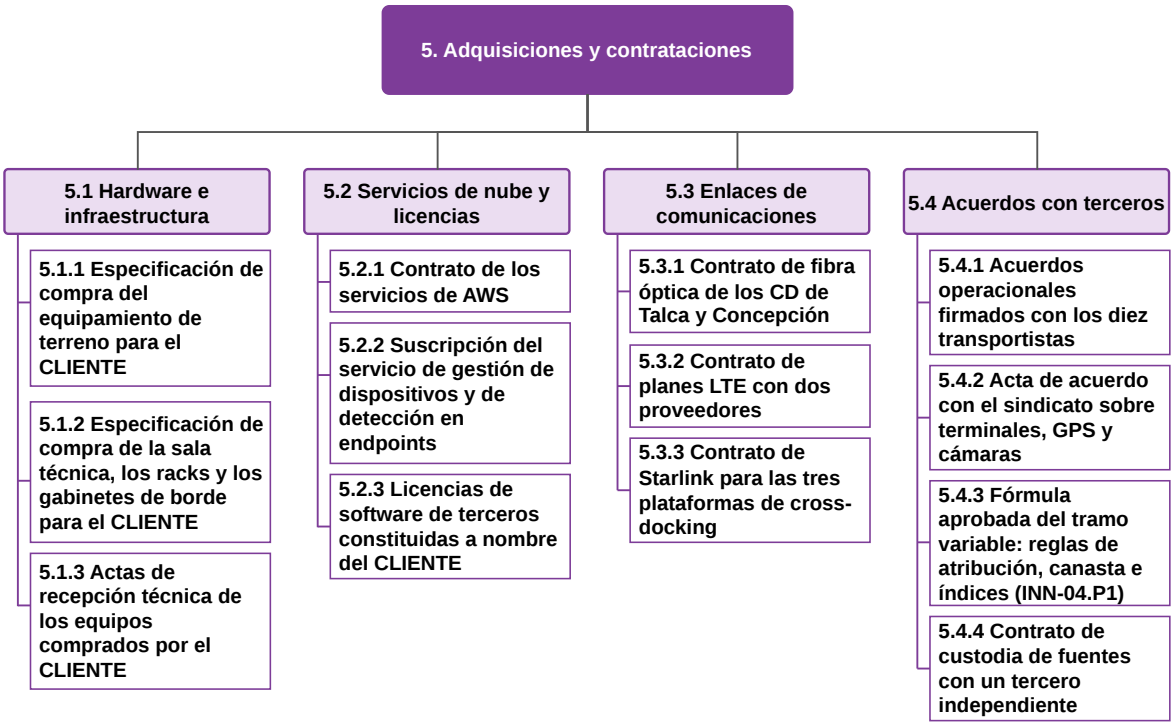


Figura 7.12 Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4.

La cuenta 5.1 reúne las adquisiciones de hardware, manteniendo la distinción anterior: el CLIENTE compra el equipamiento de terreno y LafroX compra y provee la infraestructura de sala, incluida en su Oferta Económica. Las cuentas 5.2 a 5.4 organizan nube y licencias, enlaces y acuerdos con terceros.

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios

La fase instala la sala técnica de Talca, con energía, climatización y extinción; el cableado, los racks y gabinetes de borde; y la infraestructura de los sitios. La primera lámina cubre la sala, el cableado y el montaje de racks (cuentas 6.1 a 6.3).

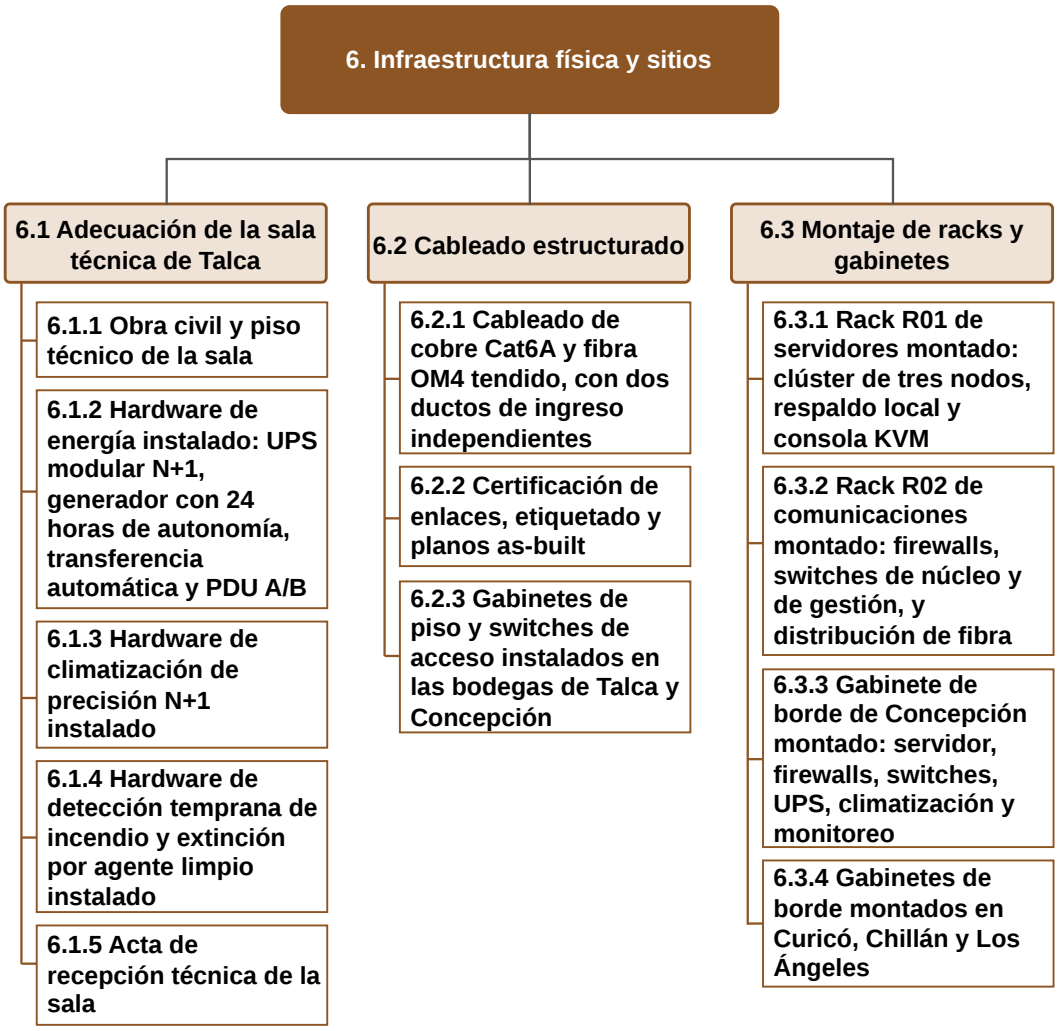


Figura 7.13 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3.

La segunda lámina incluye seguridad física, equipamiento de campo y configuración de la infraestructura distribuida en los sitios (cuentas 6.4 a 6.6), incluidos los termógrafos de los camiones con frío y la prueba de autonomía de 24 horas.

Alex

Media firma: Alex Aravena



Figura 7.14 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, segunda parte: seguridad física, equipamiento de campo y configuración, cuentas 6.4 a 6.6.

Con seguridad física, equipamiento de campo y configuración de los sitios, estas cuentas completan la infraestructura distribuida que habilita la operación en terreno.

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio

La fase atiende la rotación del 38 % en preparación con capacitación continua del turno de noche; acompaña individualmente al personal con veinte o treinta años en la compañía; incorpora a los conductores externos en el andén; y transfiere conocimiento al equipo de TI del CLIENTE. La certificación de usuarios (cuenta 7.3) es una de las condiciones de cierre de cada marcha blanca.

Alex

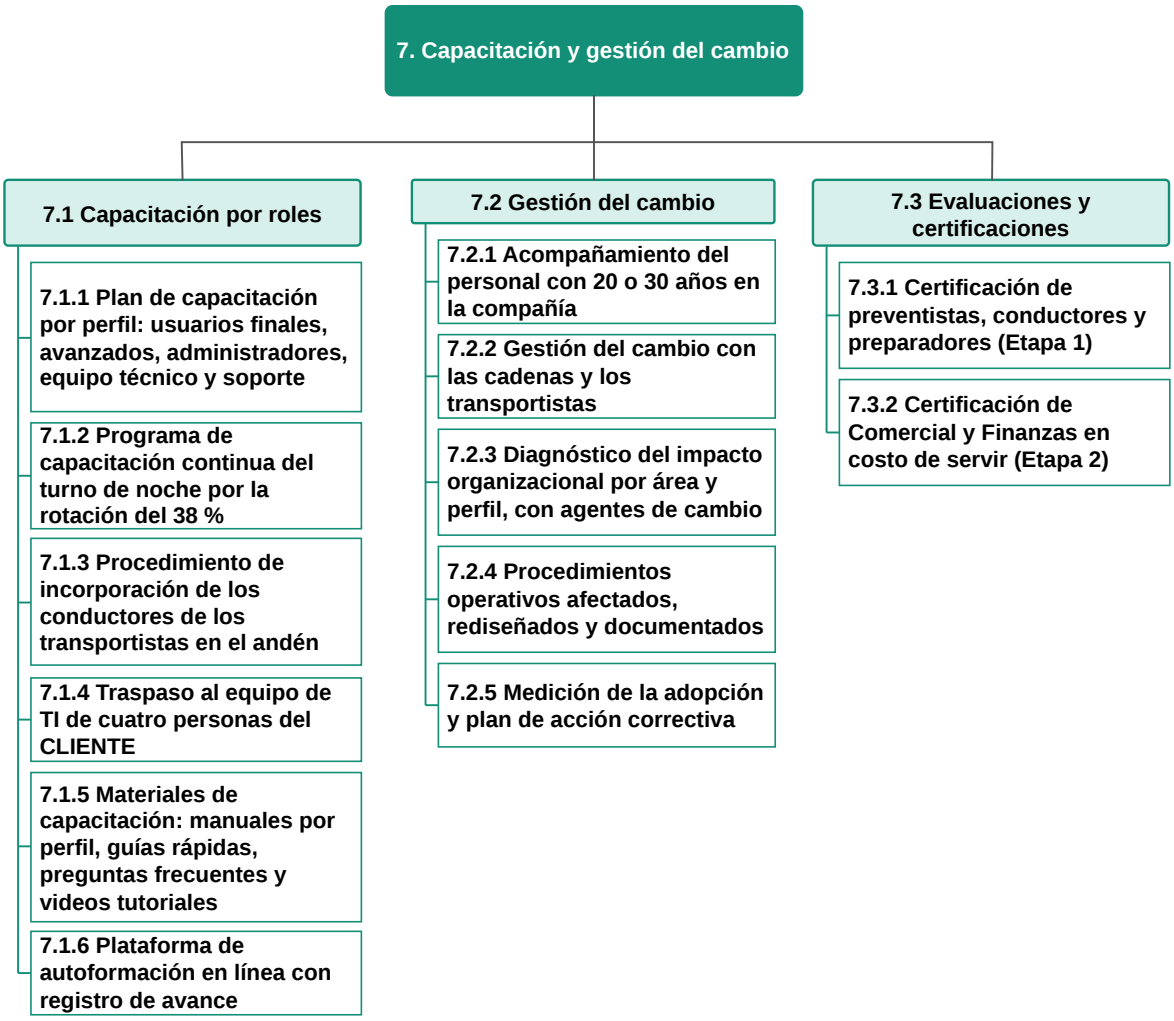


Figura 7.15 Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3.

La lámina muestra que la adopción combina formación por perfil, acompañamiento del personal y certificaciones antes de los cierres de marcha blanca.

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte

La fase presta servicios durante los meses 21 a 56: centro de operaciones, gestión de incidentes, continuidad, mantenimiento, innovaciones, informes y transferencia al equipo del CLIENTE. La primera lámina presenta las cuentas 8.1 y 8.2, que reúnen los servicios de operación y el mantenimiento de la solución.

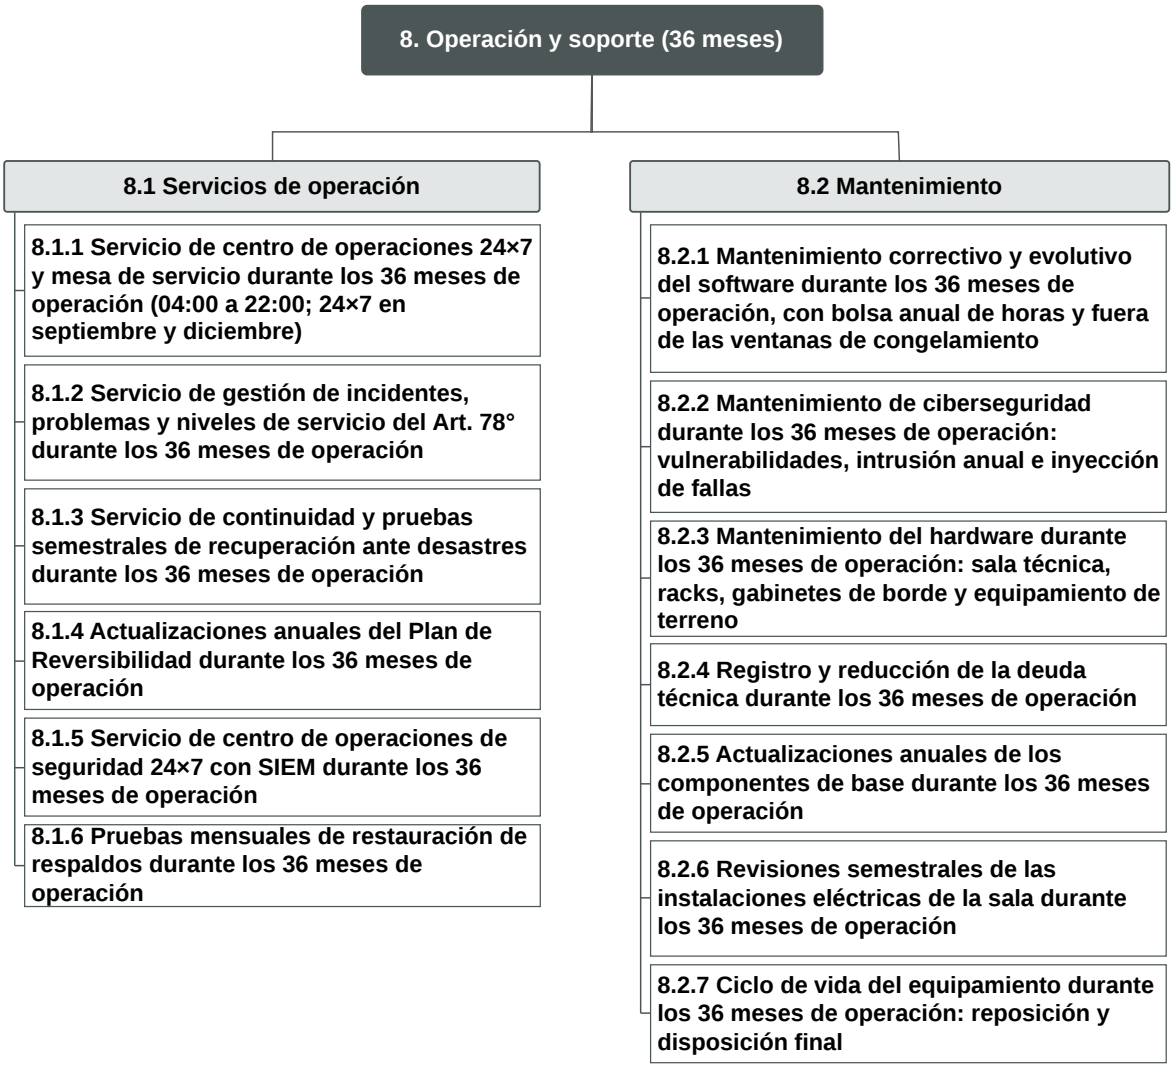


Figura 7.16 Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2.

La primera parte concentra la continuidad del servicio y el mantenimiento del software, la infraestructura y la ciberseguridad. Sus paquetes conservan las frecuencias, horarios y ventanas que condicionan la operación durante los 36 meses.

La segunda lámina completa la fase con las cuentas 8.3 a 8.5: innovaciones en operación, informes y obligaciones periódicas, y capacitación y transferencia. También distingue los períodos particulares de las innovaciones y la mentoría al equipo del CLIENTE.

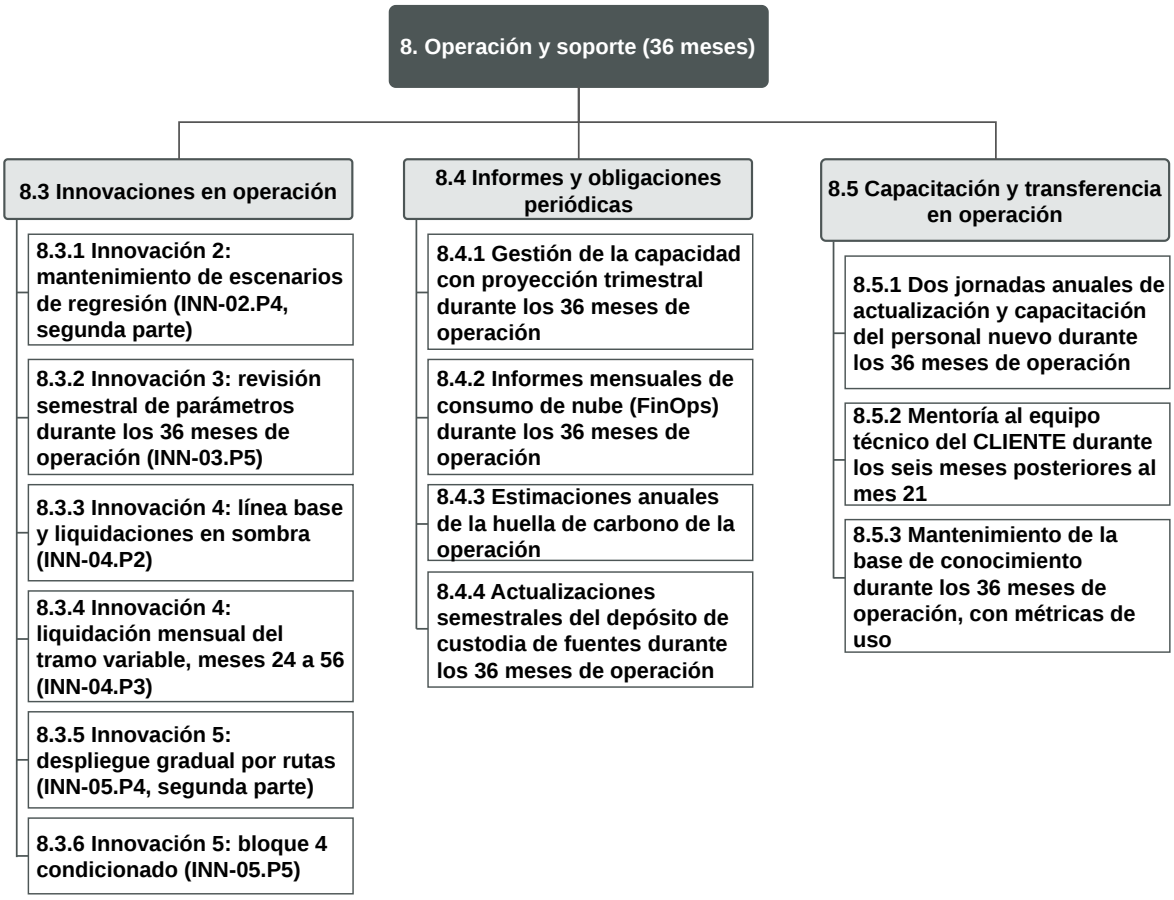


Figura 7.17 Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5.

Estas cuentas completan la operación con la continuidad de las innovaciones, los informes recurrentes y la transferencia de conocimiento. La mentoría al equipo técnico del CLIENTE se extiende durante los seis meses posteriores al mes 21, mientras que el tramo variable de INN-04 se liquida entre los meses 24 y 56.

7.1.2.9 Fase 9. Cierre

Cierre comprende dos momentos: completar la implementación en el mes 21, con entrega de código, infraestructura como código y lecciones aprendidas; y ejecutar la salida al término del contrato, con el Plan de Reversibilidad y el tratamiento final de los datos.

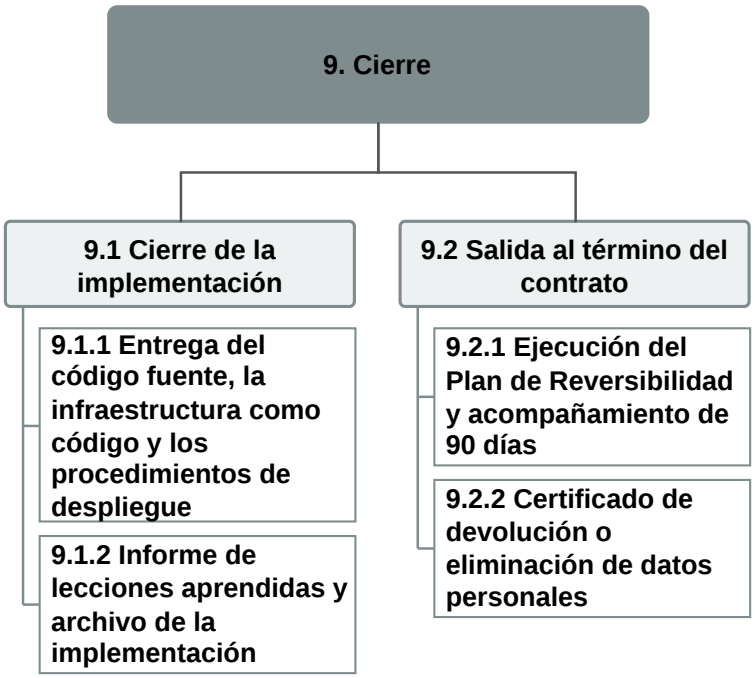


Figura 7.18 Fase 9 — Cierre: cierre de implementación y salida al término del contrato, cuentas 9.1 y 9.2.

La EDT distingue así el cierre de implementación del mes 21 de la salida al término del contrato, que incluye la ejecución del Plan de Reversibilidad y el tratamiento final de los datos.

7.1.3 Cobertura del alcance

Las Aclaraciones de la licitación exigen que la EDT contenga explícitamente las innovaciones y las actividades de seguridad, calidad, migración e implantación (sección 11, Capítulo 7), y el Caso logística exige que contenga la arquitectura (capítulo 19). La Tabla 7.2 comprueba que cada uno de esos componentes tiene paquetes propios.

Tabla 7.2 Cobertura del alcance en la EDT. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14); LafroX (2026m, SD4); y Distribuidora Puelche S.A. (2026d, Aclaraciones).

Componente	Elementos	PT	Cuentas de control	Exigencia
Módulos	M1–M12 y los portales de clientes y de transportistas; el portal de proveedores se construye con M11 Canal moderno (3.5.1)	15	3.4, 3.5	Caso logística, cap. 19
Interfaces	INT-01 a INT-15	21	3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 6.3, 6.5	Caso logística, cap. 19
Innovaciones	INN-01 a INN-05	23	3.10, 5.4, 8.3	Aclaraciones; BA, Art. 29°
Seguridad	Diseño, construcción, pruebas y operación	17	1.9, 2.2, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.11, 6.4, 8.1, 8.2	Aclaraciones
Calidad	Planes, puertas, pruebas y deuda técnica	19	1.5, 3.8, 3.9, 3.11, 8.2	Aclaraciones
Migración	Perfilamiento, carga, ensayos y conciliación	6	3.3, 3.7	Aclaraciones; BTT, numeral 20.1
Implantación	Olas, marchas blancas, capacitación y cambio	23	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	Aclaraciones; RT-20.01 a 20.08

La tabla muestra que ninguna exigencia descansa en un paquete genérico. La seguridad, por ejemplo, aparece en las cinco fases donde ocurre: el diseño de la Elaboración, la identidad y las pruebas de seguridad ofensiva de la Construcción, la seguridad física de la sala y el centro de operaciones de seguridad durante la Operación. Las pruebas de seguridad ofensiva 3.8.6 y 3.9.5 se cuentan en la fila de seguridad y en la de calidad, porque son a la vez control de seguridad y prueba de certificación. Las pruebas de la Etapa 2 repiten las de la Etapa 1 con una exigencia adicional: demostrar que la Etapa 1 en producción no se degrada.

La Figura 7.19 ubica esos paquetes por fase y muestra en qué parte de la EDT y, por lo tanto, del cronograma quedan las actividades de cada categoría.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Fase de la EDT	Innovaciones 23 PaqueteTrabajo	Seguridad 17 PaqueteTrabajo	Calidad 19 PaqueteTrabajo	Migración 6 PaqueteTrabajo	Implantación 23 PaqueteTrabajo
1 Inicio	—	1.9.2, 1.9.3, 1.9.4	1.5.1, 1.5.2	—	—
2 Elaboración	—	2.2.1–2.2.4	—	—	—
3 Construcción	3.10.1 INN-01 3.10.2 INN-02 3.10.3 INN-03 3.10.4 INN-05	3.2.5, 3.3.1 3.8.6, 3.9.5 3.11.4	3.8.1–3.8.8 3.9.1–3.9.7 3.11.3	3.3.3 3.7.1–3.7.5	—
4 Transición	—	—	—	—	4.1.1–4.1.3 4.2.1–4.2.3 4.3.1–4.3.4
5 Adquisiciones	5.4.3 INN-04	—	—	—	—
6 Infraestructura	—	6.4.1–6.4.3	—	—	—
7 Capacitación	—	—	—	—	7.1.1–7.1.6 7.2.1–7.2.5 7.3.1, 7.3.2
8 Operación	8.3.1–8.3.6 (INN-02 a INN-05)	8.1.5, 8.2.2	8.2.4	—	—
9 Cierre	—	—	—	—	—

Figura 7.19 Ubicación en la EDT de las innovaciones y la seguridad, la calidad, la migración y la implantación. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y Distribuidora Puelche S.A. (2026d, sec. 11).

La matriz confirma que las cinco categorías se distribuyen desde el diseño hasta la operación. Las innovaciones tienen paquetes en las fases donde se construyen, se contratan y se operan: INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 se construyen en la cuenta 3.10; la fórmula contractual de INN-04 se aprueba en la cuenta 5.4, porque es una innovación de modelo de contratación y no tiene paquete de construcción; e INN-02 a INN-05 tienen su parte de operación en la cuenta 8.3. Cada innovación tiene sus meses en el Anexo 7.D (BA, art. 29, p. 19, punto 4).

Los anexos completan la cobertura. El Anexo 7.E relaciona los doce módulos y las quince interfaces del Capítulo 4 con el paquete que los construye y prueba, y el Anexo 7.C ubica los dieciséis resultados de aceptación del caso en su paquete y su momento. Los requerimientos del Formulario T-12 se trazan a los paquetes mediante la matriz de trazabilidad del paquete 1.2.4, que se aprueba con el H1.

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables

El diccionario de la EDT, en el Formulario T-14, describe cada paquete con su entregable, su criterio de aceptación, su responsable y el período del cronograma en que se ejecuta, junto con el hito del Formulario E-25 que habilita. Todo entregable se recibe con el acta de la Contraparte Técnica, acompañada de su evidencia de verificación, su trazabilidad hacia los requerimientos y las observaciones resueltas (BA, arts. 18.1 y 18.2, p. 13). Los criterios del diccionario se suman a esa regla común. Por ejemplo, el paquete 3.4.1 (M1 Recepción) se acepta solo si ningún producto con trazabilidad obligatoria se recibe sin lote, y el 4.1.2 (reversión de la Etapa 1) se acepta solo si su ensayo termina antes de las 05:30, sostiene 96 despachos sin interrupción con DTE válidos del ERP y no pierde ni duplica registros.

Los responsables son los ocho roles de la estructura para el proyecto del Capítulo 1, sección 1.5. La Tabla 7.3 muestra cómo se reparten los paquetes.

Tabla 7.3 Paquetes por responsable. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14).

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Líder de Operación / SRE	58	26 %	6 (21), 3 (13), 8 (12)
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	34	15 %	7 (13), 4 (7)
Jefe de Proyecto	33	15 %	1 (22)
Líder de Desarrollo	24	11 %	3 (21)
Líder de Calidad	19	9 %	3 (15)
Arquitecto de Solución	18	8 %	2 (5), 3 (6)

continúa en la página siguiente



Tabla 7.3 — continuación

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Encargado de Seguridad de la Información	18	8 %	1 (4), 2 (4), 3 (4)
Líder de Datos	18	8 %	3 (16)
Total	**222**	**100 %**	

Todos los paquetes tienen un responsable único, de modo que son asignables. La distribución sigue la naturaleza del trabajo: el Jefe de Proyecto concentra la gestión y el gobierno; el Líder de Desarrollo, la construcción; y el Líder de Implantación, la capacitación y la transición. El Líder de Operación / SRE responde por un cuarto de los paquetes, porque reúne la nube, la infraestructura de los cinco sitios y la operación, y sus paquetes de las fases 3 y 6 ocurren a la vez. Responder por un paquete no significa ejecutarlo en persona: la sección 7.2.3 y el Formulario T-15 muestran qué frente ejecuta el trabajo bajo cada rol.

7.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo aplica las metodologías del Capítulo 6. La gestión del proyecto se basa en el PMBOK: los alcances aprobados (H1 y H8) y el cronograma son las líneas base contra las que se mide el avance; el avance se mide con valor ganado en el informe mensual (RT-19.06 y RT-19.07); y todo cambio de alcance, plazo o criterio de aceptación se aprueba antes de incorporarse al plan, conforme al artículo 72 de las Bases Administrativas (p. 38) (paquete 1.4.3).

El desarrollo sigue las cuatro fases del proceso iterativo del Capítulo 6, que la EDT recorre una vez por etapa. Dentro de la Construcción, cada módulo avanza por iteraciones que producen resultados verificables, mientras que la marcha blanca y la aceptación formal ocurren solo en los meses que fija el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El tablero de flujo del equipo coordina las tareas diarias, pero no reemplaza el cronograma ni la aceptación formal de los entregables, como establece la metodología de gestión de proyectos del Capítulo 6.

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias

El orden del trabajo sigue las dependencias de datos y de infraestructura de Puelche (Capítulo 3, sección 3.4.3). Primero se aprueban el alcance (H1, mes 2) y el diseño (H2, mes 4). En paralelo, se especifica y compra el equipamiento de la sala y de los sitios, y se contratan la nube y los enlaces, de modo que la infraestructura híbrida y los ambientes queden habilitados en el H3 del mes 6.



La construcción de la Etapa 1 parte por la base compartida, porque si falla, fallan todos los módulos. Sigue con recepción e inventario, que alimentan la preparación y el retiro sanitario, mientras la preventa avanza en paralelo porque necesita stock y crédito. Las rutas y el reparto se integran cuando existen el pedido confirmado y la preparación, y la rendición, cuando existe la entrega registrada. La Etapa 2 se diseña en los meses 13 y 14 (H8), reutiliza los pedidos, las guías y las evidencias ya probadas, y calcula el costo de servir con los hechos acumulados desde la marcha blanca de la Etapa 1.

La Figura 7.20 presenta esa red de precedencias entre cuentas de control. El Anexo 7.B lista las 34 dependencias entre paquetes con su fundamento.



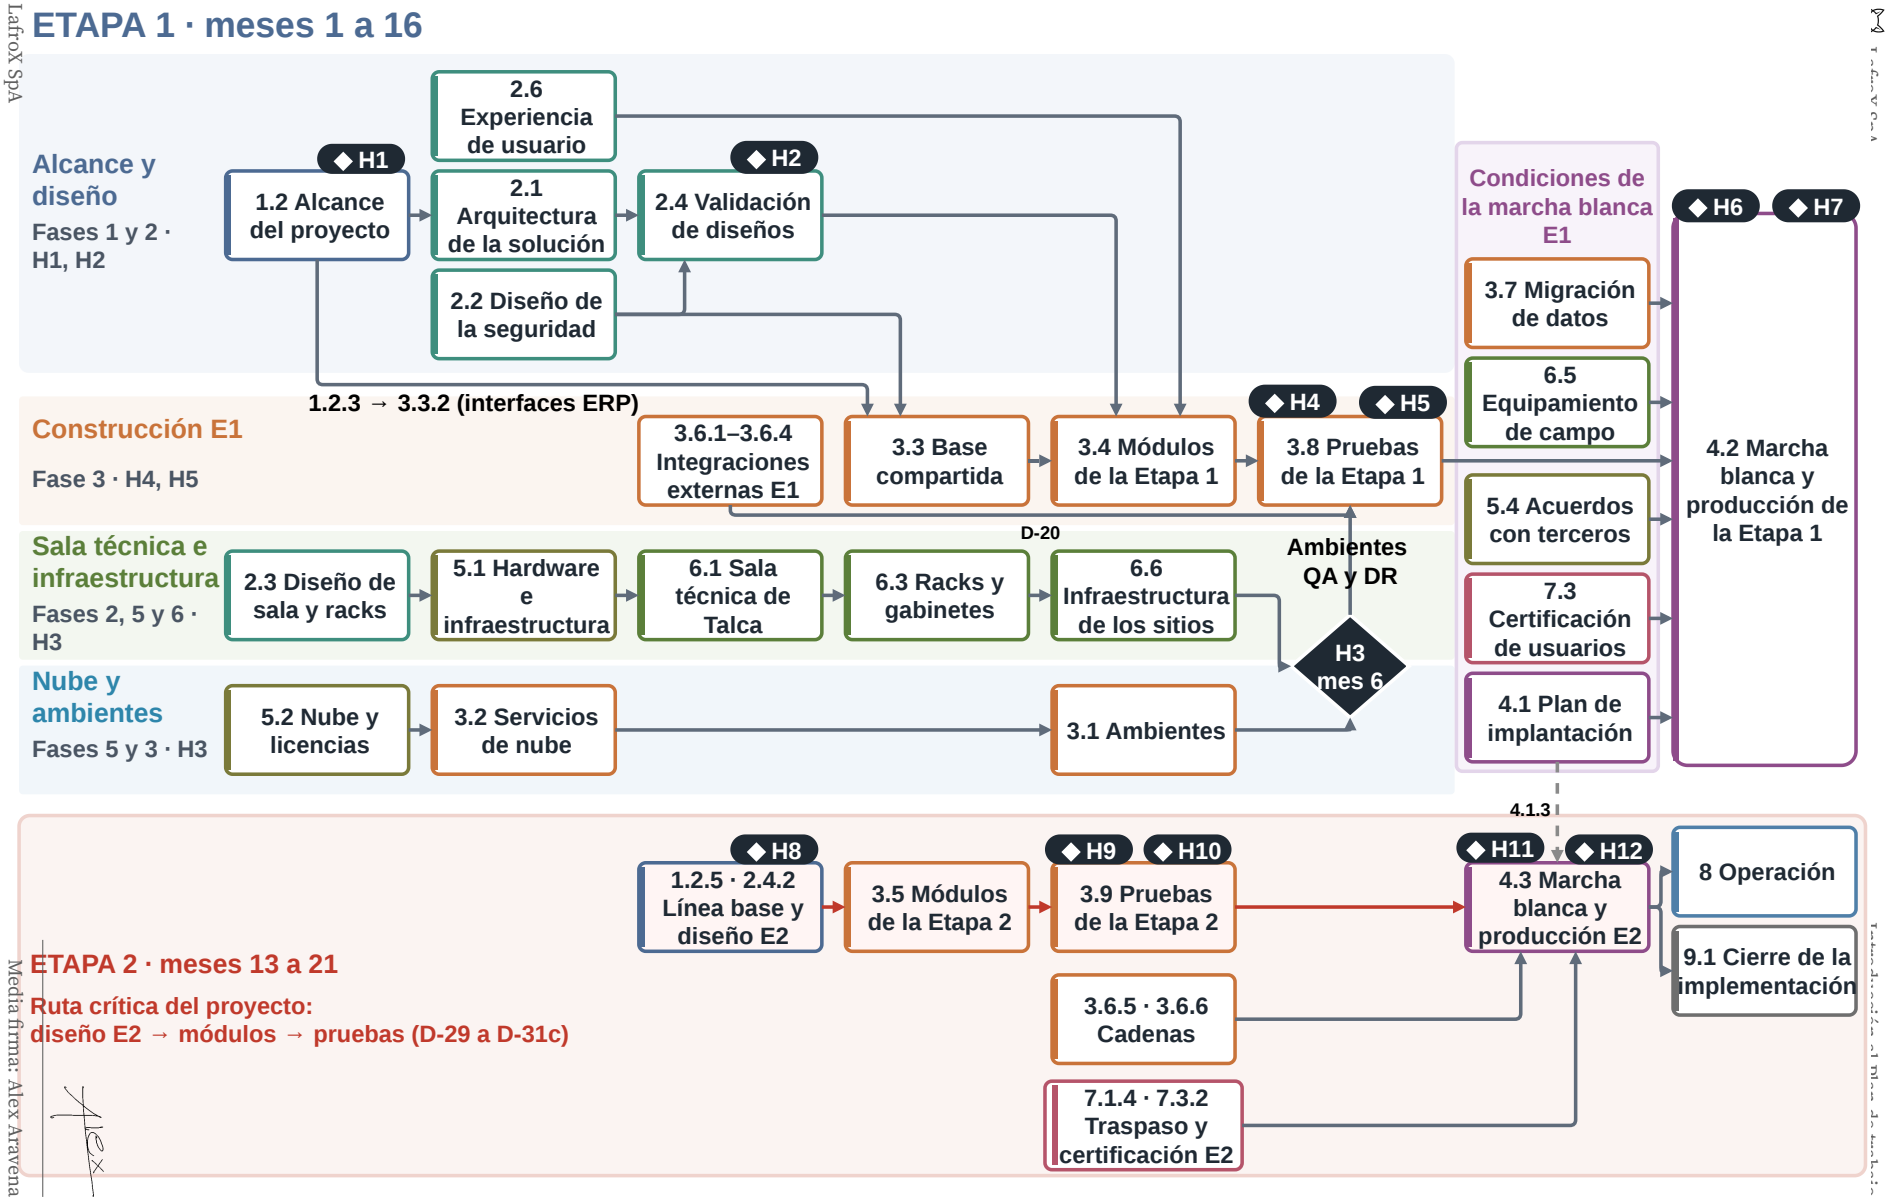


Figura 7.20 Red de precedencias entre cuentas de control e hitos. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026t, Anexo 7.B) y Distribuidora Puelche S.A. (2026a, Formulario E-25).

La red muestra tres convergencias. En el H3 se juntan la cadena de la nube (5.2, 3.2 y 3.1) y la de la sala técnica (2.3, 5.1, 6.1, 6.3 y 6.6). En los hitos H4 y H5 se juntan los módulos, la base compartida, el diseño aprobado y la experiencia de usuario. Al cierre de la marcha blanca se juntan la solución certificada, la migración, el equipamiento de cada ola, la certificación de los usuarios y, en la ola de reparto, los acuerdos con los transportistas y el sindicato. Un atraso en cualquiera de esas ramas se propaga al hito aunque no sea de software. En el escenario nominal anterior a la reestimación, el camino de menor holgura pasa por el diseño, los módulos y la certificación de la Etapa 2; la sección 7.3.1 explica el alcance de ese resultado histórico.


El secuenciamiento incorpora además las condiciones de la operación de Puelche que el caso exige ver en el plan (sección 17.5). Los congelamientos de septiembre y diciembre, y el cierre de los tres primeros días hábiles de cada mes, son restricciones de calendario para todo corte, despliegue e inicio de ola (paquete 1.3.1). La implantación en bodega y su acompañamiento se programan en el turno de noche, entre las 22:00 y las 06:00 (paquete 4.2.2), y la rotación del 38 % se atiende con capacitación continua y no con un evento único (paquete 7.1.2). Los 62 preventistas y los cerca de 200 conductores se capacitan en su ruta, sin detener la venta ni el reparto (paquetes 7.1.1 y 4.2.2).

Los acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato preceden a la ola de reparto (paquetes 5.4.1 y 5.4.2), y la certificación del intercambio electrónico es un paquete por cadena y no una tarea única (paquetes 3.6.5 y 3.6.6). Las interfaces del sistema de gestión se levantan en el Inicio y se prueban temprano (paquetes 1.2.3 y 3.3.2). Las reglas de ruteo del planificador se capturan en los talleres de los meses 1 a 3 y se validan sin él durante la marcha blanca (paquete 1.2.2; resultado R18-16).

7.2.2 Estimación

El esfuerzo se estima por paquete con tres valores en horas hombre: optimista, más probable y pesimista (PMI, 2017, p. 201). La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, una de las que el PMBOK admite para modelar la incertidumbre de duración y recursos (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT da el esfuerzo esperado $T_E = (O + 4M + P)/6$ y su desviación $\sigma = (P - O)/6$ (Malcolm et al., 1959). El PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O + M + P)/3$ (PMI, 2017, p. 201); se prefiere la beta porque da cuatro veces más peso al valor más probable, que el equipo funda en los requerimientos del Formulario T-12 y en las cantidades del Formulario T-11.

La base de cada estimación depende del tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman a partir de los requerimientos del Formulario T-12 asignados a cada paquete; la infraestructura, a partir de las cantidades del Formulario T-11; la implantación, a partir de las personas y rutas del caso; y la operación, a partir de los horarios de cobertura y de la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 se estiman por mes y se multiplican por los 36 meses de operación. El Formulario T-15 detalla el método y las reglas de programación. La duración de cada paquete se obtiene de su esfuerzo esperado y de la dotación asignada, y la suma de las varianzas de los paquetes de la ruta crítica entrega la probabilidad de cumplir cada hito con la aproximación normal de PERT. Para programar y controlar, el esfuerzo de cada



paquete se reparte entre sus actividades del Formulario T-15, sección 6, sin cambiar su total.

La Tabla 7.4 resume el resultado de la estimación por etapa contractual, con la reserva protegida separada del trabajo base.

Tabla 7.4 Horas hombre programadas por etapa — Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026e, T-15), sección 4.3

Etapa	Meses	HH base y cobertura	HH de reserva protegida	HH programadas
Etapa 1 · Desarrollo	1 a 12	38.141	0	38.141
Etapa 1 · Marcha blanca	13 a 15	11.195	1.152	12.347
Etapa 2 · Desarrollo	13 a 18	11.407	0	11.407
Etapa 2 · Marcha blanca	19 y 20	7.308	0	7.308
Soporte puente de la Etapa 1	16 a 20	14.792	1.920	16.712
Cierre y estabilización de la implementación	21 y 22	2.775	0	2.775
Operación	21 a 56	128.854	0	128.854
Total		**214.471**	**3.072**	**217.543**

La operación concentra el 59 % de las horas programadas (128.854 de 217.543 HH), porque cubre 36 meses de servicio continuo del centro de operaciones y la mesa, y el SOC desde la primera marcha blanca del mes 13; la mesa incluye desde el mes 25, cuando la demanda proyectada se acerca a su límite, un tercer agente en las franjas de menor demanda, con el que cubre sus niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes. Son puestos de turno 24×7 y de mesa, no personas dedicadas a otras tareas. La implementación propiamente tal, de los meses 1 a 22, suma 88.689 HH, y su tramo más denso son los meses 13 a 15, cuando la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2 suman 17.513 HH (4.501,27 + 4.905,22 + 8.106,39, según la curva del Formulario T-15, sección 4.4), con el máximo de 69 personas equivalentes en el mes 15. Las 3.072 HH de reserva se asignan sólo a la Etapa 1, de modo que una corrección en su marcha blanca no se financia con horas de la Etapa 2.



7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización

El trabajo se organiza en ocho frentes. Cada frente es un equipo con un responsable que avanza en paralelo con los demás sobre un conjunto de cuentas de control. La Figura 7.21 presenta los frentes, su rol líder, sus cuentas de control y su ventana de actividad entre los meses 1 y 21; la correspondencia completa está en el Formulario T-15.

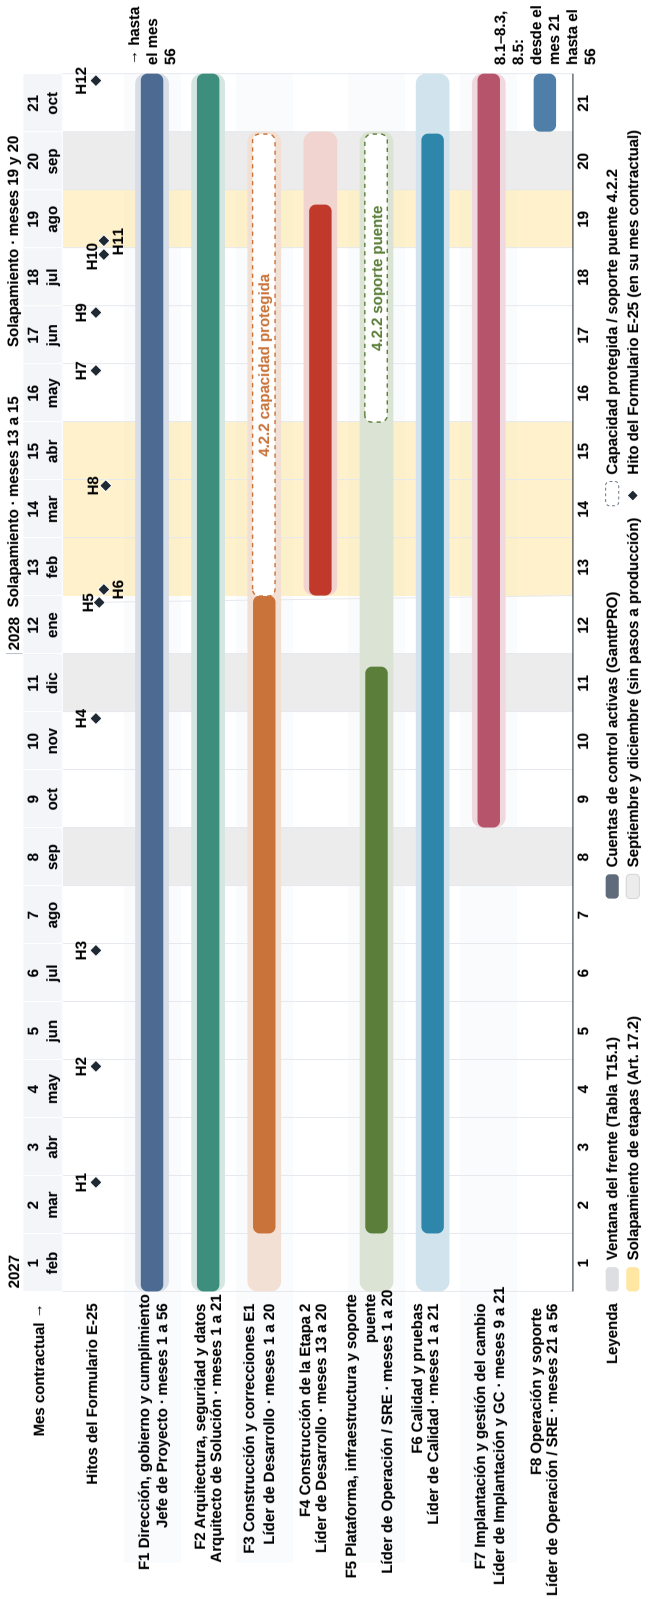


Figura 7.21 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14) y LafroX (2026e, T-15).

La figura muestra que en ningún mes trabaja un solo frente: entre los meses 1 y 15 avanzan a la vez la dirección, la arquitectura, la construcción de la Etapa 1, la plataforma y la calidad, y desde el mes 9 se suma la implantación. Los frentes se sincronizan en tres instancias. La primera son los hitos del Formulario E-25, porque cada hito exige que varios frentes entreguen a la vez. La segunda son los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37): el de Proyecto es quincenal y los de Arquitectura y Operación son mensuales, y sus actas registran los acuerdos entre frentes en dos días hábiles (RT-19.09). La tercera son las ventanas de calendario, que son comunes a todos los frentes.

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20

El artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) obliga a dimensionar dotación y frentes para dos esfuerzos simultáneos. En los meses 13 a 15 trabajan a la vez el frente de implantación (F7), en la marcha blanca de la Etapa 1 con su acompañamiento; el de construcción de la Etapa 1 (F3), en las correcciones de esa marcha blanca; el de construcción de la Etapa 2 (F4), en su desarrollo, con el H8 en el mes 14; el de calidad (F6), en las pruebas de ambas etapas; y los frentes de dirección y de arquitectura (F1 y F2).

F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, pero son equipos distintos. Si el mismo equipo atendiera la marcha blanca y desarrollara la Etapa 2, cada incidente de la marcha blanca atrasaría la Etapa 2, que es precisamente la situación que el artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) busca evitar. La Figura 7.21 lo hace visible: en la franja sombreada de los meses 13 a 15, las barras de F3 y F4 coexisten en carriles separados.

En los meses 19 y 20 la Etapa 1 está en producción y la Etapa 2 en marcha blanca. Trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6, en las pruebas; y el soporte de la Etapa 1 en producción. La dotación de cada frente en cada solapamiento se presenta en el Formulario T-15, de modo que los dos esfuerzos se sumen sin contar dos veces a las mismas personas.

7.3 Cronograma e implantación

El cronograma aplica el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) mes a mes y la implantación aplica las condiciones del Caso logística (secciones 13.3 y 17.6, pp. 23 y 33). Esta sección presenta la ruta crítica, la carta Gantt, el plan de implantación, las marchas blancas, la estabilización y el momento en que se alcanza cada resultado comprometido. El detalle está en los Formularios T-14, T-15 y T-18.

7.3.1 Ruta crítica y holguras

La ruta crítica se calcula con el método de la ruta crítica sobre la red del Anexo 7.B (PMI, 2017, pp. 210–211). Una pasada hacia adelante da las fechas tempranas de cada paquete; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13),



da las tardías; LS − ES es la holgura total; la libre se mide contra el ES de los sucesores. Como los hitos del Formulario E-25 son fechas fijas, un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

En el escenario nominal anterior a la reestimación, la cadena de menor holgura corresponde a la Etapa 2: diseño (1.2.5, 2.1.4 y 2.4.2) → módulos (3.5) → integración (3.9.1) → certificación (3.9.2–3.9.7). La Tabla 5.2 del Formulario T-15 conserva sus antiguas reservas y probabilidades como referencia histórica; no están recalculadas con las 217.543 HH ni con asignaciones nominales. También requieren comprobación las cadenas de la Etapa 1, la sala técnica, los acuerdos de implantación y la certificación de cadenas. Las marchas blancas y los pasos a producción mantienen sus fechas contractuales fijas. La Figura 7.22 representa las dependencias del escenario nominal, sin acreditar la ruta crítica de la línea base actual.



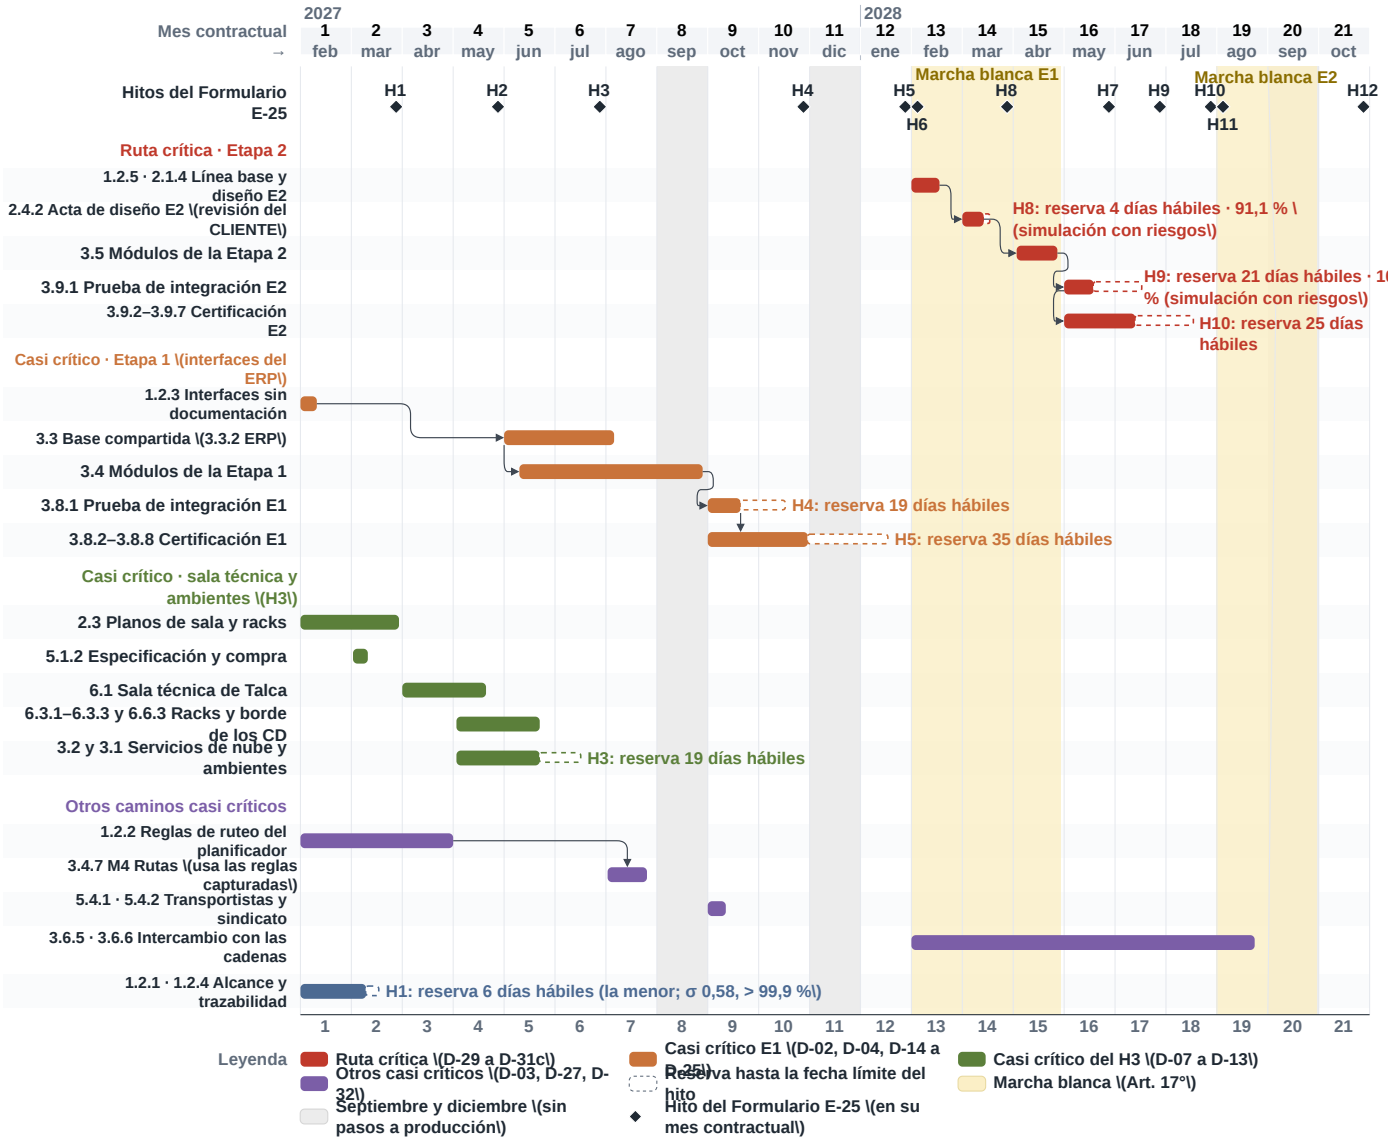


Figura 7.22 Dependencias y caminos de menor holgura del escenario nominal histórico; sujetos a recálculo. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026t, Anexo 7.B) y LafroX (2026d, T-14, períodos contractuales).

Media firma: Alex Aravena

La Figura 7.22 relaciona las cadenas de diseño, construcción y certificación con sus hitos y con las marchas blancas de ambas etapas. El escenario nominal del Formulario T-15 incluye las dependencias, los diez días hábiles de revisión del artículo 18.3 de las Bases Administrativas (p. 13) y una hipótesis de hasta 40 desarrolladores simultáneos, todavía pendiente de asignación nominal. Las reservas, probabilidades y fechas P80 de su Tabla 5.2 y del modelo de riesgos previo corresponden a ese escenario histórico; no deben interpretarse como resultados de la línea base de 217.543 HH. Las marchas blancas y sus cuatro semanas finales no aportan reserva utilizable.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT. El avance de cada paquete de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal de seguimiento y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3). Toda amenaza a un hito se escala al Comité Ejecutivo cuando la desviación proyectada supera la mitad de su reserva, sin esperar a consumirla, con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2). El informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6). H7 y H12 dependen además de la aceptación copulativa de la marcha blanca, que no tiene una probabilidad calculada.

7.3.2 Carta Gantt y calendario

La carta Gantt del Formulario T-14 cubre los 56 meses y muestra las marchas blancas, los pasos a producción y el inicio de la Operación. La Tabla 7.5 ubica los doce hitos del Formulario E-25 con el paquete que entrega cada uno.

Tabla 7.5 Hitos del Formulario E-25 en el cronograma. Fuente: elaboración a partir del Formulario E-25 y LafroX (2026d, T-14).

Hito	Mes	Entregable que lo gatilla	Paquetes
H1	2	Línea base de alcance y matriz de trazabilidad	1.2.1, 1.2.4
H2	4	Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos aprobados	2.4.1
H3	6	Infraestructura híbrida y ambientes con observabilidad	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5
H4	10	Software de la Etapa 1 con QA superado	3.8.1

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Hito	Mes	Entregable que lo gatilla	Paquetes
H5	12	Certificación de la Etapa 1	3.8.7
H6	13	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1	4.2.1
H8	14	Línea base y diseño de la Etapa 2	1.2.5, 2.4.2
H7	16	Paso a producción de la Etapa 1	4.2.3
H9	17	Software de la Etapa 2 con QA superado	3.9.1
H10	18	Certificación de la Etapa 2	3.9.6
H11	19	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2	4.3.1
H12	21	Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final	4.3.3, 4.3.4

La tabla está ordenada por mes y no por número de hito, porque el H8 (mes 14) ocurre antes que el H7 (mes 16). Ese cruce es la expresión concreta del solapamiento: la línea base de la Etapa 2 se aprueba mientras la Etapa 1 está en su marcha blanca.

Los meses contractuales caen en meses calendario distintos según la fecha de inicio del contrato, que aún no está definida (consulta V-12). La Tabla 7.6 aplica la regla a los tres inicios que el Capítulo 3, sección 3.1.2, considera compatibles con poner la Etapa 2 en producción antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados.



Tabla 7.6 Meses contractuales según la fecha de inicio. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17) y Distribuidora Puelche S.A. (2026c, secs. 13.2 y 13.3).

Inicio	Mes 13 (H6)	Mes 16 (H7)	Meses 19 y 20	Mes 21 (H12)
Diciembre de 2026	**Diciembre de 2027**	Marzo de 2028	Junio y julio de 2028	Agosto de 2028
Febrero de 2027	Febrero de 2028	Mayo de 2028	Agosto y **septiembre** de 2028	Octubre de 2028
Marzo de 2027	Marzo de 2028	Junio de 2028	**Septiembre** y octubre de 2028	Noviembre de 2028

Ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre; el Anexo 7.A extiende el análisis a los ocho meses de inicio admisibles. Con un inicio en diciembre de 2026, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 cae en diciembre; con uno en marzo de 2027, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 cae en septiembre. Con febrero de 2027, en cambio, el congelamiento afecta solo el segundo mes de la marcha blanca de la Etapa 2 y no un inicio, por lo que LafroX lo adopta como supuesto de calendario del cronograma. Su costo es que las semanas de cierre de esa marcha blanca coinciden con el peak de septiembre, que la sección 7.3.5 trata. Dentro de un mes de congelamiento no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio, y la marcha blanca continúa en convivencia, con medición diaria. La Figura 7.23 presenta la carta Gantt resumida de los 56 meses con ese supuesto de inicio, por período contractual. La carta vigente por cuenta de control, generada desde las ventanas reconciliadas de los 222 paquetes, está en el Formulario T-14, sección 3.1.



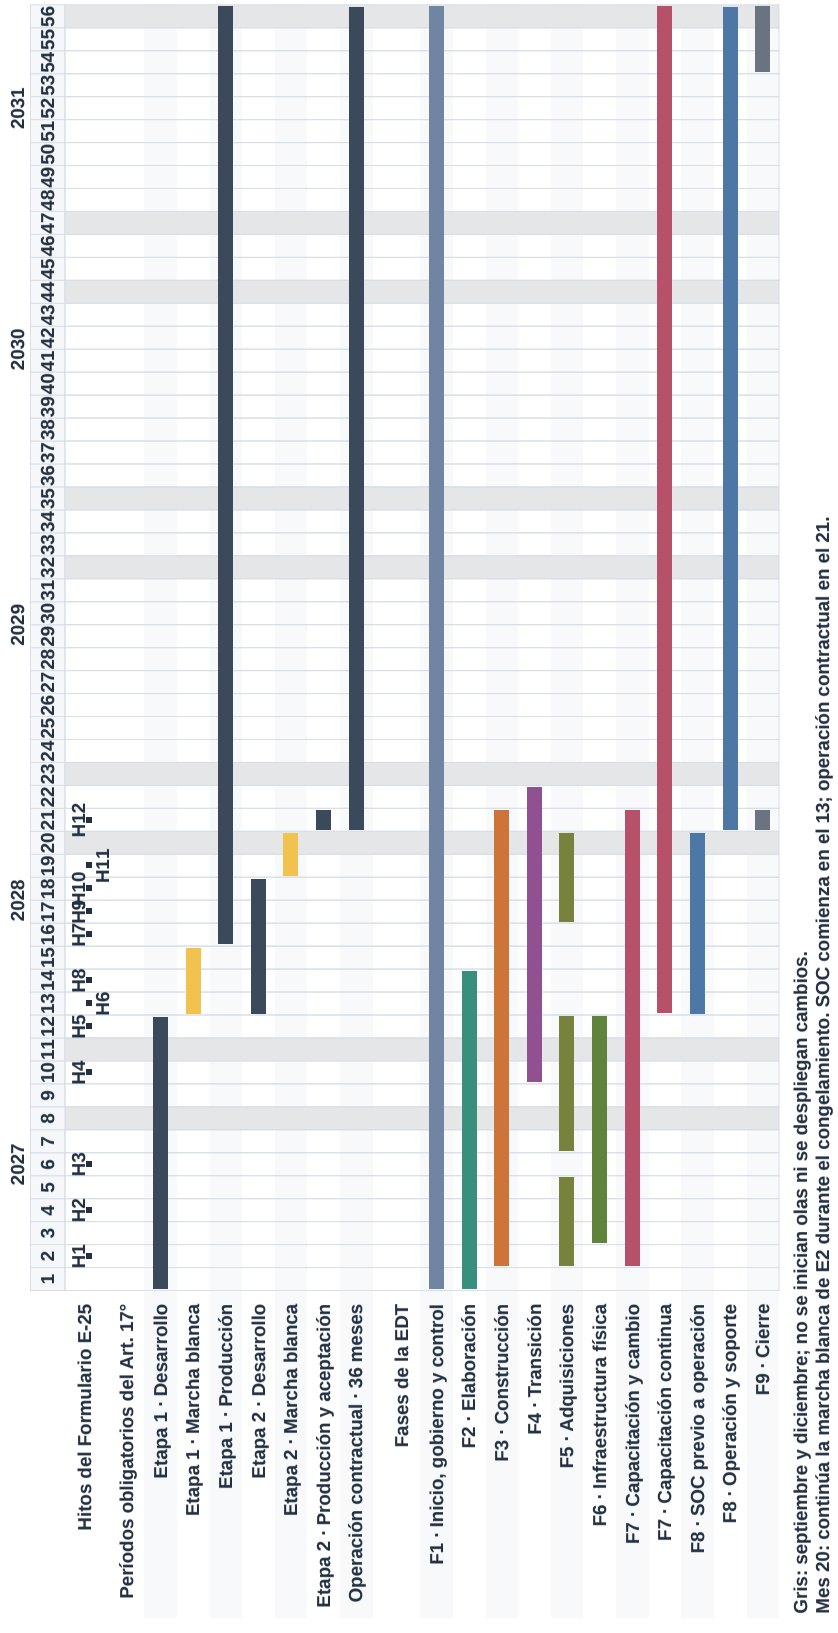


Figura 7.23 Carta Gantt resumida de los 56 meses, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y LafroX (2026d, T-14).

Media firma: Alex Aravena

La carta muestra que los periodos fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) se respetan mes a mes y que ningún paso a producción cae en una columna de congelamiento: el mes 16 es mayo de 2028 y el mes 21, octubre de 2028. Las fases de desarrollo aparecen dos veces, una por etapa, y la capacitación continúa durante la operación por la rotación de la bodega. Las columnas rayadas del mes 20 y del mes 23 confirman lo que anticipa la Tabla 7.6: el cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 ocurre en septiembre y el primer diciembre de operación llega dos meses después de la aceptación final.

Antes de cada paso a producción, el cronograma reserva las pruebas que exige el numeral 20.1 de las Bases Técnicas Transversales (p. 35): carga y estrés a 1,5 veces el peak, resiliencia, recuperación ante desastres con conmutación real, seguridad ofensiva y accesibilidad. Además, programa dos ensayos de migración antes de la migración definitiva. En la Etapa 1 estas pruebas forman la cuenta 3.8, se ejecutan en los meses 9 y 10 y se entregan antes del H5 del mes 12; en la Etapa 2 forman la cuenta 3.9, se ejecutan en los meses 16 y 17 y se entregan antes del H10 del mes 18 (Formulario T-15, Tabla 5.2).

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha

La implantación sigue el principio que impone el caso: nada entra en producción sin haber convivido con la forma actual de trabajar, y nada se despliega como un único evento (sección 13.3, condiciones 1 y 3). Técnicamente, cada capacidad se publica con un despliegue azul-verde y se habilita por sitio y por ola mediante indicadores de funcionalidad (feature flags), conforme al Capítulo 4, apartado 4.2.4.1.2. Así, cada ola puede revertirse sin reinstalar y cada operación tiene un único escritor autorizado (Capítulo 4, sección 4.1.8). Ningún despliegue ocurre en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00, que no admite indisponibilidad, ni en fechas de congelamiento (Caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27).

La Etapa 1 entra en tres olas, en el orden de las dependencias de datos (Capítulo 3, sección 3.4.4). La Tabla 7.7 las presenta.

Tabla 7.7 Olas de implantación de la Etapa 1. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4), y LafroX (2026s, T-18).

Ola	Procesos	Módulos	Avance	Registro oficial
1	Datos maestros y recepción con lote	M1	Por sitio	Recepciones y lotes
2	Inventario con FEFO y preparación nocturna	M2, M5	Por sitio	Stock y preparación

continúa en la página siguiente



Tabla 7.7 — continuación

Ola	Procesos	Módulos	Avance	Registro oficial
3	Preventa, rutas, reparto, devoluciones y rendición	M3, M4, M6, M8, M7	Por zona comercial	Pedidos, entregas y cobros

Una ola avanza a la siguiente cuando cumple su criterio durante cuatro semanas consecutivas a volumen real: sin defectos críticos ni altos, con conciliación diaria sin diferencias no explicadas, con los indicadores de disponibilidad y tiempo de respuesta cumplidos, con los usuarios certificados y con el acta de la Contraparte Técnica (Capítulo 3, sección 3.4.4).
La programación de olas usa fechas reales y no una equivalencia de meses a 13 semanas: todos los grupos deben estar operativos antes del inicio de los 28 días finales de marcha blanca. La sección 6.1 del Formulario T-18 propone Talca/Concepción/plataformas/remanentes en semanas 5/6/7/8 para la ola de reparto, subordinadas a fechas permitidas y al límite F − 28 días. Se permite superposición por dominios sin intervenir simultáneamente el mismo proceso ni doble escritura.



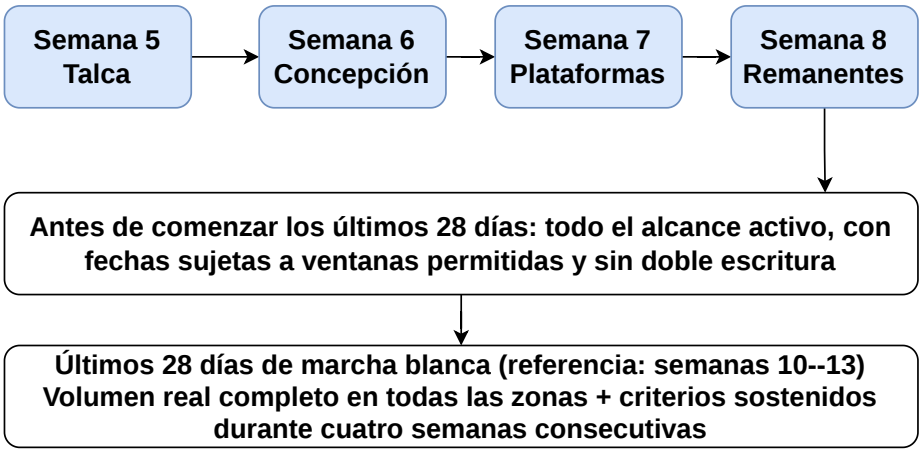


Figura 7.24 Secuencia de olas de la Etapa 1 durante la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4), y LafroX (2026s, T-18).

El avance de cada grupo exige su criterio y acompañamiento. Las cuatro semanas finales requieren todos los grupos y todo el volumen real, no una muestra. E2 habilita todas las cadenas del alcance, portales y costo de servir antes de F − 28 días y, en el ejemplo febrero 2027, antes de septiembre. La carga manual de pedidos mantiene contingencia auxiliar y no acredita intercambio electrónico ni permite excluir una cadena faltante.
La reversión tiene dos niveles, que la Tabla 7.8 distingue.

Tabla 7.8 Niveles de reversión. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4); LafroX (2026m, SD4, apartados 4.2.4.1.2 y 4.1.8); y LafroX (2026s, T-18).

Nivel	Qué hace	Quién decide	Plazo
Técnico	Devuelve el tráfico a la entrega previa por azul-verde/canario o desactiva el indicador de funcionalidad (feature flag)	Líder de Operación / SRE	Objetivo ≤10 minutos, medido en cada ensayo en Preproducción, fuera de la ventana de despacho
Operacional, Etapa 1	Conserva/restaura versión operativa local probada, único escritor y DTE válidos; papel sólo de apoyo	Responsable de operaciones del CLIENTE	Completo antes de las 05:30

continúa en la página siguiente

Tabla 7.8 — continuación

Nivel	Qué hace	Quién decide	Plazo
Operacional, Etapa 2	Desactiva la capacidad de la Etapa 2 que falla, sin tocar la Etapa 1	Responsable de operaciones del CLIENTE	Fuera de la ventana de 05:30 a 07:00

La reversión operacional se dispara con señales observables: pedidos sin sincronizar al inicio de la carga, rutas del día no disponibles o un defecto crítico en la ventana de despacho. El plazo de las 05:30 protege la salida de los 96 camiones y no es el tiempo de recuperación ante desastres. La Figura 7.25 presenta el procedimiento por rol.



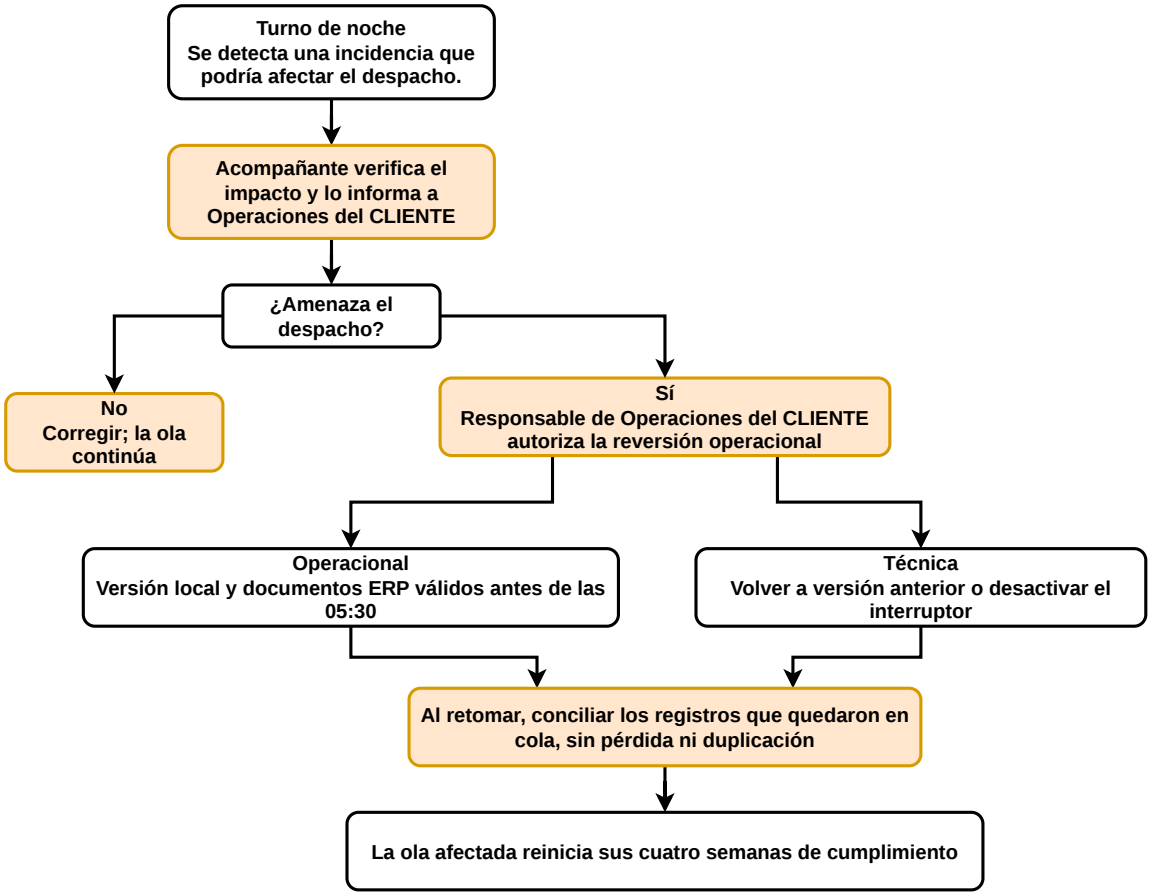


Figura 7.25 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 en la ventana de despacho. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026s, T-18).

La figura muestra que la decisión es del CLIENTE y se toma en el turno de noche, antes de que empiece el despacho. El ensayo debe comprobar que lo capturado permanece en cola y se concilia sin pérdida ni duplicación; no se presume por la descripción. Lo que se pierde es el avance de la ola, que reinicia su período de cuatro semanas (Caso, sección 17.6, punto 4, p. 33). La reversión se ensaya en Preproducción antes de cada corte (paquete 4.1.2), y en ese ensayo se mide el tiempo de cada nivel.

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1

La marcha blanca de la Etapa 1 son tres meses de operación supervisada con datos y usuarios reales, del mes 13 al 15. Convive con la operación vigente: en bodega, con la hoja de picking; en ruta, con la guía en papel; y en Talca, con el WMS de 2013 en solo lectura como respaldo de consulta. Cada día se concilian ambos registros, y toda diferencia se clasifica y explica antes del cierre del día (RT-20.03). La Tabla 7.9 presenta los indicadores que se miden y publican diariamente, con sus umbrales de cierre (RT-20.04).

Tabla 7.9 Indicadores diarios de la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17.3); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-09.01 y RT-10.05); y LafroX (2026k, SD3, Tabla 3.5).

Indicador	Umbral	Condición Art. 17.3
Incidentes críticos y altos abiertos	0	1
Transacciones de la ola registradas en la solución	100 % del volumen real durante las 4 últimas semanas	2
Indisponibilidad en la ventana de 05:30 a 07:00	0 minutos	3
Disponibilidad de la transacción crítica	99,9 % o más	3
Tiempo de respuesta, percentil 95	Línea de preparación hasta 1 s; entrega hasta 2 s; línea de preventa hasta 1,5 s; stock y crédito hasta 2 s	3
Diferencias de conciliación sin explicar	0	4
Usuarios de la ola certificados	100 %	5

Los indicadores reproducen las condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) con umbrales que se pueden medir cada día, de modo que el cierre no depende de un juicio al final del período. El volumen comprometido es la operación real completa de cada proceso y no una muestra; con las cifras del caso (sección 14.1), son cerca de 1.150 recepciones de proveedor y 260.000 líneas de preparación al mes, unos 31.000 pedidos al mes y alrededor de 1.400 entregas por día hábil, o 2.600 si las semanas de cierre coinciden con el peak de septiembre. El detalle por proceso está en el Formulario T-18, Tabla T-18.1.

La sexta condición del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) es el acta de la Contraparte Técnica, que en la Etapa 1 es el H7 del mes 16. Si una condición no se cumple al término del mes 15, la marcha blanca se extiende a costo de LafroX, sin mover las fechas siguientes (BA, art. 17.3, p. 13). La Figura 7.26 resume el ciclo diario de control; las condiciones de cierre se enumeran debajo.




Figura 7.26 Ciclo diario de la marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 17.3, p. 13) y Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-20.04, p. 35).

El ciclo de la Figura 7.26 se repite cada día: se miden los indicadores y se concilian los registros, se comparan los resultados con sus umbrales, se decide entre continuar, corregir o revertir y se publica el resultado diario. Si una incidencia amenaza de inmediato el despacho, se activa el procedimiento de reversión de la Figura 7.25 sin esperar la publicación diaria.
El cierre exige cumplir simultáneamente las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13):

1. Cero incidentes críticos o altos abiertos.
2. Volumen real completo durante las últimas cuatro semanas.
3. Sin indisponibilidad en despacho; disponibilidad y respuesta dentro de umbral.
4. Sin diferencias inexplicadas ni pedidos perdidos o duplicados.
5. 100 % de usuarios capacitados y certificados.
6. Acta de aceptación de la Contraparte Técnica (H7).

Ninguna de estas condiciones compensa a otra.
La capacitación se hace en el puesto y en la ruta con las cuatro modalidades del artículo 90.2 de las Bases Administrativas (p. 45). Cada perfil se certifica antes del cierre, porque el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige que el personal del CLIENTE esté «capacitado y certificado conforme al plan de capacitación aprobado», y los usuarios administradores y el equipo técnico del CLIENTE se certifican además conforme al artículo 90.4 de las Bases Administrativas (p. 45). Los perfiles operativos, tomados del Capítulo 3, Anexo 3.I, son 120 preparadores, con un tutor por turno y un aprendizaje en el puesto de dos horas como máximo; 62 preventistas, en su propia ruta; 84 integrantes de la tripulación propia; y cerca de 160 conductores de transportistas, que se incorporan en el andén al asignarse a una ruta.
La adopción se mide por perfil y por ola, y si una ola no alcanza la meta, no avanza y se extiende el acompañamiento. La respuesta es distinta según el grupo: el personal con veinte o treinta años en la compañía recibe acompañamiento individual y reconocimiento formal de su conocimiento, y el personal rotativo de preparación cuenta con un tutor por turno (Formulario T-18, secciones 2.7 y 2.8).

Alex

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia

La marcha blanca de la Etapa 2 dura los meses 19 y 20 y convive con la Etapa 1 en producción. La regla central del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) es que exista una única fuente de verdad para los datos compartidos: la Etapa 2 lee y extiende los pedidos, clientes, guías y entregas de la Etapa 1, sin copiarlos ni digitarlos de nuevo, y ningún despliegue de la Etapa 2 modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1 ni ocurre en la ventana de despacho. Esta marcha blanca dura unas 8,7 semanas (2 × 52 / 12). Como el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige volumen real en las cuatro últimas, todas las cadenas certificadas, los portales y el costo de servir deben quedar habilitados en las primeras 4,7 semanas. Con el inicio supuesto de febrero de 2027, el mes 19 es agosto y el mes 20 es septiembre de 2028, de modo que toda habilitación ocurre en agosto, antes del congelamiento del 1 al 25 de septiembre. Las semanas de cierre se miden con el volumen del peak de Fiestas Patrias, cerca de 2.600 entregas diarias, en el primer septiembre de la Etapa 1 en producción. Durante el congelamiento se aplica continuidad previamente autorizada por el CLIENTE; la sección 6.4 del Formulario T-18 no presume que un cambio de configuración esté exento de las prohibiciones. La capacidad para ese peak se demuestra antes del H11 con la prueba de carga a 1,5 veces el peak, con ambas etapas activas (paquete 3.9.3; Formulario T-18, sección 3.1).

A los indicadores de la Tabla 7.9 se suman los propios del alcance de la Etapa 2: los pedidos de las cadenas certificadas recibidos por vía electrónica, los avisos de despacho dentro de dos minutos, las entregas con costo de servir calculado y la ausencia de degradación de los indicadores de la Etapa 1 (Formulario T-18, sección 3.3). La Figura 7.27 muestra cómo fluyen los datos entre ambas etapas.



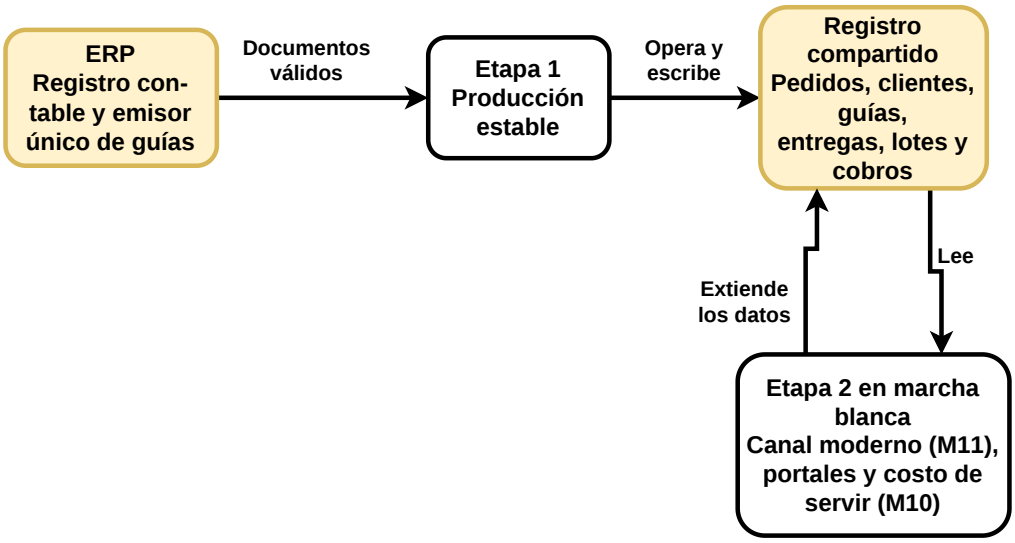


Figura 7.27 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026m, SD4, arquitectura lógica).

Se mantiene una sola fuente de verdad y un escritor autorizado por dato. La Etapa 2 no duplica datos ni modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1. Lee el registro único y lo extiende con sus propios datos, de modo que no existe una doble digitación que conciliar. El ERP se mantiene como registro contable y único emisor de la guía de despacho para ambas etapas. El paso a producción del mes 21 es la aceptación final de la implementación (H12) y el inicio de la Operación con ambos alcances (BA, art. 17.2, punto 4, p. 13).

7.3.6 Estabilización y transferencia

Después de cada paso a producción hay una estabilización de cuatro semanas por ola, con atención reforzada y sin costo adicional (RT-20.06). La dotación se deriva de la operación del caso, como muestra la Tabla 7.10.

Tabla 7.10 Estabilización por ola. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026k, SD3, sec. 3.4.4).

Frente	Personas	Cálculo
Bodega, turno de noche	2	1 por centro de distribución
Plataformas de cross-docking	3	1 por plataforma
Calle	7	158 rutas diarias / 24 días de lunes a sábado ≈ 6,6

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Frente	Personas	Cálculo
Coordinación	1	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Las siete personas de calle permiten acompañar cada una de las 158 rutas diarias (96 camiones y 62 preventistas) al menos una vez en las cuatro semanas. Si la ola cubre una sola zona, la dotación se reduce en proporción a sus rutas, y la dotación decrece según la curva de adopción, como exige el RT-20.05.

La operación se transfiere al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE antes del mes 21, con procedimientos documentados y ensayados y con la base de conocimiento. Sigue una mentoría de seis meses (paquetes 7.1.4 y 8.5.2; RT-22.07). Quedan como servicio permanente de LafroX durante los 36 meses los que el Capítulo 3, sección 3.4.5, le asigna: el centro de operaciones, la mesa de servicio, la gestión de incidentes, la continuidad, la seguridad y el mantenimiento.

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos

El Caso logística exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado de aceptación (cap. 18, p. 34). La Tabla 7.11 agrupa los dieciséis resultados por momento; el detalle por resultado está en el Anexo 7.C.

Tabla 7.11 Momento de los resultados de aceptación del caso. Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 18); LafroX (2026j, Anexo 3.J); y LafroX (2026t, Anexo 7.C).

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15)	R18-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 y 16	12	H7 (mes 16)
Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20)	R18-11 y 13	2	H12 (mes 21)
Tramos durante el contrato	R18-04: OTIF de 90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y 95 % en el mes 32	1	Revisión mensual en comité

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Provisional y final	R18-12: provisional en la marcha blanca de la Etapa 1 y final tras 12 meses de operación	1	H7 y operación

Doce de los dieciséis resultados se aceptan en la marcha blanca de la Etapa 1. Otros dos también se verifican allí: R18-04, con su tramo del mes 15, y R18-12, de forma provisional. Son catorce resultados con verificaciones en ese período, conforme al Anexo 7.C y al Formulario T-18. Por eso el volumen real y la certificación de usuarios de ese período son la principal concentración de riesgo de aceptación del proyecto, y por eso el plan dedica a esa marcha blanca su mayor dotación de acompañamiento.
Las innovaciones también tienen su momento en el cronograma (BA, art. 29, punto 4, p. 19), como resume la Tabla 7.12.

Tabla 7.12 Innovaciones en el cronograma. Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026t, Anexo 7.D).

Innovación	Paquetes de la EDT	Meses	Hito
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	3.10.1.1 a 3.10.1.4	7 a 15	H4, H5 y marcha blanca E1
2 · Reproducción de incidentes de terreno	3.10.2.1 a 3.10.2.4; 8.3.1	2 a 15; 21 a 56	H4 y marcha blanca E1
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	3.10.3.1 a 3.10.3.4; 8.3.2	3 a 15; operación	H4, H5 y marcha blanca E1
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	5.4.3; 8.3.3; 8.3.4	17 a 20; 21 a 23; 24 a 56	Hito mensual
5 · Hoja de negocio del almacenero	3.10.4.1 a 3.10.4.4; 8.3.5; 8.3.6	13 a 27	H9, H10 y H12

Tres innovaciones se validan en la marcha blanca de la Etapa 1. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2, y la innovación 4 empieza a liquidar recién desde el mes 24, después



de una línea base y tres liquidaciones en sombra. Así, ninguna innovación agrega trabajo a la cadena casi crítica de la Etapa 1 después del H4.

7.3.8 Base de planificación y recursos

El Formulario T-15, sección 4, estima las horas de los 222 paquetes con tres valores (optimista, más probable y pesimista) por clase de tamaño, y separa las curvas mensuales de implementación, soporte puente de la Etapa 1 y Operación. La cobertura del centro de operaciones, la mesa de servicio y el SOC sigue las posiciones dimensionadas en el Capítulo 4, Anexo 4-W.7. Con esa base, el total programado es de 217.543 HH (205.135 HH de paquetes y restauraciones previas a Operación, 9.336 HH de soporte puente de la Etapa 1 y 3.072 HH de reserva del frente de construcción y de calidad) y el máximo mensual es de 69 personas equivalentes en el mes 15, cuando coinciden la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2. La sección 5 del mismo formulario conserva la red y el PERT del escenario nominal anterior a esta reestimación. Esos resultados requieren recálculo con asignaciones nominales, feriados y esfuerzo vigente antes de confirmar la ruta crítica o las probabilidades; la curva de 69 personas expresa demanda, no disponibilidad acreditada. Las capacidades protegidas de la Etapa 1 no se prestan al desarrollo de la Etapa 2.

La gestión del plan sigue el Capítulo 6: la sección 6.1 fija el PMBOK adaptado, el tablero Kanban, el valor ganado y el control de cambios, y la sección 6.2 fija el proceso RUP iterativo con DevSecOps. La Construcción avanza en las iteraciones definidas en la sección 6.2, con revisión semanal de avance y bloqueos y una demostración de incremento verificable al cierre de cada iteración; una demostración no implica un paso a producción. El Jefe de Proyecto registra la capacidad y los criterios de terminado antes de seleccionar el trabajo de cada iteración, y los cambios se aprueban según la sección 6.1.4.

El cronograma rector usa meses contractuales 1 a 56. El Anexo 7.A traduce esos meses a fechas con un inicio supuesto en febrero de 2027; cuando el CLIENTE confirme la fecha de inicio (consulta V-12), se recalculan los meses calendario y los congelamientos antes de aprobar cada corte. La revisión de parámetros de la Innovación 3 (paquete 8.3.2) se ejecuta en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56.

El Formulario T-18, sección 6, define la cobertura por ola de M9, M12 y M10, propone Talca como sitio piloto, ordena las olas por sitio, por rutas y por certificación de cadenas, declara la estabilización de la Etapa 2 y el soporte de la Etapa 1 en los meses 16 a 20, y fija un objetivo de 40 minutos para el ensayo de reversión. El corte exige un ensayo con volumen real y la contingencia tributaria; el respaldo manual por sí solo no sustituye ese ensayo para los 96 despachos. El WMS queda en modo de solo lectura conforme al supuesto S-14.

El Anexo 7.F traslada al Capítulo 8 los supuestos, disparadores, responsables y paquetes de la planificación. La regla de precio es única en la oferta: el precio acordado al capturar el pedido (Capítulo 2, Anexo 2.2, S-09; RF-03.11 y RF-03.12). La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) está dimensionada en el Anexo 4-I, Tabla A.10, y el Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33. El máximo de cuatro mensajes por línea incluye una holgura porque la retención consumida no se libera. La proporción de líneas con más de una retención se mide con AL-

STOCK-01 antes del H4 (R8-02), y la carga y el drenaje se verifican en 3.8.4 y 3.9.3, sin sumar la coordinación al drenaje tras un corte. El RPO ≤ 15 min se cumple con fibra, LTE y Starlink. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes de reponer alguno es el riesgo residual declarado en SD4 4.3.2.4, gestionado en SD8 (LafroX, 2026r) con R8-05 y verificado con AL-DR-01. Sus medidas son alarmas de retraso a 5 y 15 min, reposición del enlace, preemisión de guías y NAS WORM. La continuidad crítica y la capacidad nominal se verifican conforme al Anexo 8.E, con responsable y hito límite.



Referencias

Las fuentes citadas en este subdocumento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026d). *Formulario T-14: Estructura de desglose del trabajo*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026e). *Formulario T-15: Cronograma y asignación de recursos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026j). *Subdocumento 3: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026k). *Subdocumento 3: Especificación de requerimientos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026m). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026o). *Subdocumento 6: Metodología de desarrollo*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026r). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026s). *Formulario T-18: Implantación de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026t). *Subdocumento 7: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla siguiente prepara la declaración de uso de inteligencia artificial exigida por la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación. Los niveles consignados deben confirmarse con el historial real de elaboración. La última columna indica comprobaciones pendientes: el responsable incorporará su nombre, cargo y resultado una vez que las realice. La versión validada se consolidará en el Formulario A-6.



Tabla 7.13 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración a partir de registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code	Borrador de síntesis de las Bases y los capítulos de la oferta	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
7.1 EDT	Claude Code; Codex	Redacción, conteos y ajuste de las figuras de la EDT	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]
7.2 Plan de trabajo	Claude Code; Codex	Secuenciamiento, dependencias y frentes de trabajo	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]
7.3 Cronograma e implantación	Claude Code; Codex	Calendario, Gantt, CPM/PERT y esquemas de implantación	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.A	Claude Code; Codex	Conversión de meses contractuales a fechas y congelamientos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.B	Claude Code; Codex	Red de dependencias y revisiones contractuales	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.C	Claude Code	Relación de resultados de aceptación con paquetes e hitos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

continúa en la página siguiente



Tabla 7.13 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 7.D	Claude Code; Codex	Ubicación de las innovaciones en la EDT y el calendario	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.E	Claude Code	Trazabilidad de módulos e interfaces a la EDT	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 7.F	Claude Code; Codex	Supuestos de planificación y dependencias para riesgos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Formulario T-14	Claude Code; Codex	Diccionario de la EDT, ventanas y cartas Gantt	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]
Formulario T-15	Claude Code; Codex	HH, nivelación, actividades de 8 a 80 horas, PERT y frentes	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]
Formulario T-18	Claude Code; Codex	Plan de olas, marcha blanca, estabilización y reversión	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]

