LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 07 — Plan de Trabajo, EDT, Cronograma e Implantación

Subdocumento 07 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

7 Introducción al Plan de trabajo 6

7.1 EDT 6

7.1.1 Criterio de descomposición 7

7.1.2 Estructura general 9

7.1.2.1 Fase 1. Inicio 9

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración 13

7.1.2.3 Fase 3. Construcción 15

7.1.2.4 Fase 4. Transición 24

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones 25

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios 27

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio 30

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte 32

7.1.2.9 Fase 9. Cierre 36

7.1.3 Cobertura del alcance 37

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables 40

7.2 Plan de trabajo 41

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias 41

7.2.2 Estimación 44

7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización 46

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20 49

7.3 Cronograma e implantación 49

7.3.1 Ruta crítica y holguras 49

7.3.2 Carta Gantt y calendario 55

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha 102

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1 106

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia 109

7.3.6 Estabilización y transferencia 110

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos 111

7.3.8 Base de planificación y recursos 113

Referencias 115

Declaración de uso de IA 115



Media firma: Alex Aravena

Lista de tablas

Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes por fase. 8
Tabla 7.2 Cobertura del alcance en la EDT. 37
Tabla 7.3 Paquetes por responsable. 40
Tabla 7.4 Horas hombre programadas por etapa — 45
Tabla 7.5 Hitos del Formulario E-25 en el cronograma. 55
Tabla 7.6 Meses contractuales según la fecha de inicio. 56
Tabla 7.7 Olas de implantación de la Etapa 1. 103
Tabla 7.8 Niveles de reversión. 105
Tabla 7.9 Indicadores diarios de la marcha blanca. 107
Tabla 7.10 Estabilización por ola. 110
Tabla 7.11 Momento de los resultados de aceptación del caso. 111
Tabla 7.12 Innovaciones en el cronograma. 112
Tabla 7.13 Declaración de uso de IA. 116



Lista de figuras

Figura 7.1 Vista del primer nivel de la EDT: raíz del proyecto y sus nueve fases. 8

Figura 7.2 Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. 10

Figura 7.3 Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual. 12

Figura 7.4 Fase 2 — Elaboración, primera parte: arquitectura, seguridad y sala técnica, cuentas 2.1 a 2.3. 14

Figura 7.5 Fase 2 — Elaboración, segunda parte: validación, continuidad y experiencia de usuario, cuentas 2.4 a 2.6. 15

Figura 7.6 Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3. 16

Figura 7.7 Fase 3 — Construcción, segunda parte: módulos de la Etapa 1, cuenta 3.4. 18

Figura 7.8 Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8. 19

Figura 7.9 Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11. 21

Figura 7.10 Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10. 23

Figura 7.11 Fase 4 — Transición: plan de implantación y marchas blancas de las etapas 1 y 2, cuentas 4.1 a 4.3. 25

Figura 7.12 Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4. 26

Figura 7.13 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3. 28

Figura 7.14 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, segunda parte: seguridad física, equipamiento de campo y configuración, cuentas 6.4 a 6.6. 30

Figura 7.15 Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3. 31

Figura 7.16 Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2. 33

Figura 7.17 Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5. 35

Figura 7.18 Fase 9 — Cierre: cierre de implementación y salida al término del contrato, cuentas 9.1 y 9.2. 37




Figura 7.19 Ubicación en la EDT de las innovaciones y la seguridad, la calidad, la migración y la implantación. 39
Figura 7.20 Red de precedencias entre cuentas de control e hitos. 43
Figura 7.21 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. 47
Figura 7.22 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 50
Figura 7.23 Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. 52
Figura 7.24 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. 57
Figura 7.25 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. 64
Figura 7.26 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. 69
Figura 7.27 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. 74
Figura 7.28 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. 81
Figura 7.29 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. 87
Figura 7.30 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. 92
Figura 7.31 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. 97
Figura 7.32 Despliegue de la ola 3 y período final de validación de la marcha blanca de la Etapa 1. 104
Figura 7.33 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 en la ventana de despacho. 106
Figura 7.34 Ciclo diario de la marcha blanca. 108
Figura 7.35 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. 110



Introducción al Plan de trabajo

Este capítulo presenta cómo LafroX ejecutará el proyecto de Distribuidora Puelche dentro del cronograma contractual obligatorio de 56 meses (BA, art. 17, pp. 12–13): qué trabajo se hace, en qué orden, con qué esfuerzo y cómo la solución entra en operación sin detener la venta, la bodega ni el reparto.

La sección 7.1 descompone el 100 % del alcance en una estructura de descomposición del trabajo (EDT) con paquetes estimables y asignables. La sección 7.2 secuencia ese trabajo y lo organiza en frentes paralelos, con especial atención a los meses 13 a 15 y 19 a 20, en que dos esfuerzos coexisten. La sección 7.3 presenta la ruta crítica, la carta Gantt con los hitos del Formulario E-25 y el plan de implantación y de marcha blanca de cada etapa.

El capítulo se apoya en otros tres capítulos de la oferta: el Capítulo 3 (Subdocumento 3) fija el alcance de cada etapa y los criterios de olas y estabilización; el Capítulo 4 (Subdocumento 4) define los módulos M1 a M12 y las interfaces que la EDT construye; y el Capítulo 6 (Subdocumento 6) establece el proceso de desarrollo cuyas fases organizan la EDT y la gestión del proyecto que la controla. El detalle va en tres formularios y un archivo de anexos: el Formulario T-14 contiene la EDT completa, su diccionario y la carta Gantt; el Formulario T-15, el método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo; el Formulario T-18, la implantación y la puesta en marcha controlada, con una propuesta de calendario, dotación y decisiones en su sección 6; y los Anexos 7.A a 7.F, los listados de apoyo y la preparación de riesgos.

En este capítulo, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

7.1 EDT

La EDT es la base común del plan: el cronograma, la estimación y la asignación de responsables se construyen sobre sus paquetes, y su diccionario fija qué se entrega y cómo se acepta cada uno. Esta sección explica cómo se descompuso el trabajo, cómo queda la estructura, cómo cubre el alcance y cómo se asignan los responsables.



Media firma: Alex Aravena

7.1.1 Criterio de descomposición

La EDT de Puelche se organiza en nueve fases. Las cuatro primeras son las fases del proceso de desarrollo del Capítulo 6 (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y se recorren una vez por cada etapa del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El primer recorrido produce la Etapa 1, con la trazabilidad de recepción, la bodega, la cadena de frío, la preventa, las rutas, el reparto y la rendición, y termina con el paso a producción del mes 16. El segundo produce la Etapa 2, con el canal moderno, los portales y el costo de servir, y termina con el paso a producción del mes 21.

Las otras cinco fases agrupan el trabajo que no es desarrollo de software, pero sin el cual la solución no entra en operación: adquisiciones y contrataciones; infraestructura física y sitios; capacitación y gestión del cambio; operación y soporte durante 36 meses; y cierre.

La descomposición sigue la regla del 100 %: la suma del trabajo de los niveles inferiores reproduce el trabajo del nivel superior, sin omitir ni agregar alcance (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 161). El segundo nivel son 49 cuentas de control, puntos de gestión donde se integran el alcance, el cronograma y el esfuerzo para medir el desempeño. El nivel inferior son 227 paquetes de trabajo, cada uno con un entregable verificable, un criterio de aceptación y un único responsable (PMI, 2017, pp. 161–162). En la cuenta de las innovaciones, cada innovación agrupa sus paquetes en un cuarto nivel.

El último nivel de la EDT es el paquete de trabajo, con su entregable, su responsable y su criterio de aceptación. Fuera de la EDT, cada paquete se descompone en actividades que cumplen la regla del 8/80, entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo, y la regla del período de reporte: ninguna actividad dura más de una quincena, el período con que informa el Comité de Proyecto (PMI, 2017, pp. 183–185). Los paquetes de producto se dividen con una plantilla por clase; por ejemplo, un módulo de 960 HH se divide en 12 actividades de 80 HH, desde el análisis de sus requerimientos hasta su entrega en QA. Los 168 paquetes con entregable se programan con fecha, personas y predecesoras; sus actividades se detallan hasta el H2 y, después, por planificación gradual antes de cada fase, cuando el equipo conoce el trabajo (PMI, 2017, p. 185). Así el cronograma no fija hoy el día de una actividad que ocurrirá en 2028, y cada fase se planifica como las iteraciones del proceso RUP del Capítulo 6. El Formulario T-15, figura de planificación gradual de la sección 6, muestra los puntos de replanificación (antes del H2, el H4, el H8 y el H9). Los 59 paquetes de esfuerzo continuo, como la cobertura del NOC, las reuniones periódicas o la mentoría posterior al H12, no se descomponen en actividades distintas: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La lista de actividades y las reglas de programación están en el Formulario T-15, sección 6.

Los paquetes de la fase de Operación son paquetes de esfuerzo continuo. Cada uno cubre un servicio durante los 36 meses y se controla con entregables periódicos, como los informes mensuales de servicio, los informes de pruebas y las actualizaciones anuales, que funcionan como sus puntos de verificación.

La Tabla 7.1 muestra el tamaño de cada fase y los hitos que produce.



Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes por fase. Fuente: (Formulario T-14) y el Formulario E-25.

Fase	CC	PT	Etapa	Hitos
1 Inicio	9	35	E1 y E2	H1, H8
2 Elaboración	6	20	E1 y E2	H2, H8
3 Construcción	11	79	E1 y E2	H3, H4, H5, H9, H10
4 Transición	3	11	E1 y E2	H6, H7, H11, H12
5 Adquisiciones y contrataciones	4	15	E1 y E2	Habilita H3
6 Infraestructura física y sitios	6	24	E1	Habilita H3 y H6
7 Capacitación y gestión del cambio	3	13	E1, E2 y Operación	Condición de H7 y H12
8 Operación y soporte (36 meses)	5	26	Operación	Hito mensual
9 Cierre	2	4	Meses 21 y 56	Después de H12
Total	**49**	**227**		

La construcción concentra el 35 % de los paquetes (79 de 227), porque contiene los quince desarrollos de módulos, las integraciones, la migración, las pruebas de ambas etapas y las innovaciones. Las fases 5 a 7, que no producen software, suman 52 paquetes (23 %). Ese peso muestra que, en Puelche, la compra y la instalación del equipamiento de cinco sitios, los acuerdos con diez transportistas y con el sindicato y la capacitación de una operación que no puede detenerse son trabajo planificado y controlado, no supuestos.

La Figura 7.1 resume el primer nivel de la EDT: la raíz del proyecto y sus nueve fases.

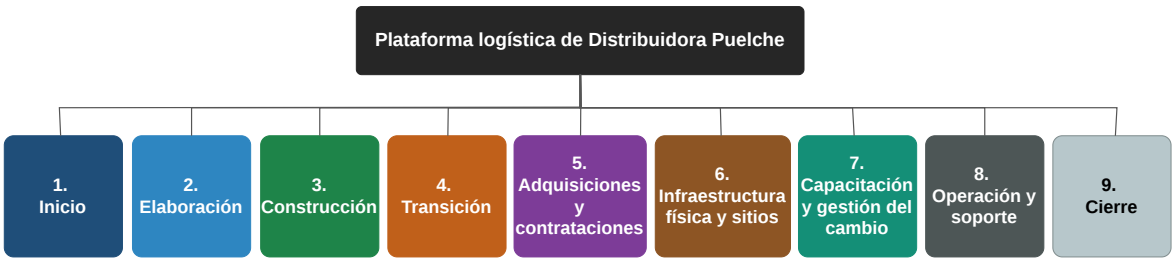


Figura 7.1 Vista del primer nivel de la EDT: raíz del proyecto y sus nueve fases. Fuente: (Formulario T-14).

Alex

Las fases de desarrollo (1 a 4) se recorren una vez por etapa; las fases 5 a 7 las habilitan en paralelo, y las fases 8 y 9 cubren la operación y el cierre. La figura muestra la estructura, no la secuencia temporal: el número de una fase no indica cuándo ocurre; sus fechas están en la carta Gantt de la sección 7.3.2.

7.1.2 Estructura general

Las figuras siguientes desglosan las cuentas de control y los paquetes por fase. Cada figura está precedida por su descripción y puede continuar en varias láminas. La fase 3 se presenta en cinco figuras: base técnica, módulos de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8, cuentas 3.9 a 3.11 y detalle de los paquetes de innovación de la cuenta 3.10.

7.1.2.1 Fase 1. Inicio

La fase de Inicio define el proyecto, fija su alcance y planificación y establece cómo se gobierna y controla. Sus cuentas 1.1 a 1.5 abarcan el acta, la línea base, la planificación, los interesados y la calidad.

La Figura 7.2 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

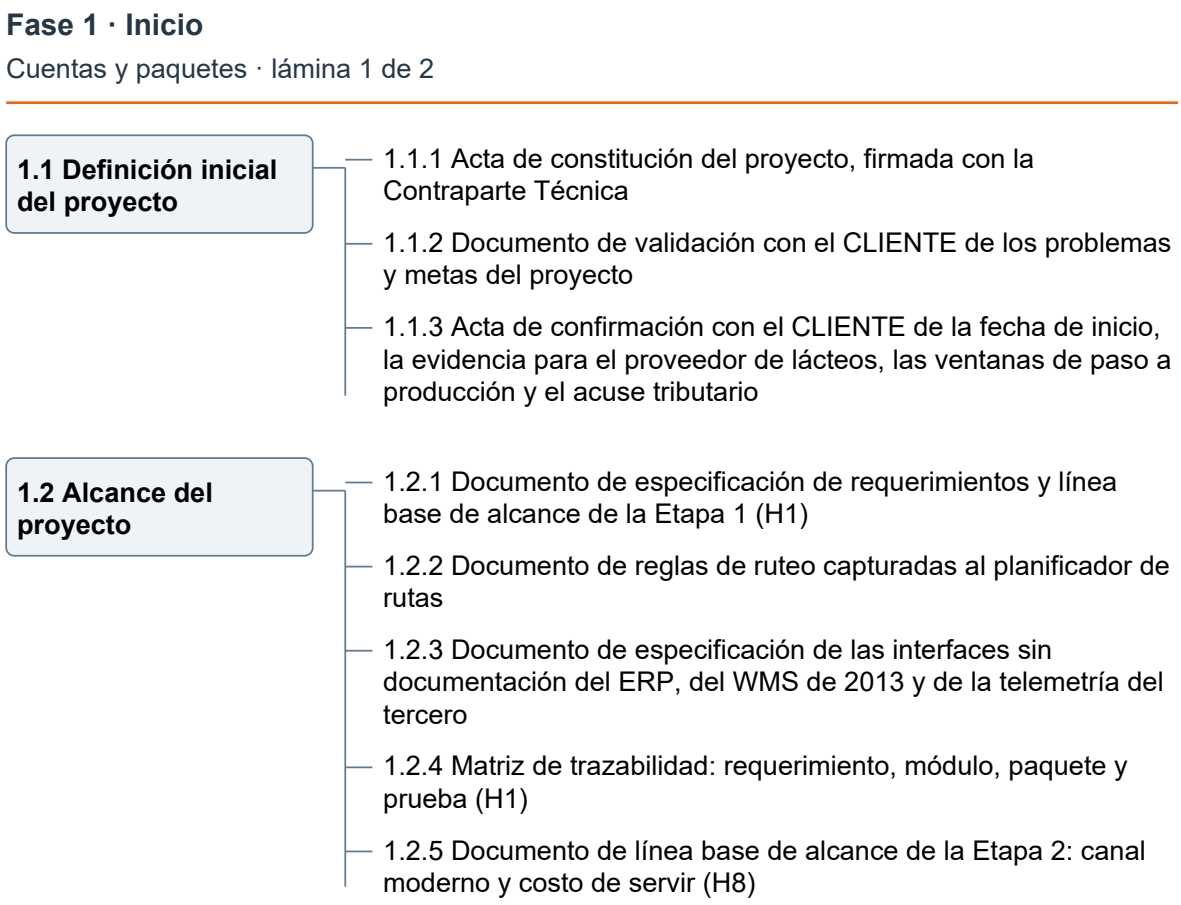


Figura 7.2 Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. Fuente: (Formulario T-14).

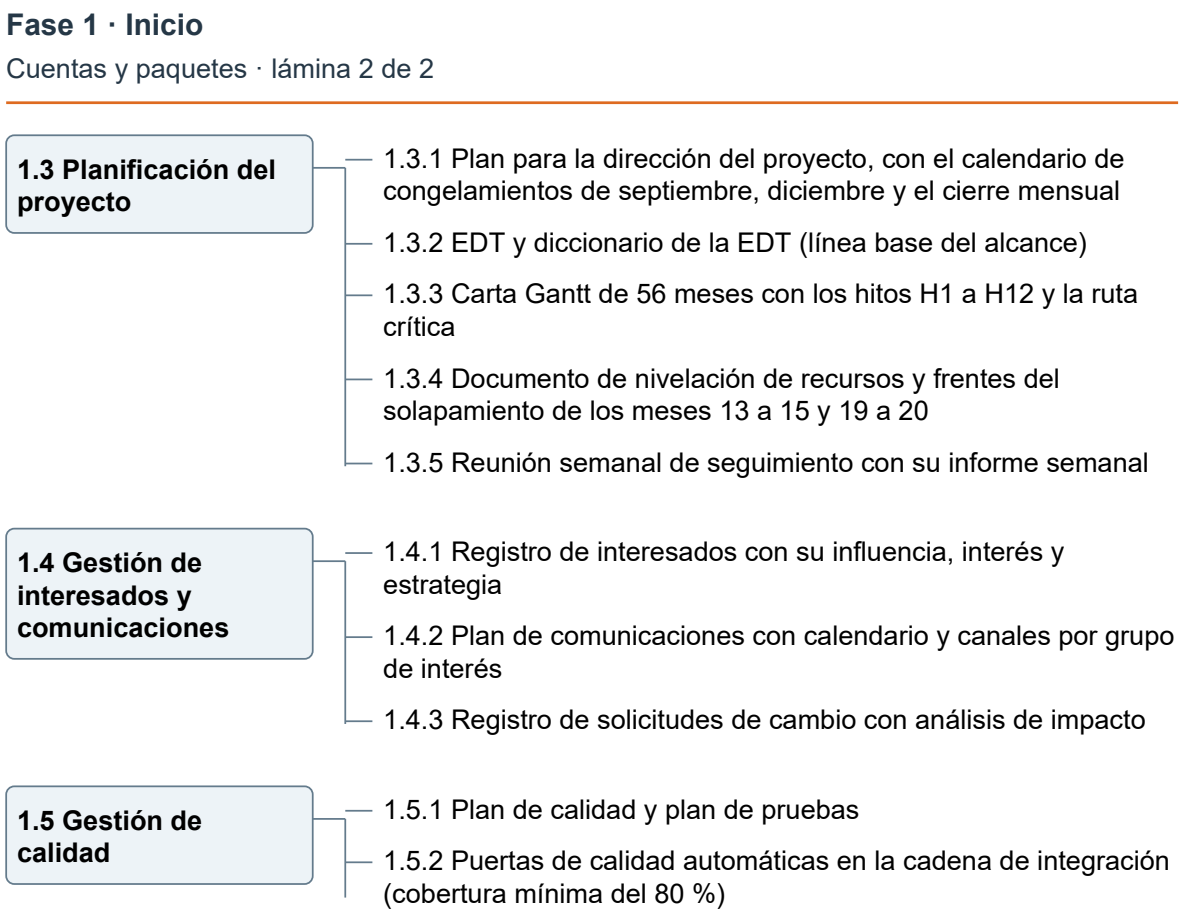


Figura 7.2 (continuación 2 de 2). Fase 1 — Inicio, primera parte: cuentas 1.1 a 1.5. Fuente: (Formulario T-14).

La primera figura contiene los paquetes 1.2.2 y 1.2.3, que documentan las reglas de ruteo capturadas al planificador y las interfaces sin documentación del sistema de gestión. La segunda figura completa Inicio con las cuentas 1.6 a 1.9: gestión de riesgos, reversibilidad, gobierno y control, y cumplimiento normativo y contractual. Incluye los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), el informe de valor ganado y el tablero (RT-19.06 a RT-19.09).

La Figura 7.3 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

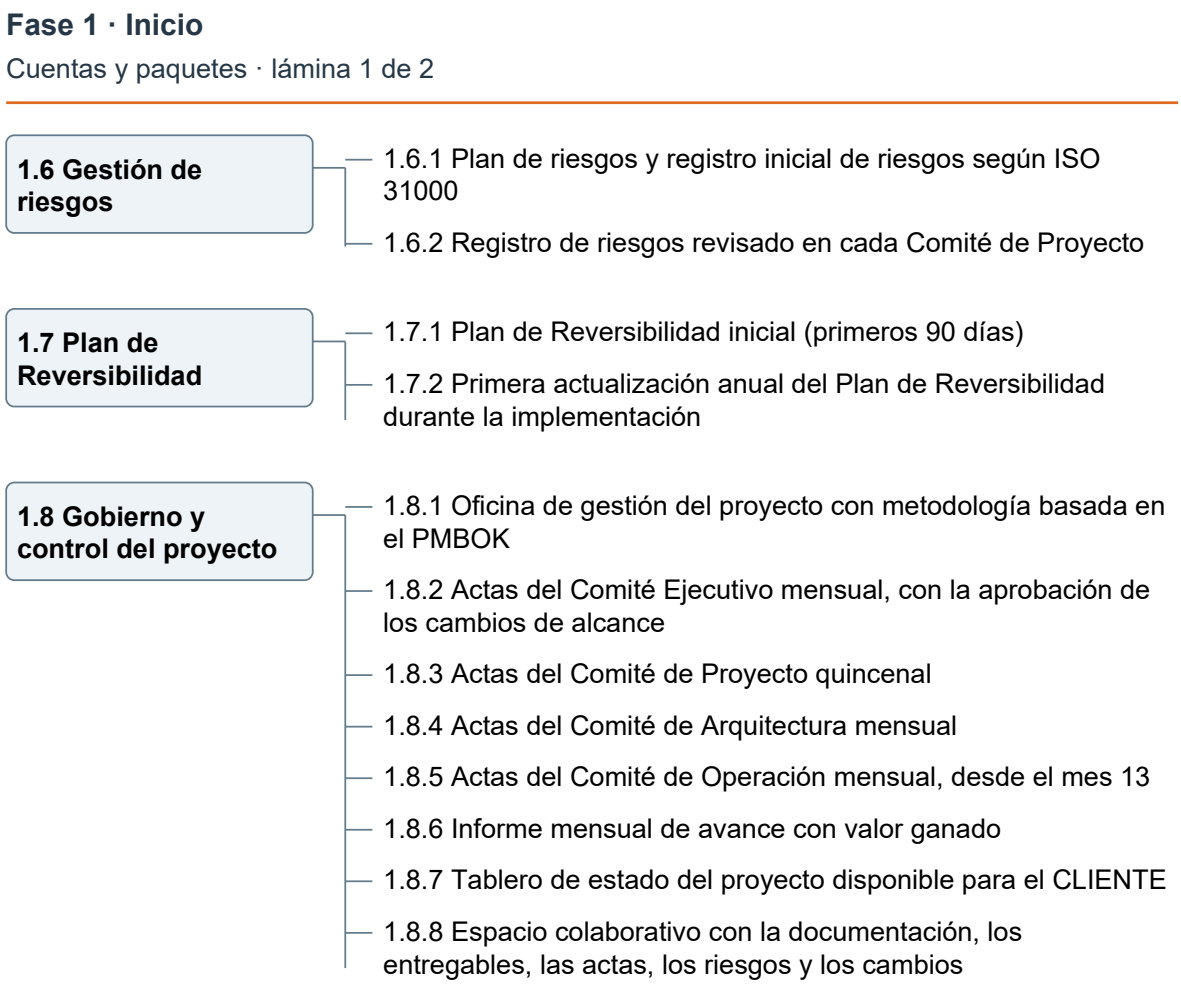


Figura 7.3 Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

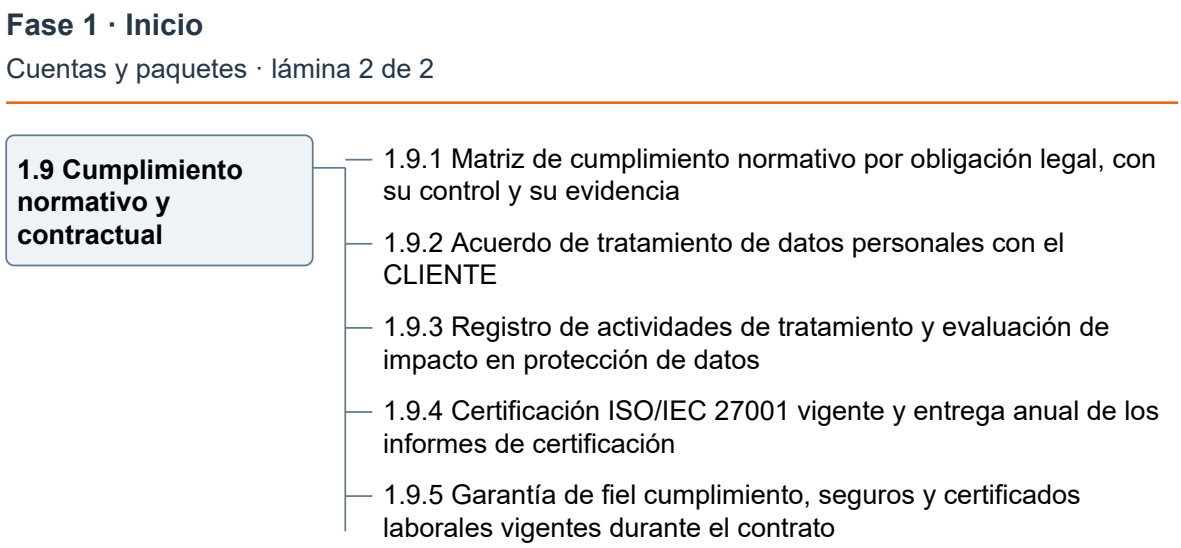


Figura 7.3 (continuación 2 de 2). Fase 1 — Inicio, segunda parte: cuentas 1.6 a 1.9, desde riesgos hasta cumplimiento contractual. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Estas cuentas completan Inicio: identifican los riesgos y la reversibilidad, establecen el gobierno y control del proyecto y cierran con el cumplimiento normativo y contractual.

7.1.2.2 Fase 2. Elaboración

Elaboración diseña la solución antes de programar: arquitectura lógica y física, datos trazables por lote, seguridad, sala técnica de Talca, continuidad y experiencia de usuario. La aprobación de arquitectura, seguridad y modelo de datos corresponde al H2 del mes 4. La primera figura muestra las cuentas 2.1 a 2.3.

La Figura 7.4 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

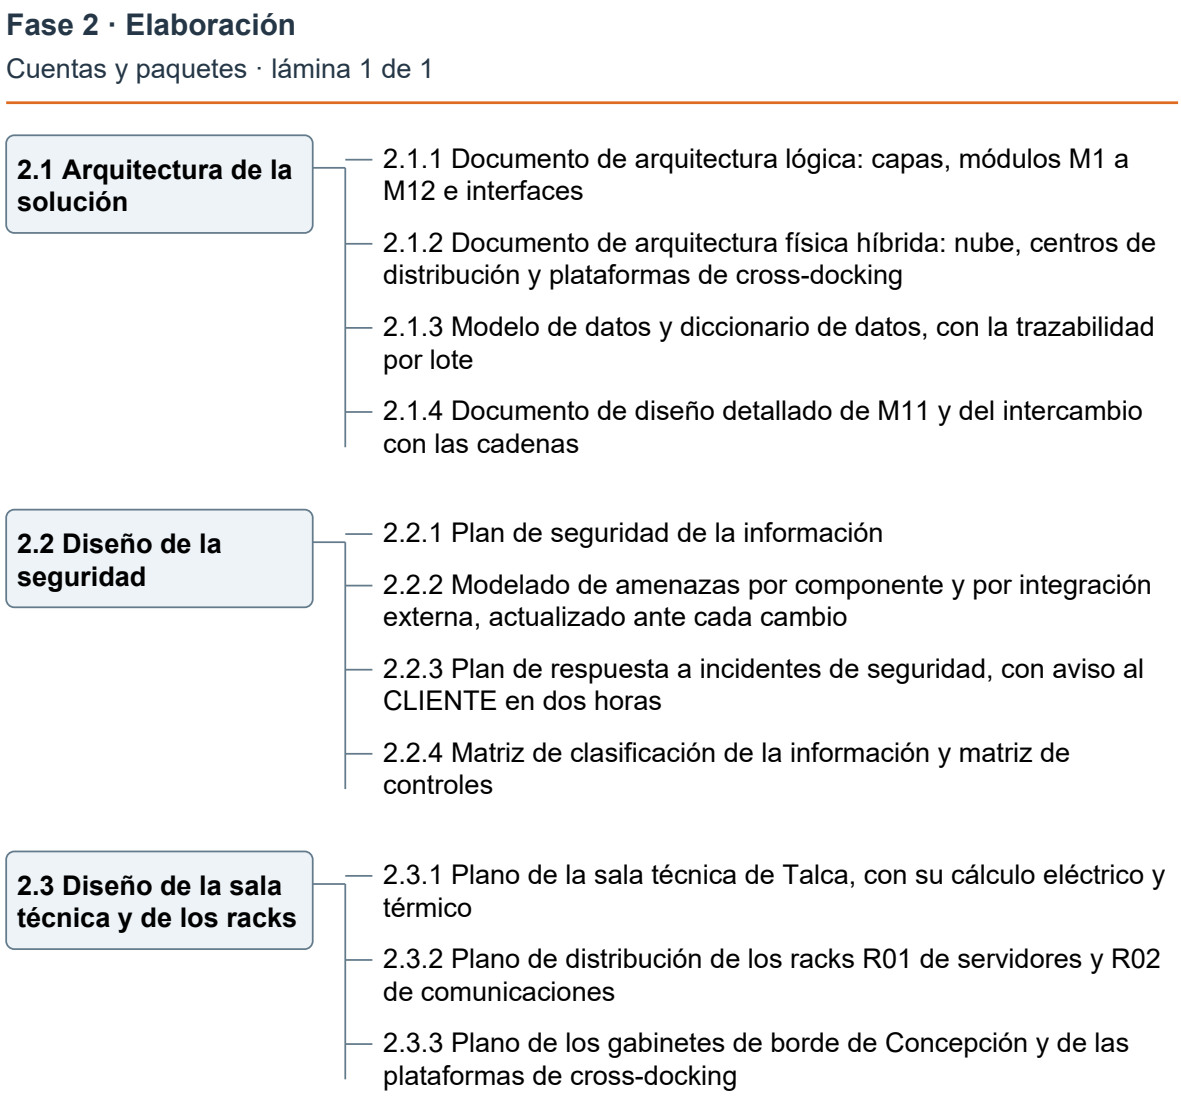


Figura 7.4 Fase 2 — Elaboración, primera parte: arquitectura, seguridad y sala técnica, cuentas 2.1 a 2.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La continuación cubre la validación de diseños, continuidad del negocio y experiencia de usuario (cuentas 2.4 a 2.6), incluidos los procedimientos manuales y la recuperación ante desastres.

La Figura 7.5 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

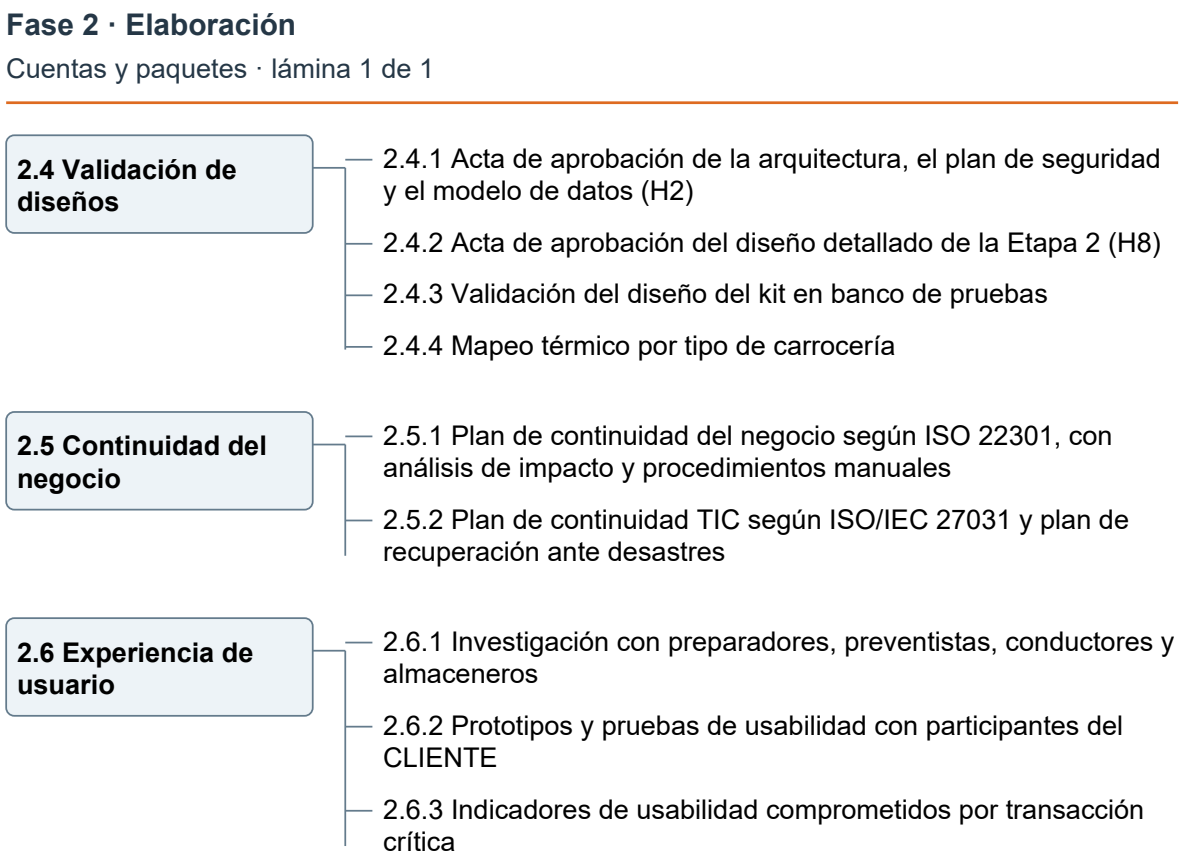


Figura 7.5 Fase 2 — Elaboración, segunda parte: validación, continuidad y experiencia de usuario, cuentas 2.4 a 2.6. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Con estas cuentas, los diseños quedan sometidos a validación y se completan los planes de continuidad y experiencia de usuario que orientan la fase de Construcción.

7.1.2.3 Fase 3. Construcción

Construcción produce los ambientes y servicios de nube, la base compartida, los módulos de ambas etapas, las integraciones, la migración, las pruebas, las innovaciones y la documentación. La primera figura reúne los ambientes de desarrollo, los servicios de nube y la base compartida (cuentas 3.1 a 3.3).

La Figura 7.6 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

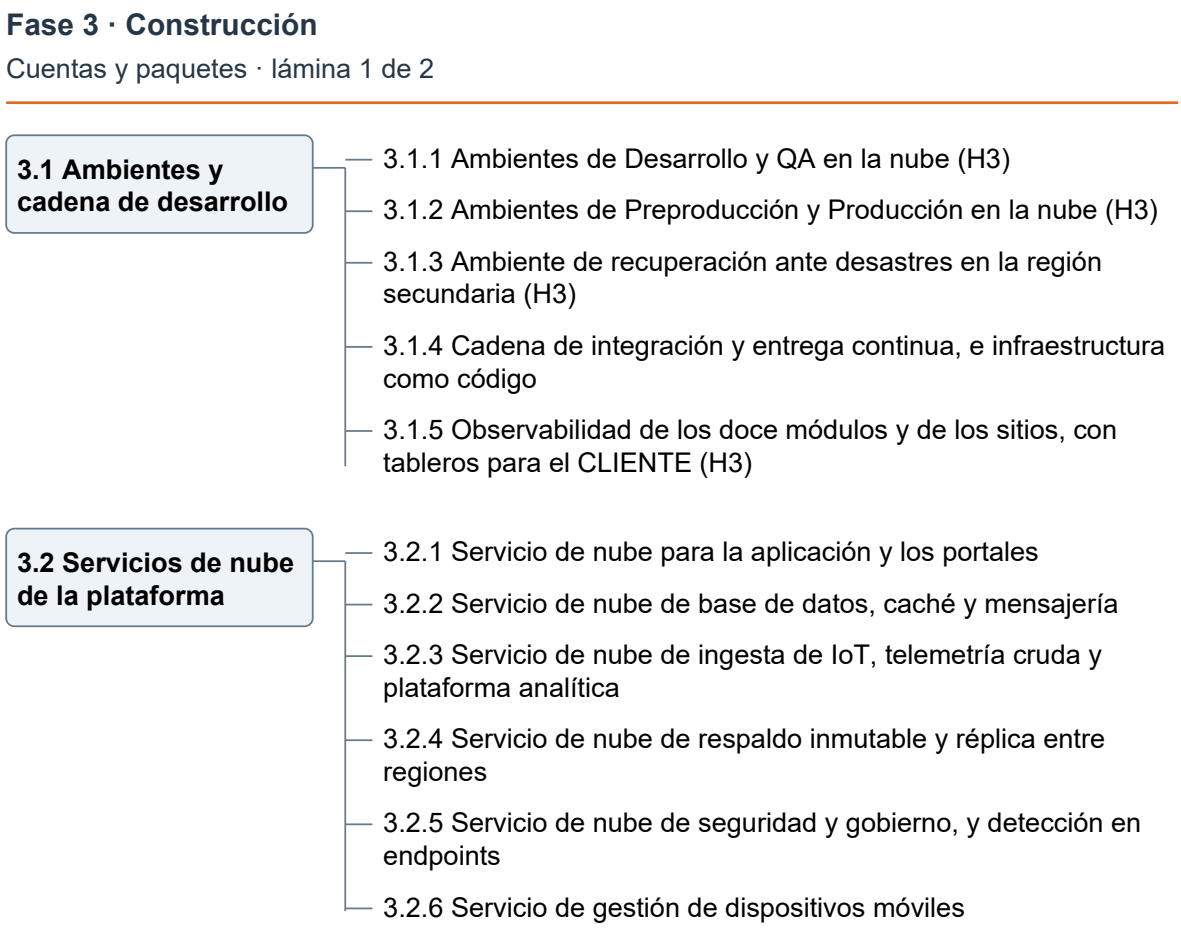


Figura 7.6 Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

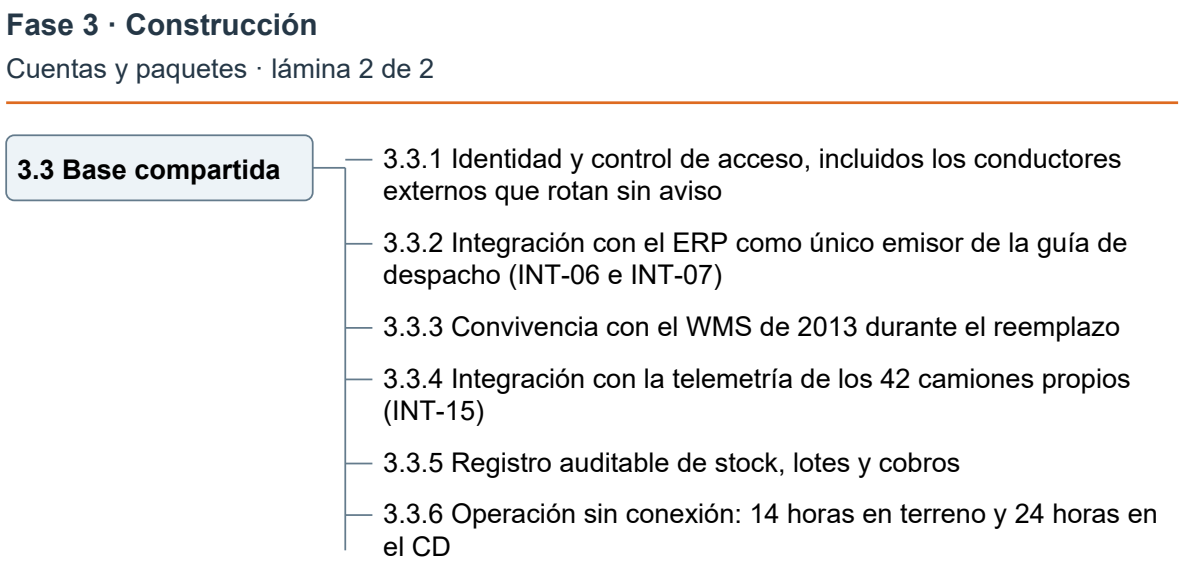


Figura 7.6 (continuación 2 de 2). Fase 3 — Construcción, primera parte: ambientes, servicios de nube y base compartida, cuentas 3.1 a 3.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La segunda figura desglosa los módulos de la Etapa 1 (cuenta 3.4), con los componentes de recepción, inventario, preparación de pedidos, cadena de frío, aplicaciones y operación de tiendas.

La Figura 7.7 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

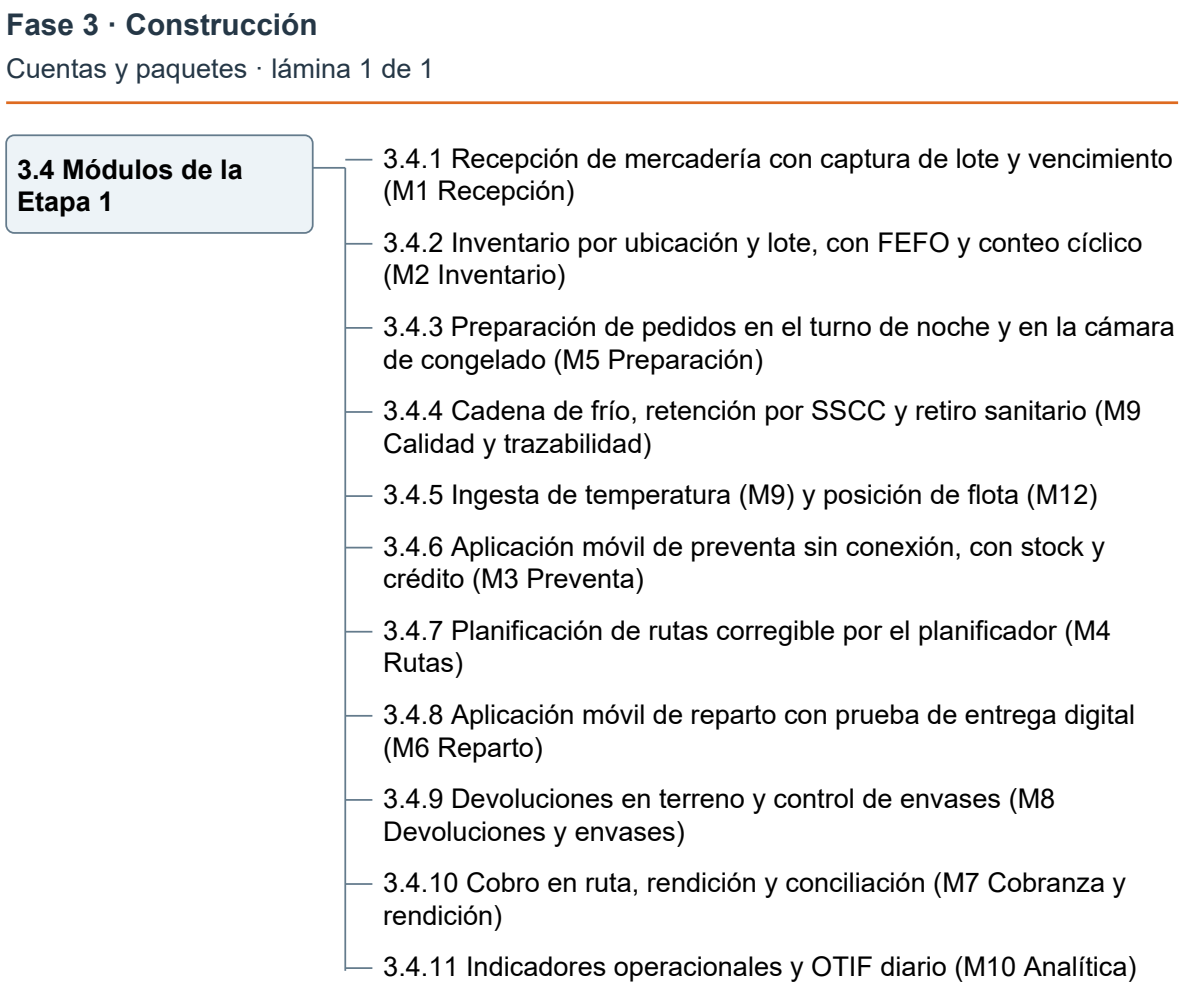


Figura 7.7 Fase 3 — Construcción, segunda parte: módulos de la Etapa 1, cuenta 3.4. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La tercera figura presenta los módulos de la Etapa 2, las integraciones externas, la migración y las pruebas de la Etapa 1 (cuentas 3.5 a 3.8). La integración con el ERP conserva su función de emisor único de la guía de despacho.

La Figura 7.8 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

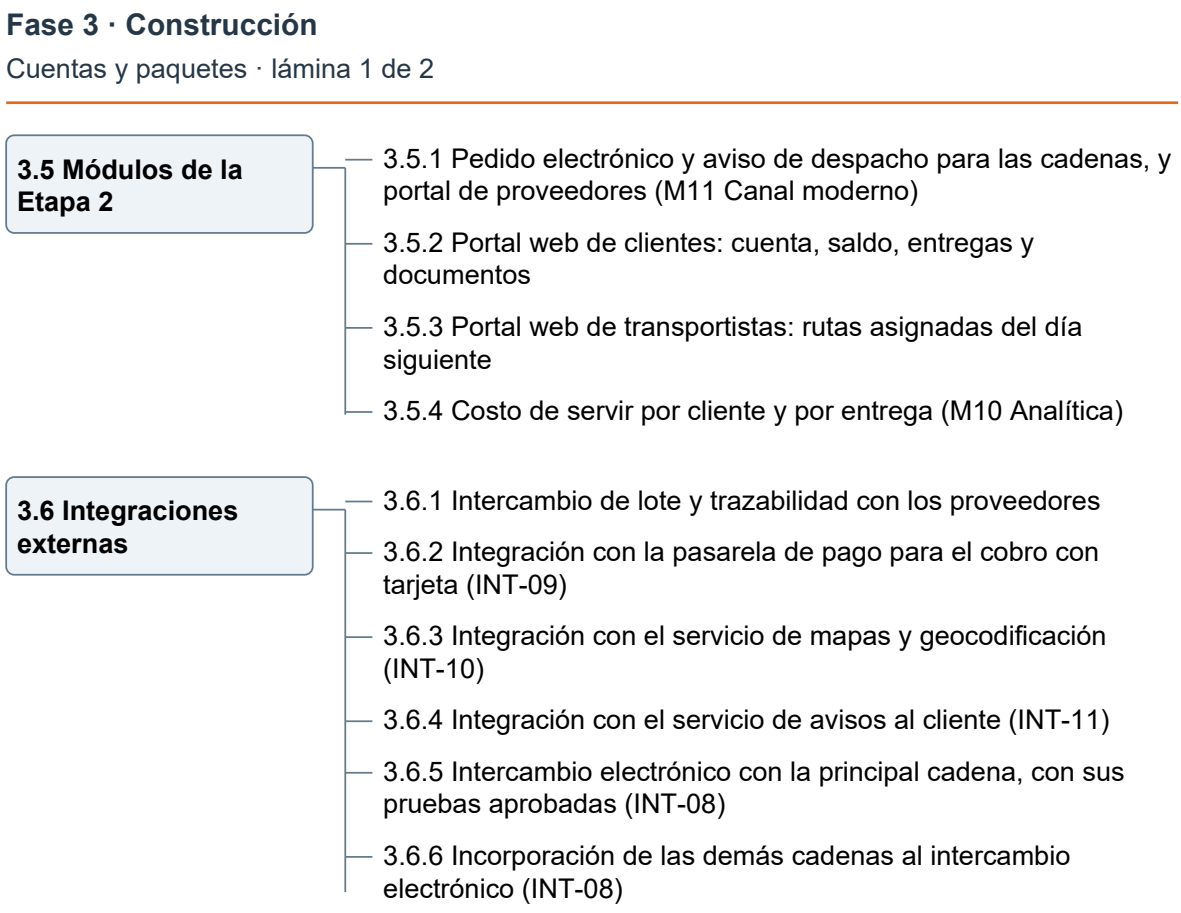


Figura 7.8 Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

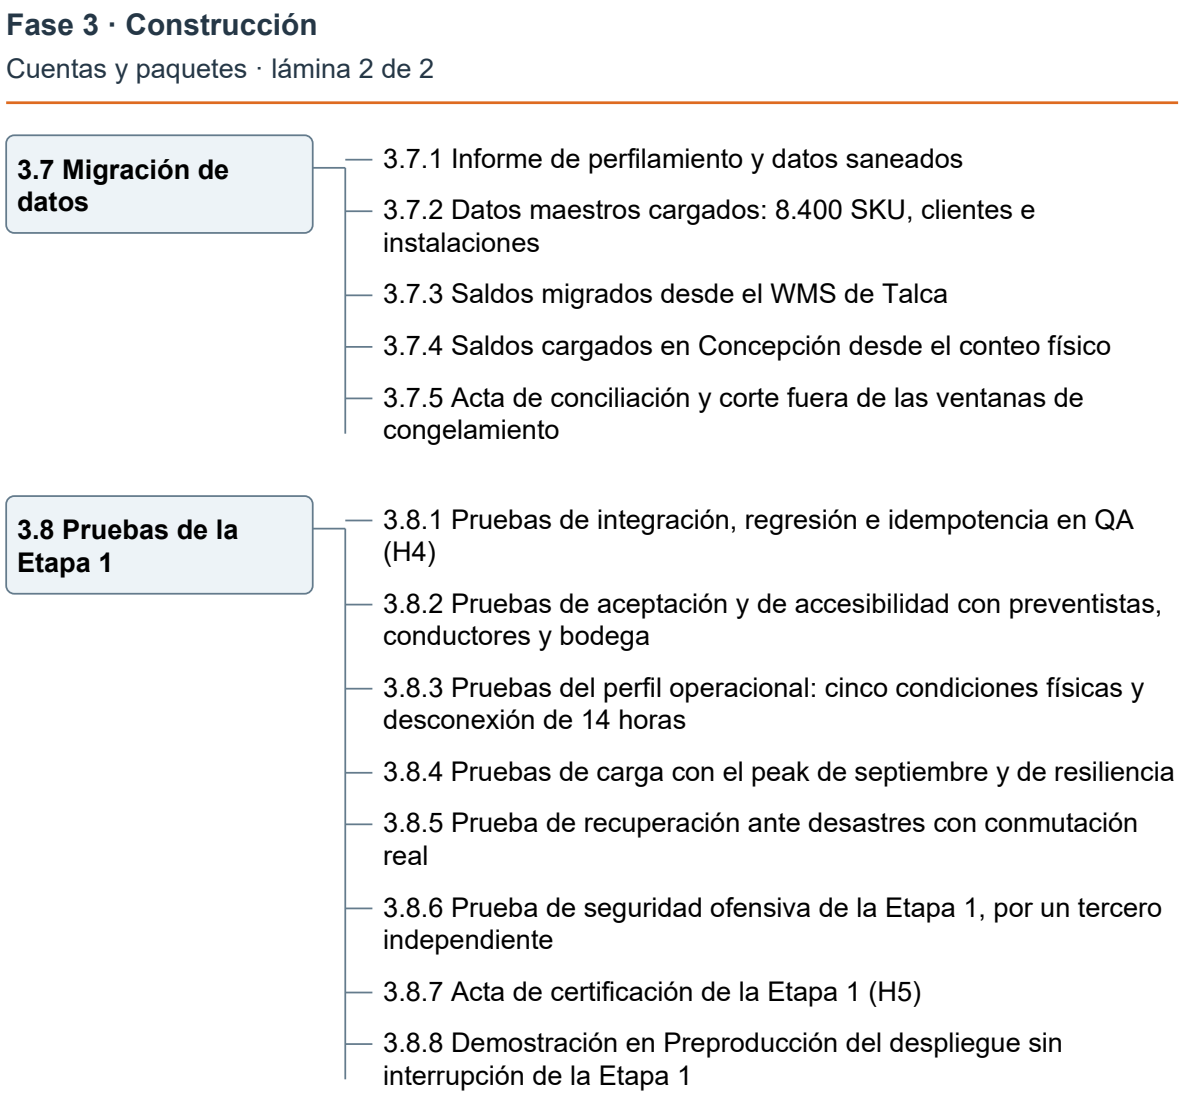


Figura 7.8 (continuación 2 de 2). Fase 3 — Construcción, tercera parte: módulos de la Etapa 2, integraciones, migración y pruebas de la Etapa 1, cuentas 3.5 a 3.8. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La cuarta figura reúne las pruebas de la Etapa 2, las innovaciones y la documentación técnica (cuentas 3.9 a 3.11).

La Figura 7.9 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

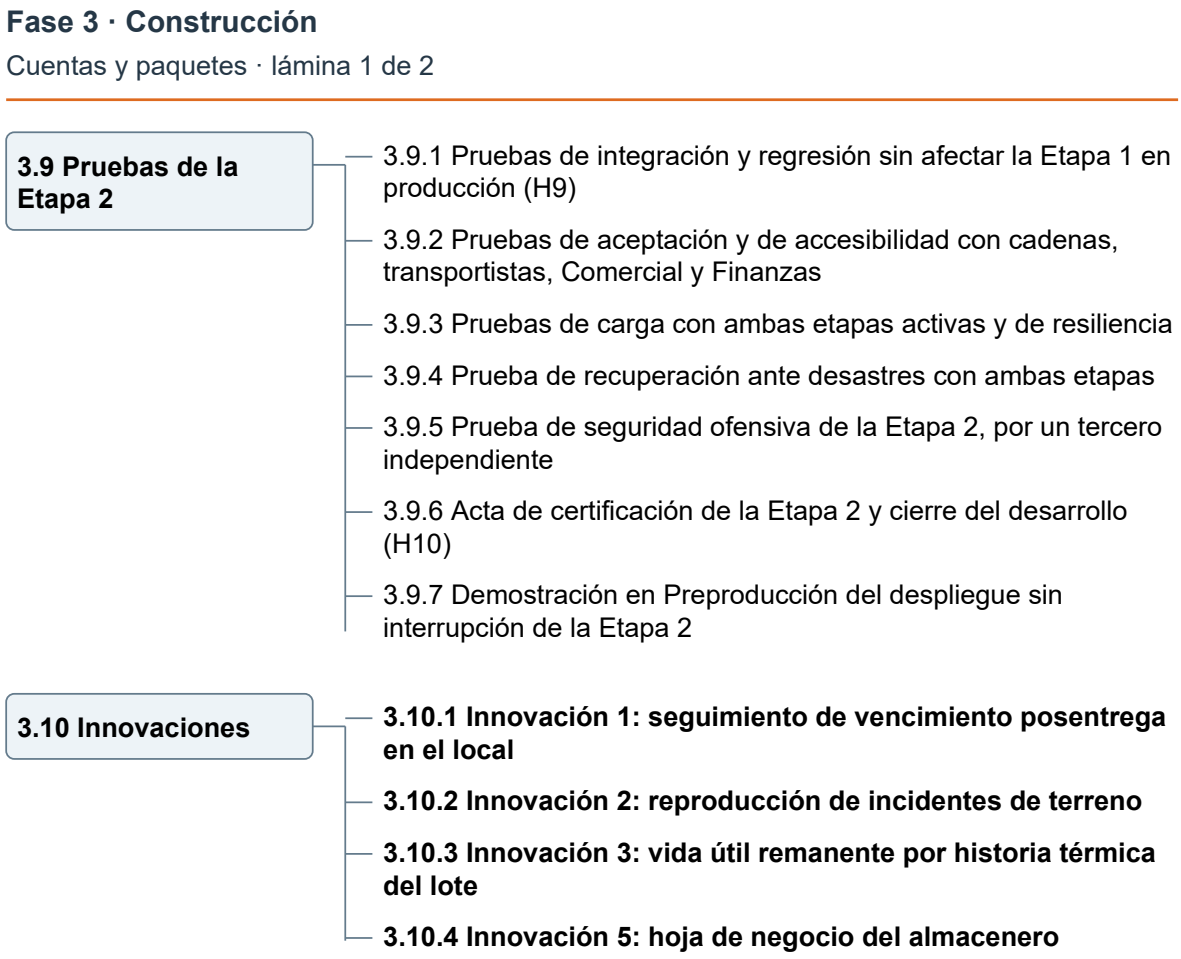


Figura 7.9 Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

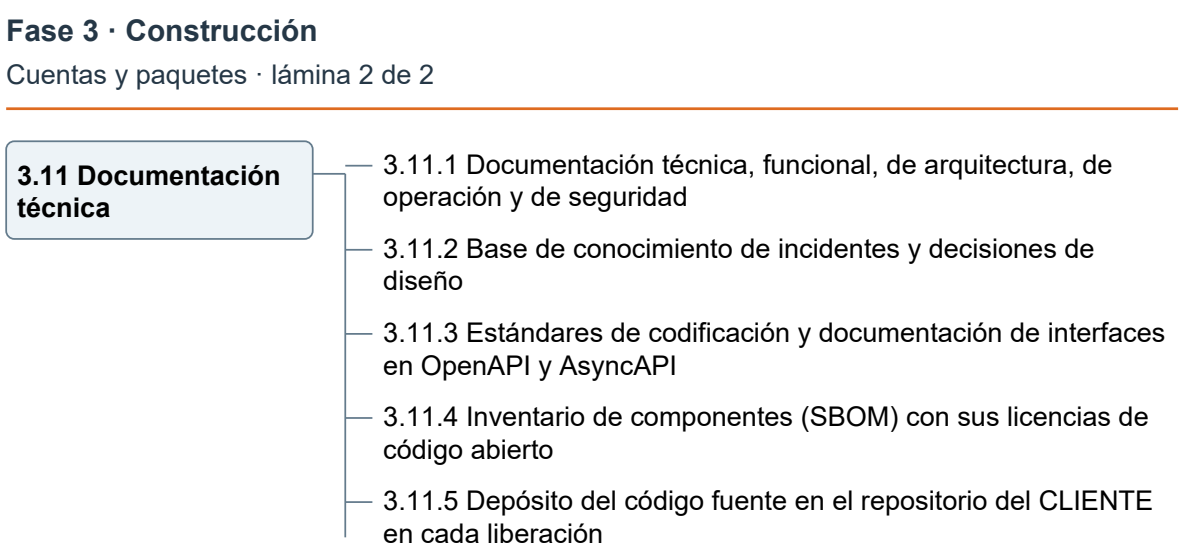


Figura 7.9 (continuación 2 de 2). Fase 3 — Construcción, cuarta parte: pruebas de la Etapa 2, innovaciones y documentación técnica, cuentas 3.9 a 3.11. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La quinta figura detalla los paquetes de innovación agrupados en la cuenta 3.10: seguimiento de vencimientos, reproducción de incidentes, vida útil remanente y hoja de negocio del almacenero.


La Figura 7.10 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Fase 3 · Construcción

Cuentas y paquetes · lámina 1 de 2

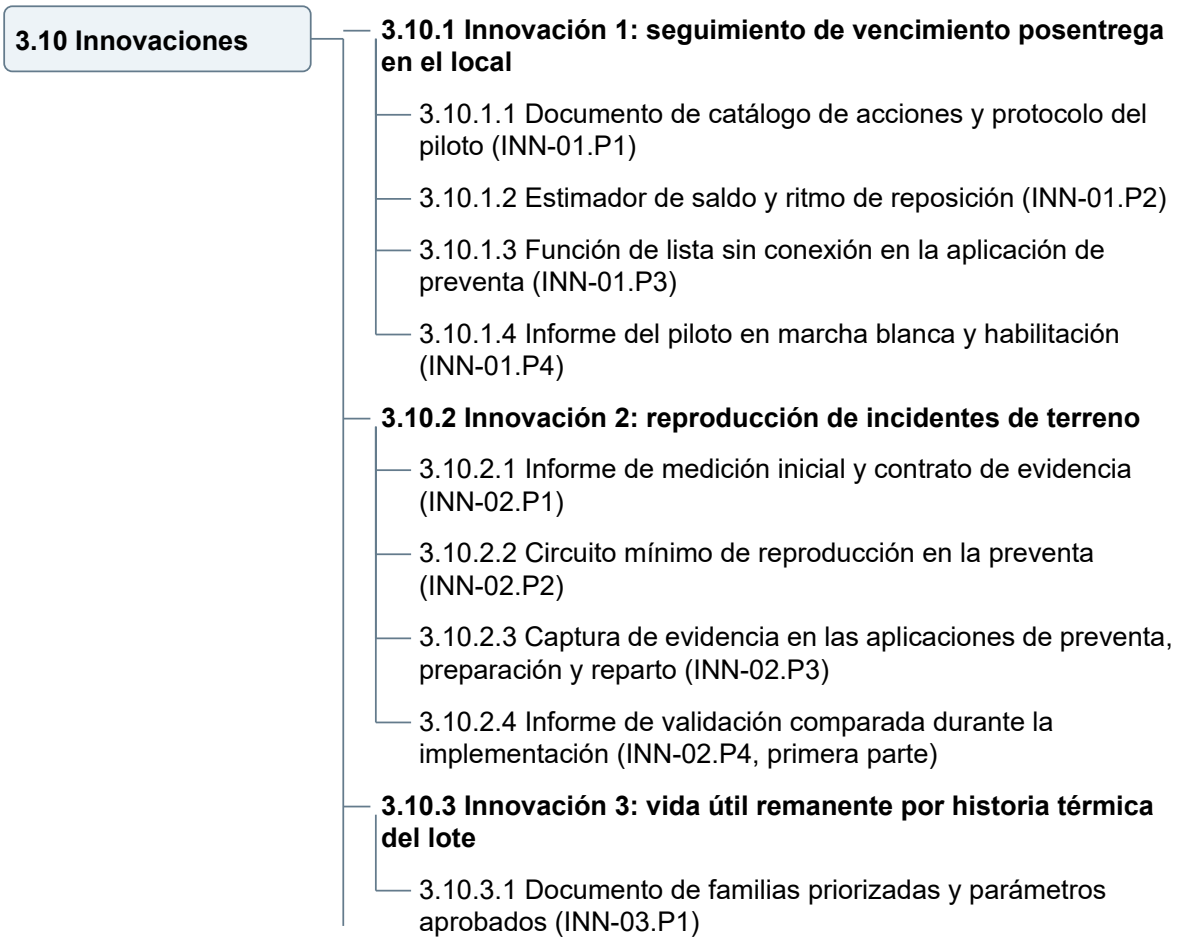

Jerarquía: fase → cuenta de control → paquete o agrupación de innovación.

Figura 7.10 Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

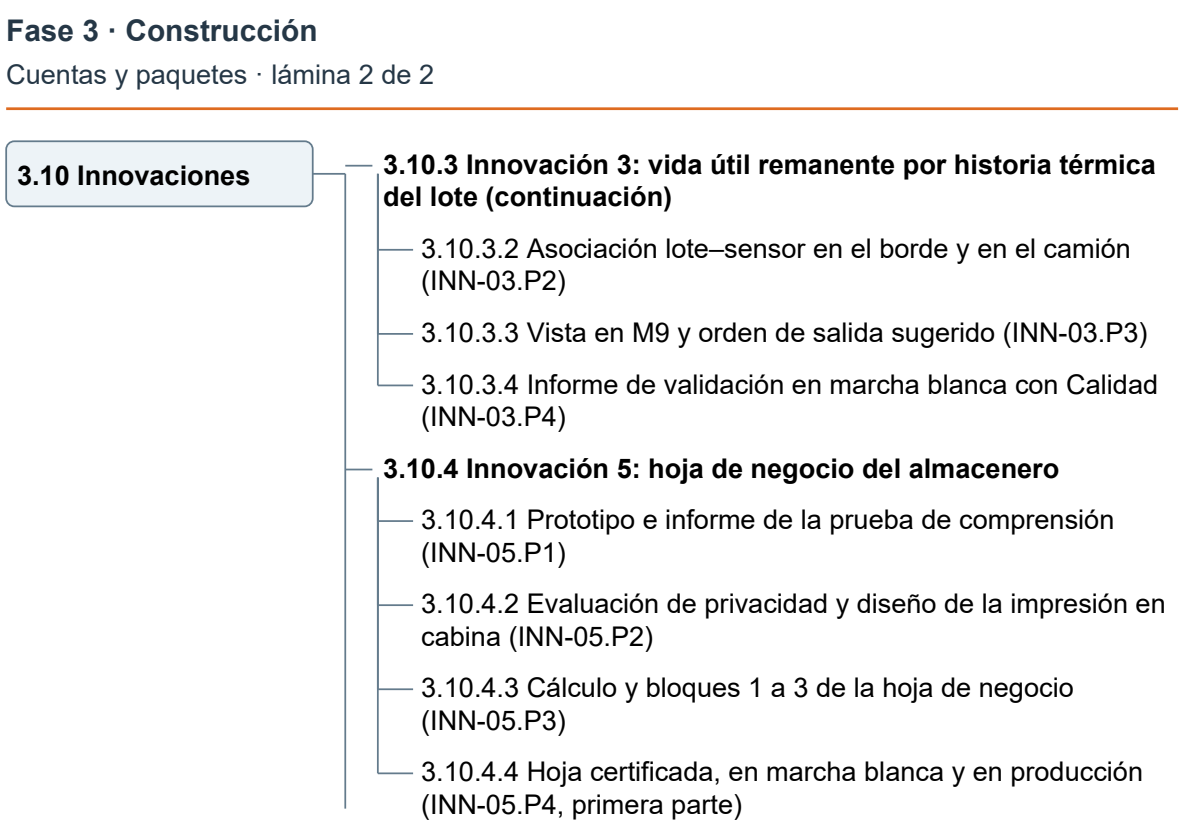


Figura 7.10 (continuación 2 de 2). Fase 3 — Construcción, quinta parte: detalle de los paquetes de las innovaciones agrupadas en la cuenta 3.10. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

El detalle identifica los paquetes de INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 dentro de 3.10. INN-04 conserva su tratamiento distinto: su fórmula contractual se acuerda en la cuenta 5.4, como muestra la fase de Adquisiciones y contrataciones.

7.1.2.4 Fase 4. Transición

Transición convierte la solución probada en el registro oficial. Su plan contempla las olas y la reversión; luego coordina las marchas blancas, la estabilización y las actas de aceptación de ambas etapas (H7 y H12).

La Figura 7.11 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

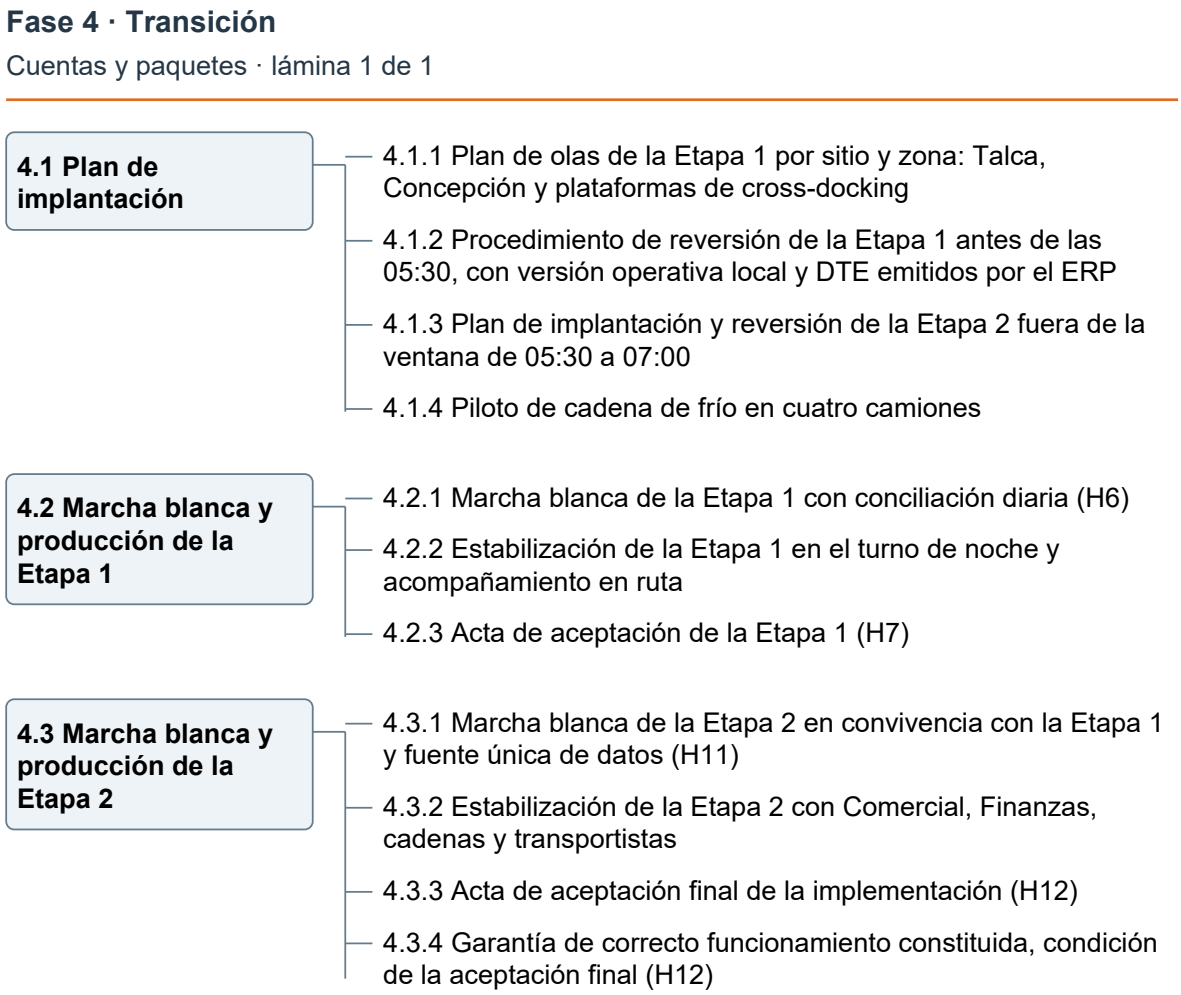


Figura 7.11 Fase 4 — Transición: plan de implantación y marchas blancas de las etapas 1 y 2, cuentas 4.1 a 4.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La cuenta 4.1 prepara las olas y la reversión; las cuentas 4.2 y 4.3 separan la marcha blanca y producción de cada etapa, asociadas a los hitos H7 y H12.

7.1.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones

Esta fase distingue el equipamiento de terreno, que el CLIENTE compra según la especificación de LafroX, de la infraestructura de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde, que LafroX especifica, compra y provee. LafroX incorpora el costo de esta infraestructura en su Oferta Económica; el CLIENTE no la adquiere mediante una compra separada. LafroX también contrata nube, enlaces y licencias. La fase formaliza, además, los acuerdos con transportistas y sindicato y la fórmula contractual de la innovación 4.



La Figura 7.12 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

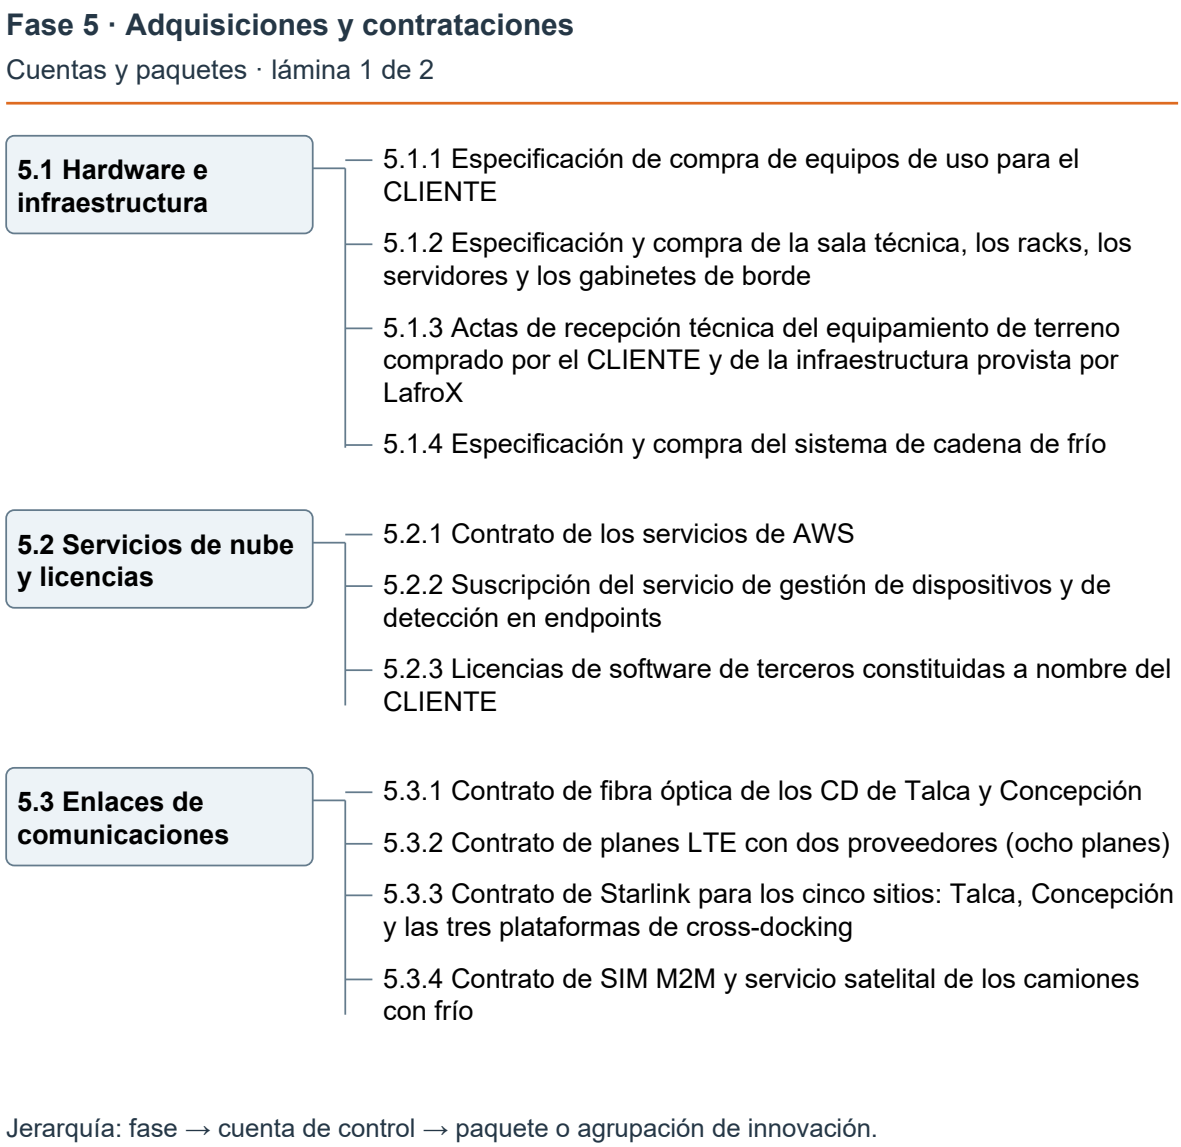


Figura 7.12 Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

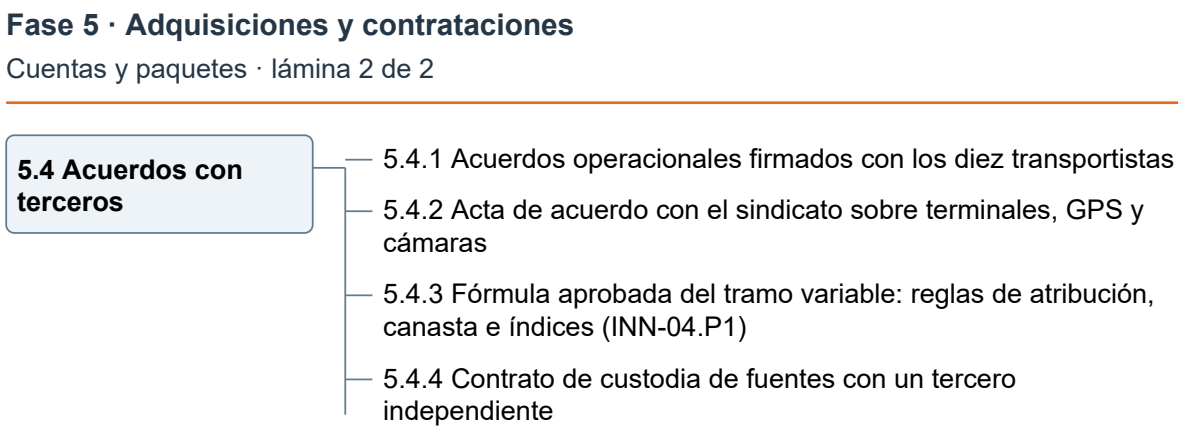


Figura 7.12 (continuación 2 de 2). Fase 5 — Adquisiciones y contrataciones: hardware, servicios, enlaces y acuerdos con terceros, cuentas 5.1 a 5.4. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La cuenta 5.1 reúne las adquisiciones de hardware, manteniendo la distinción anterior: el CLIENTE compra el equipamiento de terreno y LafroX compra y provee la infraestructura de sala, incluida en su Oferta Económica. Las cuentas 5.2 a 5.4 organizan nube y licencias, enlaces y acuerdos con terceros.

7.1.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios

La fase instala la sala técnica de Talca, con energía, climatización y extinción; el cableado, los racks y gabinetes de borde; y la infraestructura de los sitios. La primera figura cubre la sala, el cableado y el montaje de racks (cuentas 6.1 a 6.3).

La Figura 7.13 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

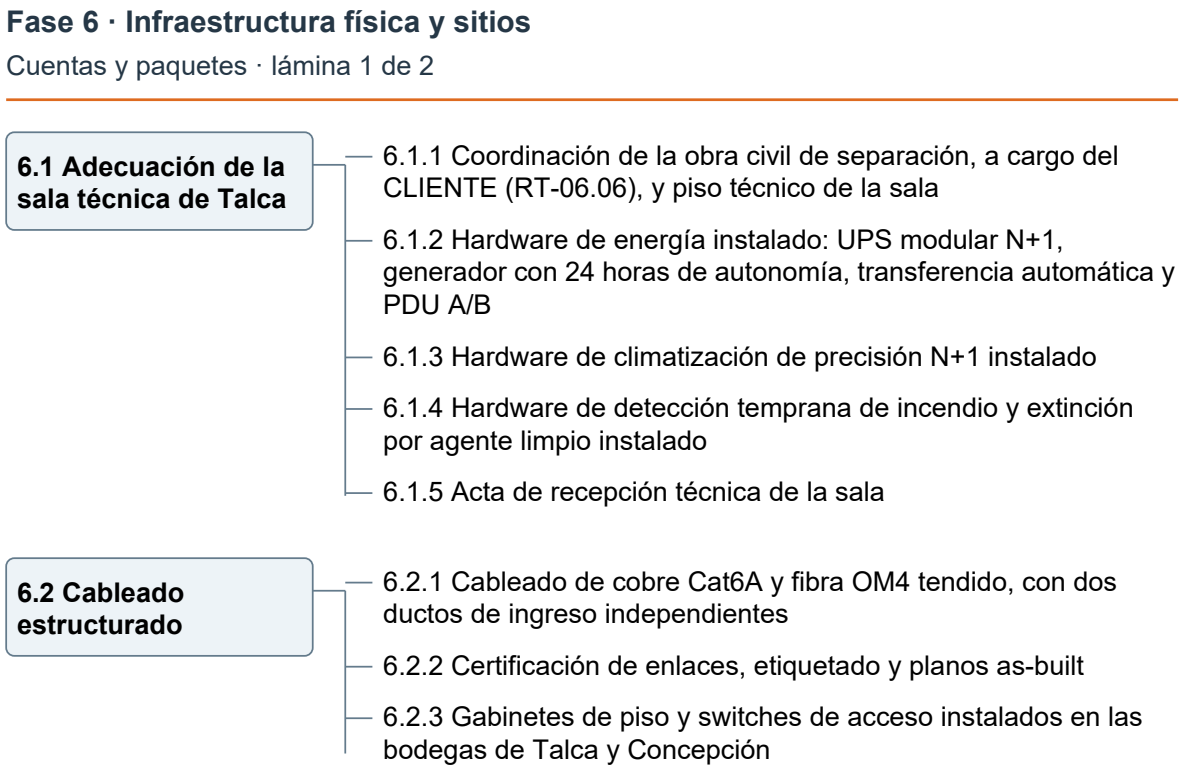


Figura 7.13 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Alex

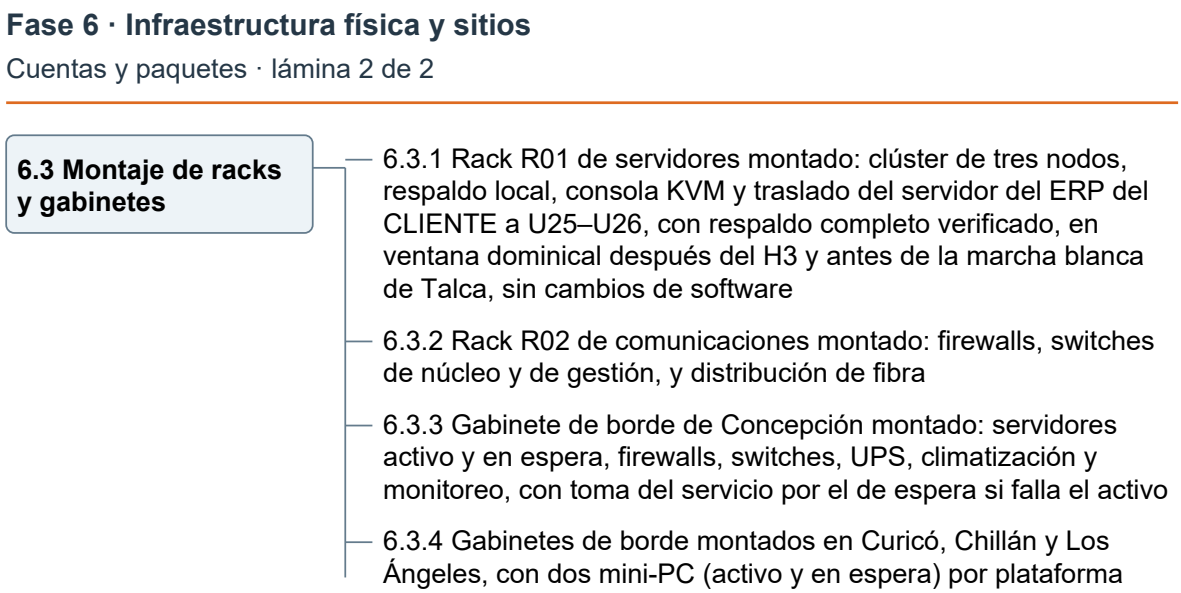


Figura 7.13 (continuación 2 de 2). Fase 6 — Infraestructura física y sitios, primera parte: sala técnica, cableado y racks, cuentas 6.1 a 6.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La segunda figura incluye seguridad física, equipamiento de campo y configuración de la infraestructura distribuida en los sitios (cuentas 6.4 a 6.6), incluidos los termógrafos de los camiones con frío y la prueba de autonomía de 24 horas.

La Figura 7.14 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

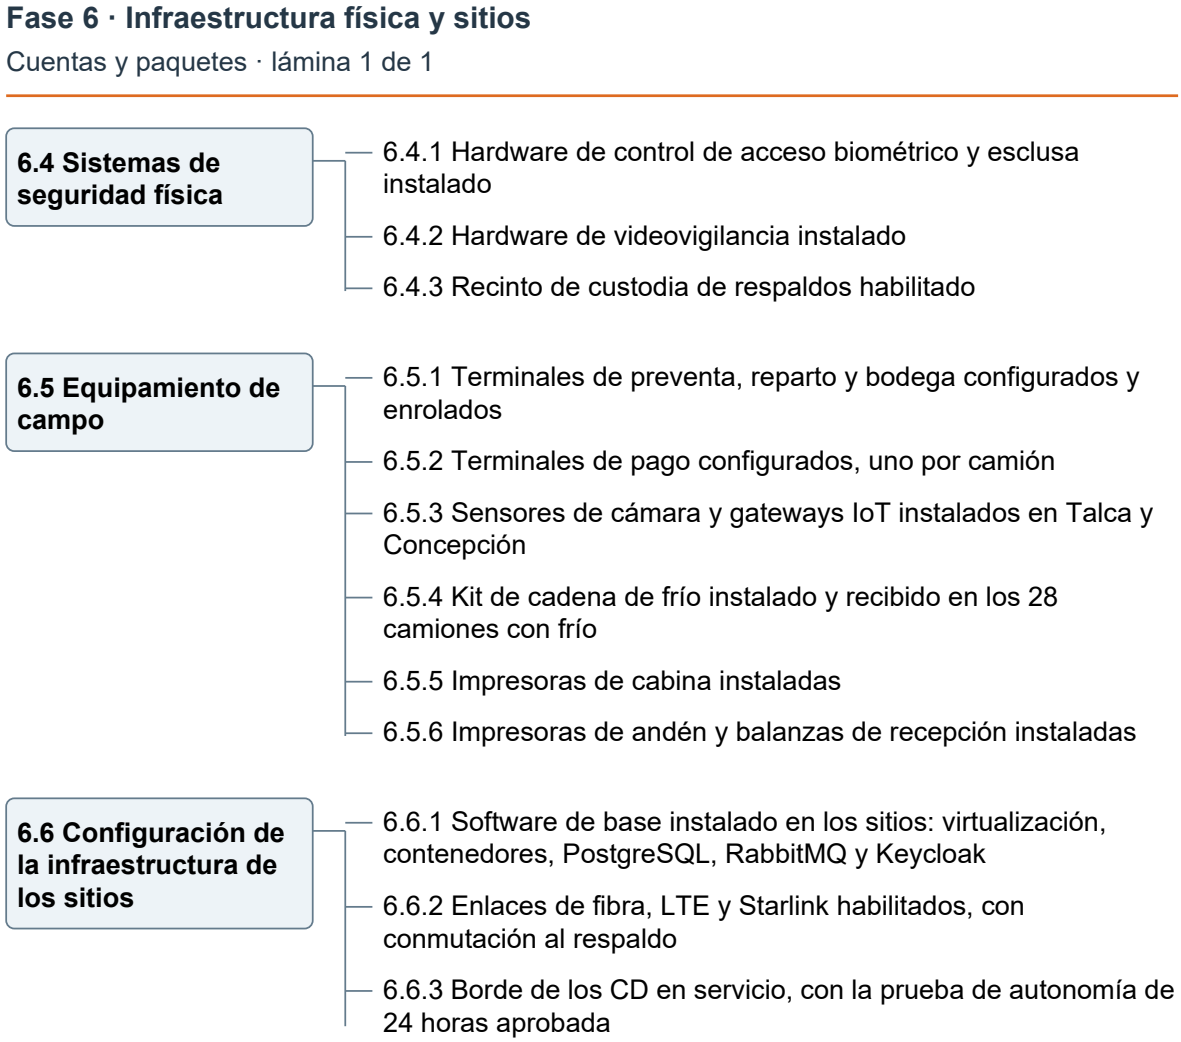


Figura 7.14 Fase 6 — Infraestructura física y sitios, segunda parte: seguridad física, equipamiento de campo y configuración, cuentas 6.4 a 6.6. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Con seguridad física, equipamiento de campo y configuración de los sitios, estas cuentas completan la infraestructura distribuida que habilita la operación en terreno.

7.1.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio

La fase atiende la rotación del 38 % en preparación con capacitación continua del turno de noche; acompaña individualmente al personal con veinte o treinta años en la compañía; incorpora a los conductores externos en el andén; y transfiere conocimiento al equipo de TI del CLIENTE. La certificación de usuarios (cuenta 7.3) es una de las condiciones de cierre de cada marcha blanca.



La Figura 7.15 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

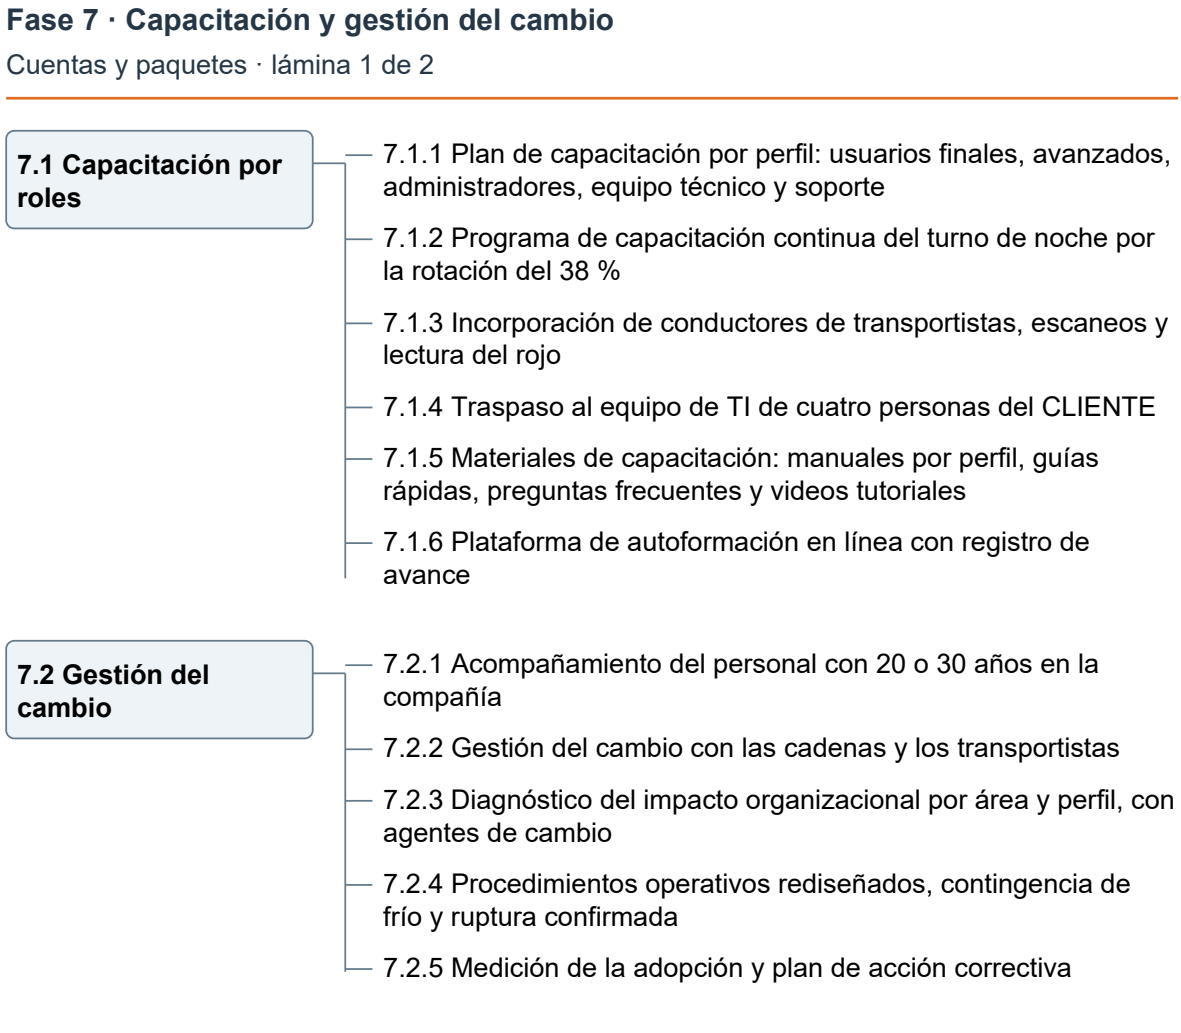


Figura 7.15 Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

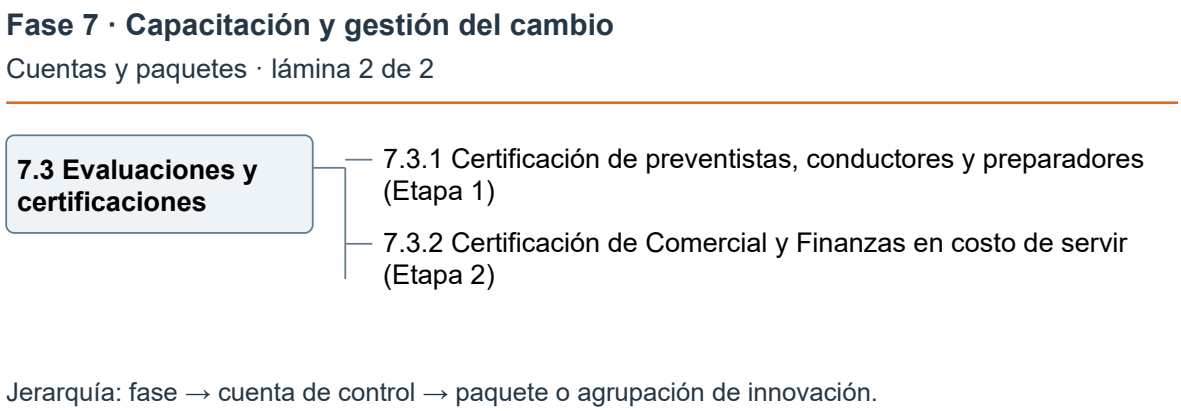


Figura 7.15 (continuación 2 de 2). Fase 7 — Capacitación y gestión del cambio: capacitación por roles, acompañamiento y certificaciones, cuentas 7.1 a 7.3. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La lámina muestra que la adopción combina formación por perfil, acompañamiento del personal y certificaciones antes de los cierres de marcha blanca.

7.1.2.8 Fase 8. Operación y soporte

La fase presta servicios durante los meses 21 a 56: centro de operaciones, gestión de incidentes, continuidad, mantenimiento, innovaciones, informes y transferencia al equipo del CLIENTE. La primera figura presenta las cuentas 8.1 y 8.2, que reúnen los servicios de operación y el mantenimiento de la solución.

La Figura 7.16 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

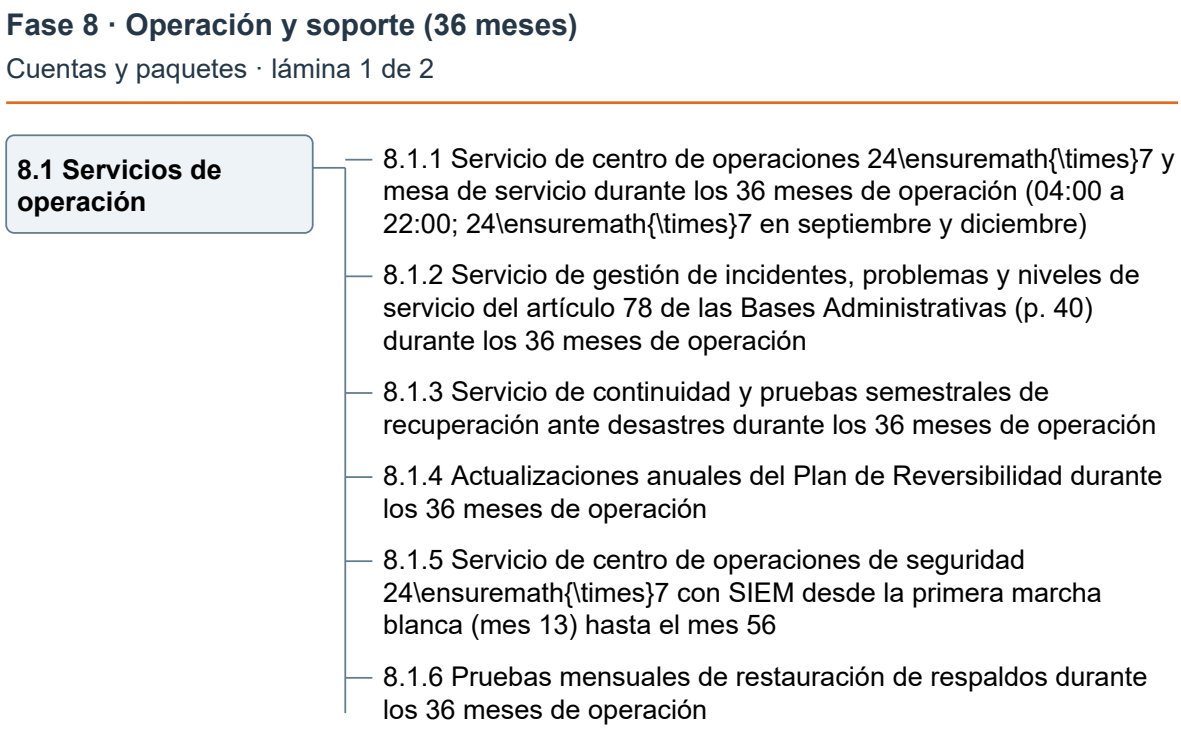


Figura 7.16 Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

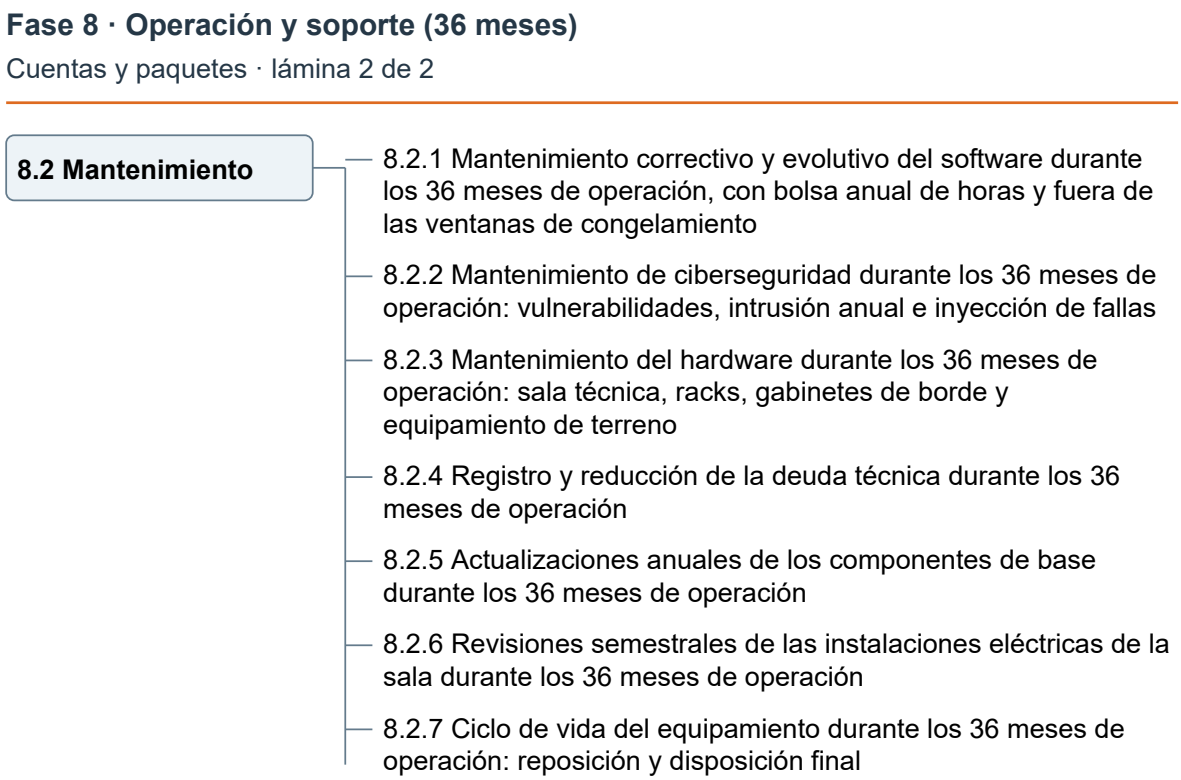


Figura 7.16 (continuación 2 de 2). Fase 8 — Operación y soporte, primera parte: servicios de operación y mantenimiento, cuentas 8.1 y 8.2. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La primera parte concentra la continuidad del servicio y el mantenimiento del software, la infraestructura y la ciberseguridad. Sus paquetes conservan las frecuencias, horarios y ventanas que condicionan la operación durante los 36 meses.

La segunda figura completa la fase con las cuentas 8.3 a 8.5: innovaciones en operación, informes y obligaciones periódicas, y capacitación y transferencia. También distingue los períodos particulares de las innovaciones y la mentoría al equipo del CLIENTE.

La Figura 7.17 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

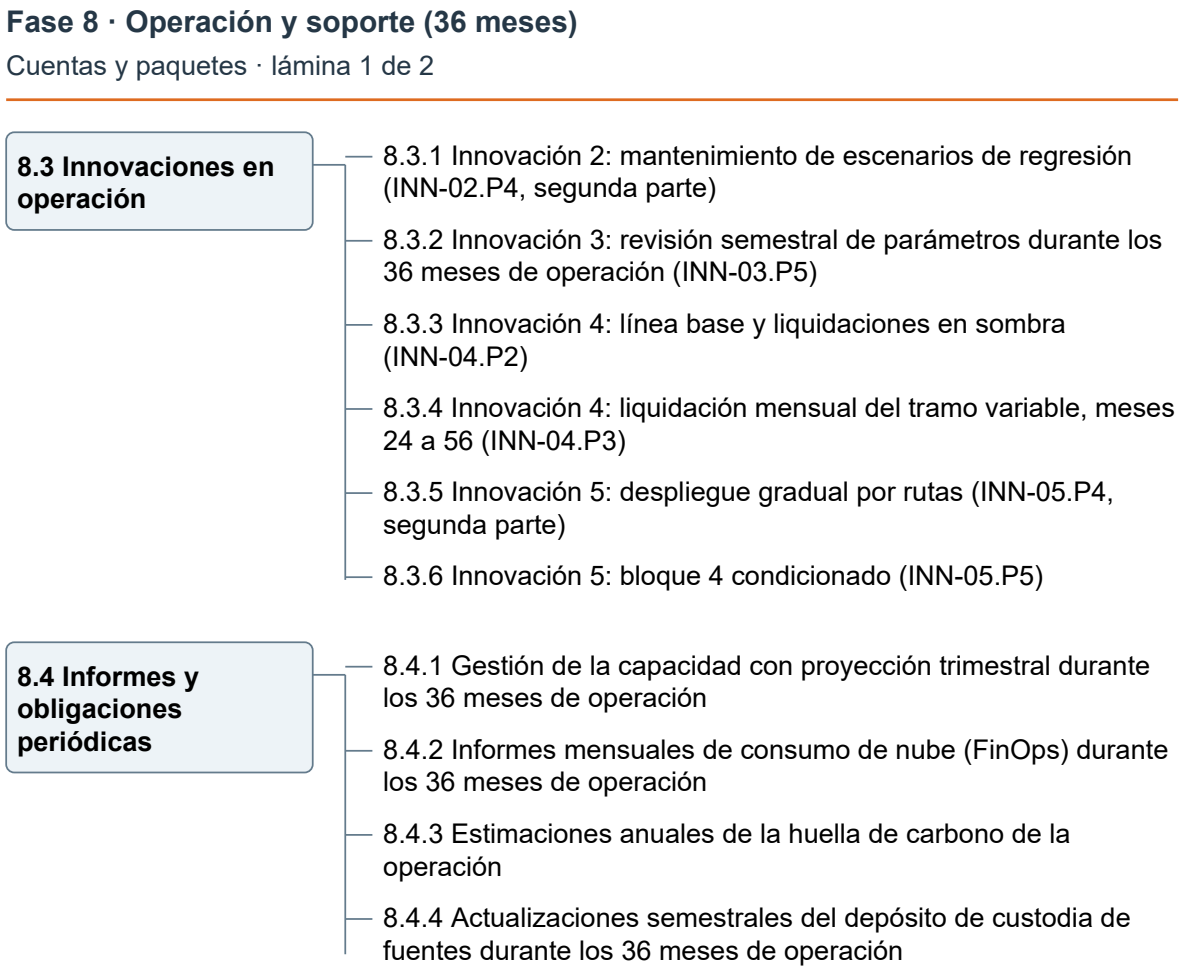


Figura 7.17 Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Media firma: Alex Aravena

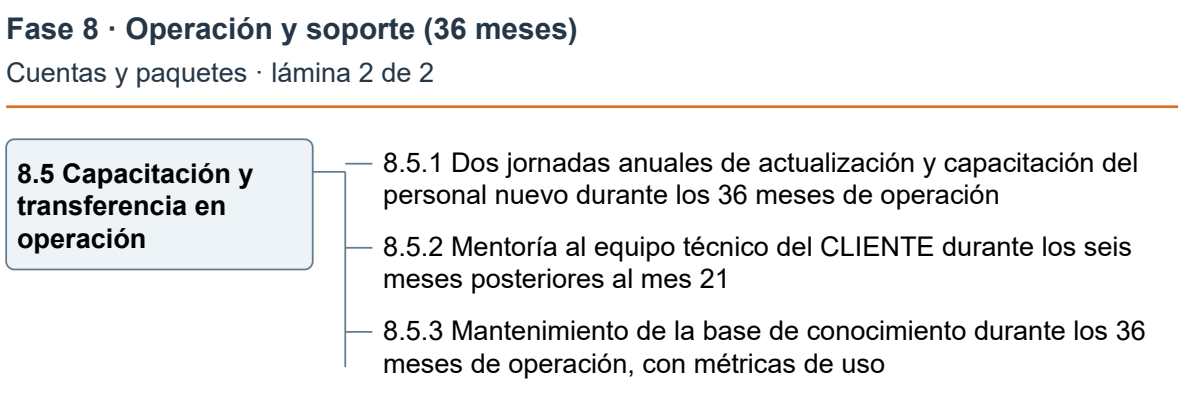


Figura 7.17 (continuación 2 de 2). Fase 8 — Operación y soporte, segunda parte: innovaciones, obligaciones periódicas, capacitación y transferencia, cuentas 8.3 a 8.5. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

Estas cuentas completan la operación con la continuidad de las innovaciones, los informes recurrentes y la transferencia de conocimiento. La mentoría al equipo técnico del CLIENTE se extiende durante los seis meses posteriores al mes 21, mientras que el tramo variable de INN-04 se liquida entre los meses 24 y 56.

7.1.2.9 Fase 9. Cierre

Cierre comprende dos momentos. El primero corresponde al cierre de la implementación: la entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue del paquete 9.1.1 se vincula al H12 del mes 21; el informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación, paquete 9.1.2, se completa después del acta H12. Según la programación vigente del Formulario T-15, este último paquete se ejecuta del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, entre los meses 21 y 22, bajo el supuesto de inicio en febrero de 2027. El segundo momento corresponde a la salida al término del contrato, con el Plan de Reversibilidad y el tratamiento final de los datos.

La Figura 7.18 presenta el detalle descrito a continuación; se lee desde la cuenta de control hacia sus paquetes, identificados con los mismos códigos del diccionario T-14.

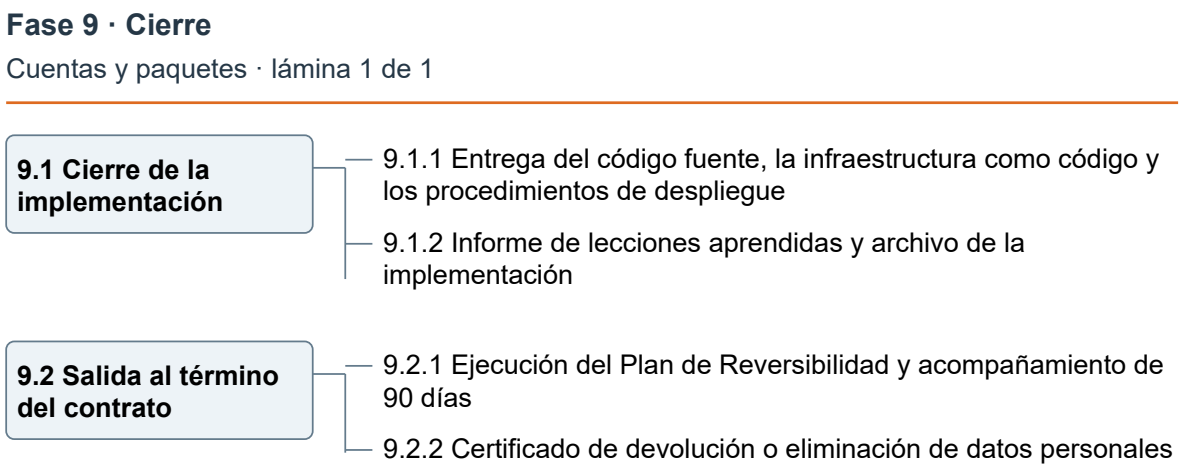


Figura 7.18 Fase 9 — Cierre: cierre de implementación y salida al término del contrato, cuentas 9.1 y 9.2. Fuente: Elaboración a partir de (Formulario T-14).

La EDT distingue así el cierre de implementación de la salida al término del contrato. El cierre comprende la entrega vinculada al H12 y el archivo posterior de todas las actas; no queda íntegramente limitado al mes 21.

7.1.3 Cobertura del alcance

La EDT contiene explícitamente las innovaciones y las actividades de seguridad, calidad, migración e implantación, así como la arquitectura exigida por el Caso logística (Caso, cap. 19, p. 35). La Tabla 7.2 comprueba que cada uno de esos componentes tiene paquetes propios.

Tabla 7.2 Cobertura del alcance en la EDT. Fuente: Formulario T-14 y Subdocumento 4.

Componente	Elementos	PT	Cuentas de control	Exigencia
Módulos	M1–M12 y portales de clientes y transportistas	15	3.4, 3.5	Caso logística, Capítulo 19
Interfaces	INT-01 a INT-15	21	3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 6.3, 6.5	Caso logística, Capítulo 19
Innovaciones	INN-01 a INN-05	23	3.10, 5.4, 8.3	BA, Art. 29°

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

Componente	Elementos	PT	Cuentas de control	Exigencia
Seguridad	Diseño, construcción, pruebas y operación	17	1.9, 2.2, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.11, 6.4, 8.1, 8.2	—
Calidad	Planes, puertas, pruebas y deuda técnica	19	1.5, 3.8, 3.9, 3.11, 8.2	—
Migración	Perfilamiento, carga, ensayos y conciliación	6	3.3, 3.7	BTT, numeral 20.1
Implantación	Olas, marchas blancas, capacitación y cambio	24	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	RT-20.01 a 20.08

El portal de proveedores se construye con M11 Canal moderno, en el paquete 3.5.1. Las categorías de cobertura se superponen: sus cantidades no se suman para obtener los 227 paquetes de la EDT.

La tabla muestra que ninguna exigencia descansa en un paquete genérico. La seguridad, por ejemplo, aparece en las cinco fases donde ocurre: el diseño de la Elaboración, la identidad y las pruebas de seguridad ofensiva de la Construcción, la seguridad física de la sala y el centro de operaciones de seguridad durante la Operación. Las pruebas de seguridad ofensiva 3.8.6 y 3.9.5 se cuentan en la fila de seguridad y en la de calidad, porque son a la vez control de seguridad y prueba de certificación. Las pruebas de la Etapa 2 repiten las de la Etapa 1 con una exigencia adicional: demostrar que la Etapa 1 en producción no se degrada.

La Figura 7.19 ubica esos paquetes por fase y muestra en qué parte de la EDT y, por lo tanto, del cronograma quedan las actividades de cada categoría.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Fase de la EDT	Innovaciones 23 Paquetes de Trabajo	Seguridad 17 Paquetes de Trabajo	Calidad 19 Paquetes de Trabajo	Migración 6 Paquetes de Trabajo	Implantación 24 Paquetes de Trabajo
1 Inicio	—	1.9.2, 1.9.3, 1.9.4	1.5.1, 1.5.2	—	—
2 Elaboración	—	2.2.1–2.2.4	—	—	—
3 Construcción	3.10.1 INN-01 3.10.2 INN-02 3.10.3 INN-03 3.10.4 INN-05	3.2.5, 3.3.1 3.8.6, 3.9.5 3.11.4	3.8.1–3.8.8 3.9.1–3.9.7 3.11.3	3.3.3 3.7.1–3.7.5	—
4 Transición	—	—	—	—	4.1.1–4.1.4 4.2.1–4.2.3 4.3.1–4.3.4
5 Adquisiciones	5.4.3 INN-04	—	—	—	—
6 Infraestructura	—	6.4.1–6.4.3	—	—	—
7 Capacitación	—	—	—	—	7.1.1–7.1.6 7.2.1–7.2.5 7.3.1, 7.3.2
8 Operación	8.3.1–8.3.6 (INN-02 a INN-05)	8.1.5, 8.2.2	8.2.4	—	—
9 Cierre	—	—	—	—	—

Figura 7.19 Ubicación en la EDT de las innovaciones y la seguridad, la calidad, la migración y la implantación. Fuente: Formulario T-14.

La matriz confirma que las cinco categorías se distribuyen desde el diseño hasta la operación. Las innovaciones tienen paquetes en las fases donde se construyen, se contratan y se operan: INN-01, INN-02, INN-03 e INN-05 se construyen en la cuenta 3.10; la fórmula contractual de INN-04 se aprueba en la cuenta 5.4, porque es una innovación de modelo de contratación y no tiene paquete de construcción; e INN-02 a INN-05 tienen su parte de operación en la cuenta 8.3. Cada innovación tiene sus meses en el Anexo 7.D (BA, art. 29, p. 19, punto 4).

Los anexos completan la cobertura. El Anexo 7.E relaciona los doce módulos y las quince interfaces del Capítulo 4 con el paquete que los construye y prueba, y el Anexo 7.C ubica los dieciséis resultados de aceptación del caso en su paquete y su momento. Los requerimientos del Formulario T-12 se trazan a los paquetes mediante la matriz de trazabilidad del paquete 1.2.4, que se aprueba con el H1.

7.1.4 Diccionario y asignación de responsables

El diccionario de la EDT, en el Formulario T-14, describe cada paquete con su entregable, su criterio de aceptación, su responsable y el período del cronograma en que se ejecuta, junto con el hito del Formulario E-25 que habilita. Todo entregable se recibe con el acta de la Contraparte Técnica, acompañada de su evidencia de verificación, su trazabilidad hacia los requerimientos y las observaciones resueltas (BA, arts. 18.1 y 18.2, p. 13). Los criterios del diccionario se suman a esa regla común. Por ejemplo, el paquete 3.4.1 (M1 Recepción) se acepta solo si ningún producto con trazabilidad obligatoria se recibe sin lote, y el 4.1.2 (reversión de la Etapa 1) se acepta solo si su ensayo termina antes de las 05:30, sostiene 96 despachos sin interrupción con DTE válidos del ERP y no pierde ni duplica registros.

Los responsables son los ocho roles de la estructura para el proyecto del Capítulo 1, sección 1.5 (Subdocumento 1). La Tabla 7.3 muestra cómo se reparten los paquetes.

Tabla 7.3 Paquetes por responsable. Fuente: (Formulario T-14).

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Líder de Operación / SRE	60	26 %	6 (21), 3 (13), 8 (12)
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	35	15 %	7 (13), 4 (8)
Jefe de Proyecto	33	15 %	1 (22)
Líder de Desarrollo	24	11 %	3 (21)
Líder de Calidad	19	8 %	3 (15)
Arquitecto de Solución	20	9 %	2 (6), 3 (6)

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 7.3 — continuación

Rol	PT	%	Fases con más paquetes
Encargado de Seguridad de la Información	18	8 %	1 (4), 2 (4), 3 (4)
Líder de Datos	18	8 %	3 (16)
Total	**227**	**100 %**	

Todos los paquetes tienen un responsable único, de modo que son asignables. La distribución sigue la naturaleza del trabajo: el Jefe de Proyecto concentra la gestión y el gobierno; el Líder de Desarrollo, la construcción; y el Líder de Implantación, la capacitación y la transición. El Líder de Operación / SRE responde por un cuarto de los paquetes, porque reúne la nube, la infraestructura de los cinco sitios y la operación, y sus paquetes de las fases 3 y 6 ocurren a la vez. Responder por un paquete no significa ejecutarlo en persona: la sección 7.2.3 y el Formulario T-15 muestran qué frente ejecuta el trabajo bajo cada rol.

7.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo aplica las metodologías del Capítulo 6. La gestión del proyecto se basa en el PMBOK: los alcances aprobados (H1 y H8) y el cronograma son las líneas base contra las que se mide el avance; el avance se mide con valor ganado en el informe mensual (RT-19.06 y RT-19.07); y todo cambio de alcance, plazo o criterio de aceptación se aprueba antes de incorporarse al plan, conforme al artículo 72 de las Bases Administrativas (p. 38) (paquete 1.4.3).

El desarrollo sigue las cuatro fases del proceso iterativo del Capítulo 6, que la EDT recorre una vez por etapa. Dentro de la Construcción, cada módulo avanza por iteraciones que producen resultados verificables, mientras que la marcha blanca y la aceptación formal ocurren solo en los meses que fija el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13). El tablero de flujo del equipo coordina las tareas diarias, pero no reemplaza el cronograma ni la aceptación formal de los entregables, como establece la metodología de gestión de proyectos del Capítulo 6.

7.2.1 Secuenciamiento y dependencias

El orden del trabajo sigue las dependencias de datos y de infraestructura de Puelche (Capítulo 3, sección 3.4.3). Primero se aprueban el alcance (H1, mes 2) y el diseño (H2, mes 4). En paralelo, se especifica y compra el equipamiento de la sala y de los sitios, y se contratan la nube y los enlaces, de modo que la infraestructura híbrida y los ambientes queden habilitados en el H3 del mes 6.



La construcción de la Etapa 1 parte por la base compartida, porque si falla, fallan todos los módulos. Sigue con recepción e inventario, que alimentan la preparación y el retiro sanitario, mientras la preventa avanza en paralelo porque necesita stock y crédito. Las rutas y el reparto se integran cuando existen el pedido confirmado y la preparación, y la rendición, cuando existe la entrega registrada. La Etapa 2 se diseña en los meses 13 y 14 (H8), reutiliza los pedidos, las guías y las evidencias ya probadas, y calcula el costo de servir con los hechos acumulados desde la marcha blanca de la Etapa 1.

La Figura 7.20 presenta una síntesis de las precedencias entre cuentas de control e hitos. El Anexo 7.B detalla 41 dependencias entre paquetes, con su tipo y fundamento. En la interpretación de esta red se debe distinguir la cadena de construcción y certificación de la Etapa 2 del camino que controla la aceptación final H12.

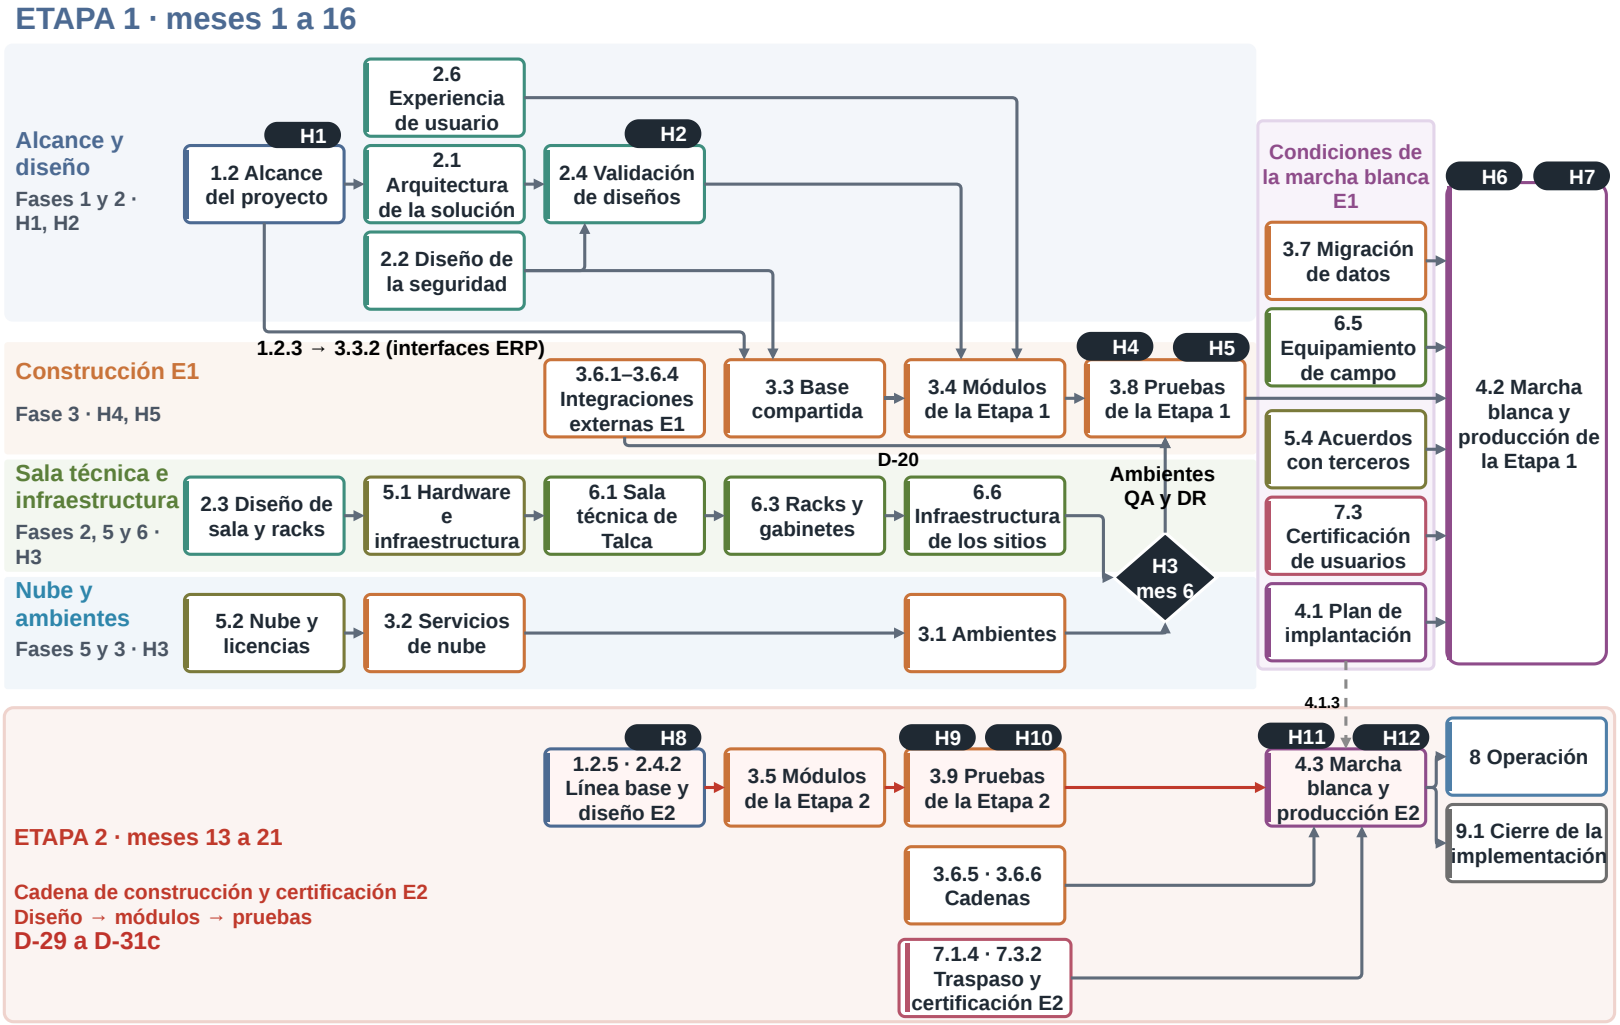


Figura 7.20 Red de precedencias entre cuentas de control e hitos. Fuente: (Subdocumento 7, Anexo 7.B) y (Bases Administrativas, Formulario E-25, pp. 74–75).

La red muestra tres convergencias. En el H3 se juntan la cadena de la nube (5.2, 3.2 y 3.1) y la de la sala técnica (2.3, 5.1, 6.1, 6.3 y 6.6). En los hitos H4 y H5 se juntan los módulos, la base compartida, el diseño aprobado y la experiencia de usuario. Al cierre de la marcha blanca se juntan la solución certificada, la migración, el equipamiento de cada ola, la certificación de los usuarios y, en la ola de reparto, los acuerdos con los transportistas y el sindicato. Un atraso en cualquiera de esas ramas se propaga al hito aunque no sea de software.

La cadena de diseño, construcción y certificación de la Etapa 2 comprende las dependencias D-29 a D-31c. El camino controlante del H12 identificado por el cálculo vigente de la sección 7.3.1 es distinto: cierre de la marcha blanca 4.3.1, preparación del acta 4.3.3 y diez días hábiles de revisión del CLIENTE. La garantía 4.3.4 se constituye en paralelo y debe estar disponible para la aceptación. La entrega calculada es el 11 de octubre de 2028 y el acta, el 25 de octubre, con tres días hábiles de holgura respecto del límite del 31 de octubre.


El secuenciamiento incorpora además las condiciones de la operación de Puelche que el caso exige ver en el plan (Caso, sección 17.5, p. 33). El congelamiento total del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los tres primeros días hábiles de cada mes restringen las intervenciones (paquete 1.3.1). La prohibición de paso a producción en todo septiembre y diciembre tiene alcance propio; los despliegues respetan además la política de arquitectura descrita en T-18, sección 1. La implantación en bodega y su acompañamiento se programan en el turno de noche, entre las 22:00 y las 06:00 (paquete 4.2.2), y la rotación del 38 % se atiende con capacitación continua y no con un evento único (paquete 7.1.2). Los 62 preventistas y la tripulación de reparto, cerca de 244 personas (84 conductores y peonetas propios y unos 160 conductores de transportistas), se capacitan en su ruta, sin detener la venta ni el reparto (paquetes 7.1.1 y 4.2.2).

Los acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato preceden a la ola de reparto (paquetes 5.4.1 y 5.4.2), y la certificación del intercambio electrónico es un paquete por cadena y no una tarea única (paquetes 3.6.5 y 3.6.6). Las interfaces del sistema de gestión se levantan en el Inicio y se prueban temprano (paquetes 1.2.3 y 3.3.2). Las reglas de ruteo del planificador se capturan en los talleres de los meses 1 a 3 y se validan sin él durante la marcha blanca (paquete 1.2.2; resultado R18-16).

7.2.2 Estimación

El esfuerzo se estima por paquete con tres valores en horas hombre: optimista, más probable y pesimista (PMI, 2017, p. 201). La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, una de las que el PMBOK admite para modelar la incertidumbre de duración y recursos (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT da el esfuerzo esperado $T_E = (O + 4M + P)/6$ y su desviación $\sigma = (P - O)/6$ (Malcolm et al., 1959). El PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O + M + P)/3$ (PMI, 2017, p. 201); se prefiere la beta porque da cuatro veces más peso al valor más probable, que el equipo funda en los requerimientos del Formulario T-12 y en las cantidades del Formulario T-11.

La base de cada estimación depende del tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman a partir de los requerimientos del Formulario T-12 asignados a cada paquete; la




infraestructura, a partir de las cantidades del Formulario T-11; la implantación, a partir de las personas y rutas del caso; y la operación, a partir de los horarios de cobertura y de la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 se estiman por mes y se multiplican por los 36 meses de operación. El Formulario T-15 detalla el método y las reglas de programación. La duración de cada paquete se obtiene de su esfuerzo esperado y de la dotación asignada, y la suma de las varianzas de los paquetes de la ruta crítica entrega la probabilidad de cumplir cada hito con la aproximación normal de PERT. Para programar y controlar, el esfuerzo de cada paquete se reparte entre sus actividades del Formulario T-15, sección 6, sin cambiar su total.

La Tabla 7.4 resume el resultado de la estimación por etapa contractual, con la reserva protegida separada del trabajo base.

Tabla 7.4 Horas hombre programadas por etapa — Fuente: (Formulario T-15), sección 4.3

Etapa	Meses	HH base y cobertura	HH de reserva protegida	HH programadas
Etapa 1 · Desarrollo	1 a 12	40.569,48	0	40.569,48
Etapa 1 · Marcha blanca	13 a 15	11.214,55	1.152	12.366,55
Etapa 2 · Desarrollo	13 a 18	11.406,54	0	11.406,54
Etapa 2 · Marcha blanca	19 y 20	7.387,91	0	7.387,91
Etapa 1 · Producción y estabilización	16 a 20	14.824,31	1.920	16.744,31
Etapa 2 · Cierre y estabilización posterior al H12	21 y 22	2.694,54	0	2.694,54
Operación	21 a 56	128.853,67	0	128.853,67
Total		**216.951**	**3.072**	**220.023**

La operación concentra el 59 % de las horas programadas (128.854 de 220.023 HH), porque cubre 36 meses de servicio continuo del centro de operaciones, la mesa y el SOC (el SOC opera desde la primera marcha blanca, en el mes 13, y sus horas de los meses 13 a 20 se imputan a las marchas blancas y a la producción de la Etapa 1); la mesa incluye desde el mes 25, cuando la demanda proyectada se acerca a su límite, un tercer agente en las franjas de menor demanda,



Media firma: Alex Aravena


con el que cubre sus niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes. Son puestos de turno 24×7 y de mesa, no personas dedicadas a otras tareas. La implementación de los meses 1 a 21, más la estabilización posterior al paso a producción que exige el RT-20.06 en los meses 21 y 22, suma 91.169,33 HH. Su tramo más denso son los meses 13 a 15, cuando la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2 suman 17.532,26 HH (4.747,73 + 6.591,68 + 6.192,85, según la curva del Formulario T-15, sección 4.4), con un máximo de 58 personas equivalentes en el mes 14. La construcción de los cuatro módulos de la Etapa 2 se reparte entre los meses 14 y 15, con cinco personas por módulo como máximo, en vez de concentrarse en abril. El mes de mayor dotación del proyecto es el 16, con 64 personas equivalentes, cuando el paso a producción de la Etapa 1, su estabilización y el soporte puente coinciden con las pruebas de la Etapa 2. Las 3.072 HH de reserva se asignan sólo a la Etapa 1, de modo que una corrección en su marcha blanca no se financia con horas de la Etapa 2.

7.2.3 Frentes de trabajo y sincronización

El trabajo se organiza en ocho frentes. Cada frente es un equipo con un responsable que avanza en paralelo con los demás sobre un conjunto de cuentas de control. El frente de construcción de la Etapa 1 (F3) se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (Subdocumento 3): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10). La Figura 7.21 presenta los frentes, su rol líder, sus cuentas de control y su ventana de actividad entre los meses 1 y 21; la correspondencia completa está en el Formulario T-15.

Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

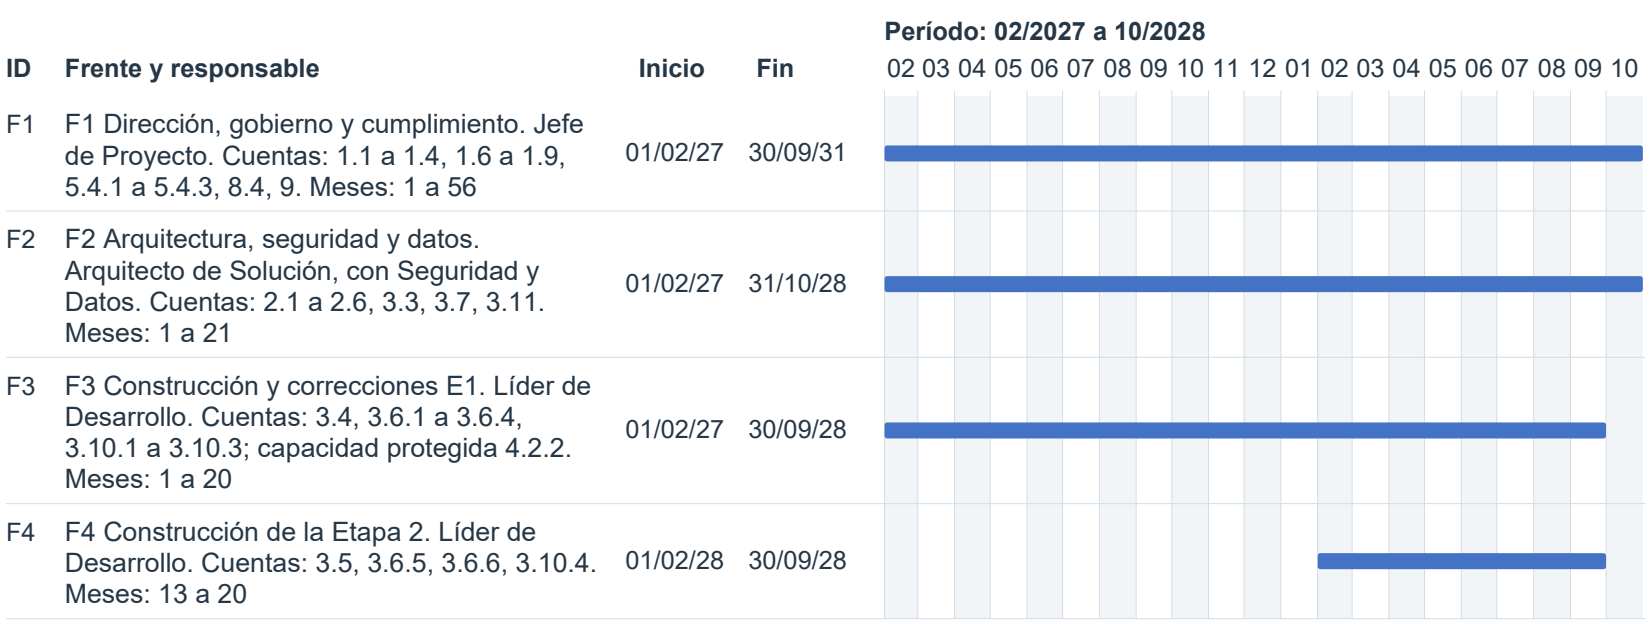

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F1	F1 Dirección, gobierno y cumplimiento. Jefe de Proyecto. Cuentas: 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9. Meses: 1 a 56	01/02/27	30/09/31
F2	F2 Arquitectura, seguridad y datos. Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos. Cuentas: 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F3	F3 Construcción y correcciones E1. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F4	F4 Construcción de la Etapa 2. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4. Meses: 13 a 20	01/02/28	30/09/28


F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 7.21 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. Fuente: (Formulario T-14) y (Formulario T-15).

Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F5	F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F6	F6 Calidad y pruebas. Líder de Calidad. Cuentas: 1.5, 3.8, 3.9. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F7	F7 Implantación y gestión del cambio. Líder de Implantación y Gestión del Cambio. Cuentas: 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3. Meses: 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11	01/03/27	31/10/28
F8	F8 Operación y soporte. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 8.1 a 8.3, 8.5. Meses: 21 a 56	01/10/28	30/09/31

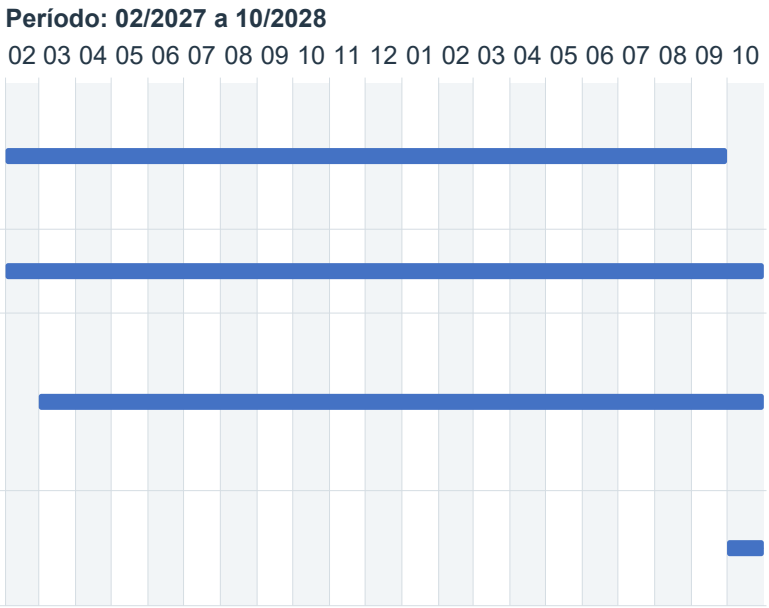

F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 7.21 (continuación 2 de 2). Frentes de trabajo de los meses 1 a 21. Fuente: (Formulario T-14) y (Formulario T-15).

La figura muestra que en ningún mes trabaja un solo frente: entre los meses 1 y 15 avanzan a la vez la dirección, la arquitectura, la construcción de la Etapa 1, la plataforma y la calidad. La gestión del cambio empieza con el diagnóstico organizacional de los meses 2 a 6, y la implantación se intensifica desde el mes 8. Los frentes se sincronizan en tres instancias. La primera son los hitos del Formulario E-25, porque cada hito exige que varios frentes entreguen a la vez. La segunda son los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37): el de Proyecto es quincenal y los de Arquitectura y Operación son mensuales, y sus actas registran los acuerdos entre frentes en dos días hábiles (RT-19.09). La tercera son las ventanas de calendario, que son comunes a todos los frentes.

7.2.4 Solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20

El artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) obliga a dimensionar dotación y frentes para dos esfuerzos simultáneos. En los meses 13 a 15 trabajan a la vez el frente de implantación (F7), en la marcha blanca de la Etapa 1 con su acompañamiento; el de construcción de la Etapa 1 (F3), en las correcciones de esa marcha blanca; el de construcción de la Etapa 2 (F4), en su desarrollo, con el H8 en el mes 14; el de calidad (F6), en las pruebas de ambas etapas; y los frentes de dirección y de arquitectura (F1 y F2).

F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, pero son equipos distintos. Si el mismo equipo atendiera la marcha blanca y desarrollara la Etapa 2, cada incidente de la marcha blanca atrasaría la Etapa 2, que es precisamente la situación que el artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) busca evitar. La Figura 7.21 lo hace visible: en la franja sombreada de los meses 13 a 15, las barras de F3 y F4 coexisten en carriles separados.

En los meses 19 y 20 la Etapa 1 está en producción y la Etapa 2 en marcha blanca. Trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6, en las pruebas; y el soporte de la Etapa 1 en producción. La dotación de cada frente en cada solapamiento se presenta en el Formulario T-15, de modo que los dos esfuerzos se sumen sin contar dos veces a las mismas personas.

7.3 Cronograma e implantación

El cronograma aplica el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) mes a mes y la implantación aplica las condiciones del Caso logística (secciones 13.3 y 17.6, pp. 23 y 33). Esta sección presenta la ruta crítica, la carta Gantt, el plan de implantación, las marchas blancas, la estabilización y el momento en que se alcanza cada resultado comprometido. El detalle está en los Formularios T-14, T-15 y T-18.

7.3.1 Ruta crítica y holguras

La ruta crítica se calcula con el método de la ruta crítica sobre la red del Anexo 7.B (PMI, 2017, pp. 210–211). Una pasada hacia adelante da las fechas tempranas de cada paquete; una

Alex

pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da las tardías; LS − ES es la holgura total; la libre se mide contra el ES de los sucesores. Como los hitos del Formulario E-25 son fechas fijas, un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

El cálculo de la red vigente utiliza las 220.023 HH, los 168 paquetes con entregable, las dependencias del Anexo 7.B y diez días hábiles de revisión del CLIENTE. El T-15, sección 5, publica las fechas tempranas y tardías, las holguras y el PERT condicional. El camino que controla H12 es 4.3.1 (cierre de la marcha blanca de la Etapa 2) → 4.3.3 (acta) → revisión del CLIENTE. La garantía 4.3.4 se constituye en septiembre, en paralelo, porque es un trámite financiero que no interviene sistemas y no tiene predecesoras. La entrega calculada es el 11 de octubre de 2028 y el acta, el 25 de octubre: quedan tres días hábiles antes del límite contractual del 31 de octubre, mes 21. La Operación comienza junto con el paso a producción de la Etapa 2 y cubre ambos alcances desde el primer día (BA, art. 17.2, punto 4, p. 13). El paso se fija en el primer día hábil del mes contractual 21 posterior al cierre comercial y contable, porque no puede ocurrir en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, sección 13.3, condición 2, p. 23). Bajo el supuesto de inicio en febrero de 2027, el mes 21 es octubre de 2028, sus tres primeros días hábiles son el 2, el 3 y el 4, y el paso a producción es el jueves 5 de octubre de 2028. Lo habilita el acta de cierre de la marcha blanca de la Etapa 2, que la Contraparte Técnica firma al término del mes 20 (BA, art. 17.3, p. 13; paquete 4.3.1). El acta H12 de aceptación final del proyecto de implementación es posterior: su expediente se entrega el 11 de octubre y la revisión del CLIENTE concluye el 25 de octubre, dentro del mes 21. La Figura 7.22 muestra ese cálculo.

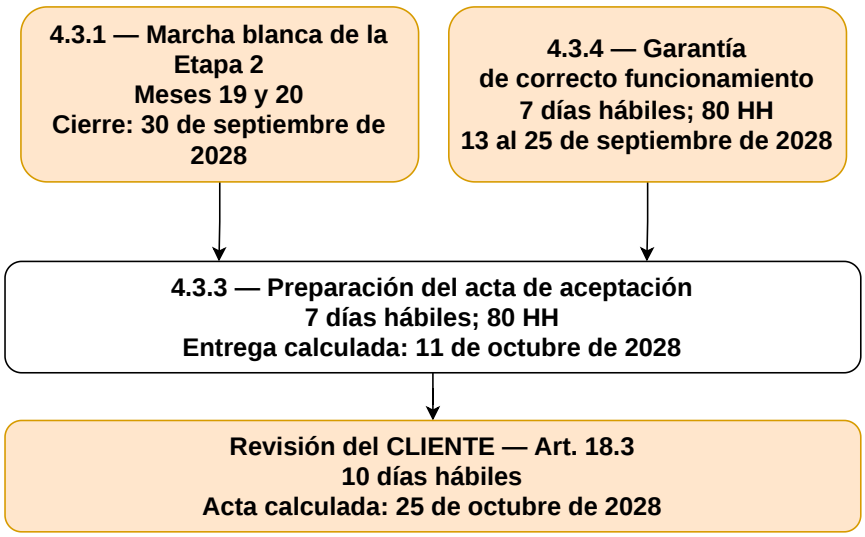


Figura 7.22 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

La Figura 7.22 distingue la entrega técnica del acta posterior a la revisión. Las holguras contractuales menores son las de H7 y H12, de dos y tres días hábiles; H8, H4 y H10 disponen de catorce, dieciséis y trece, respectivamente. Las fechas fijas de inicio de las marchas blancas,

H6 y H11, no son reservas utilizables. Las probabilidades del T-15 son aproximaciones PERT por camino, condicionadas a duraciones, productividad y recursos; no son una probabilidad de éxito global ni sustituyen la aceptación copulativa de la marcha blanca. El modelo no acredita asignaciones nominales ni elimina los riesgos de SD8.


La holgura se gestiona en la reunión semanal y el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3). Como las holguras de H7 y H12 son menores que el plazo de subsanación, sus expedientes se revisan con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal, durante las semanas finales de cada marcha blanca; toda amenaza a esos hitos se escala al Comité Ejecutivo. Una holgura positiva tampoco autoriza consumir las cuatro semanas finales de marcha blanca. El informe mensual de valor ganado comunica toda desviación mayor al 10 % y su plan dentro de cinco días hábiles (1.8.6).

La Figura 7.23 complementa la Figura 7.22: muestra en la carta Gantt los paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta los inicios de las marchas blancas, H6 y H11, cuyas fechas son fijas.

Vista de la ruta crítica

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
1	RC | 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío	01/02/27	31/03/27
22	RC | 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas	01/04/27	30/04/27
32	RC | 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica	03/05/27	31/05/27
33	RC | 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código	03/05/27	31/05/27
34	RC | 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5	03/05/27	31/05/27
35	RC | 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica	03/05/27	31/05/27
36	RC | 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala	03/05/27	20/05/27

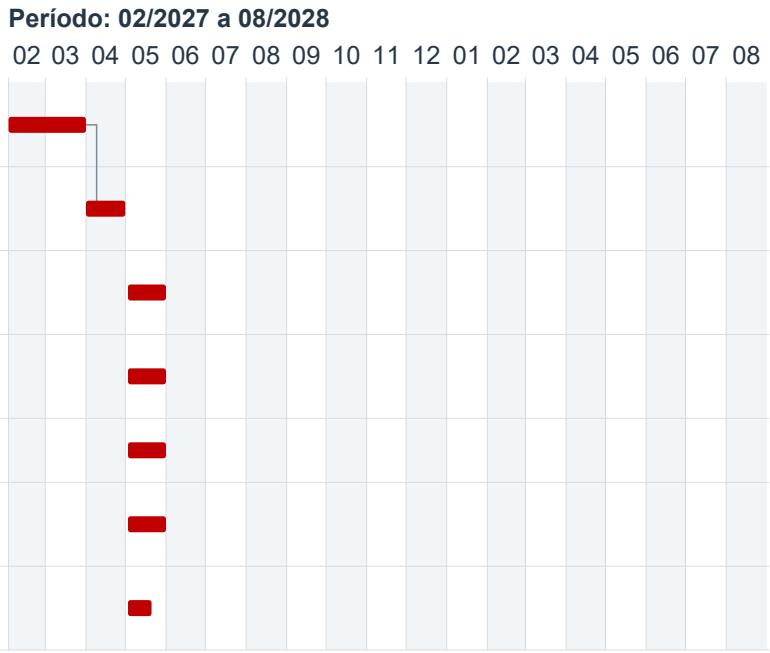


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.23 Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Vista de la ruta crítica

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
43	RC | 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2	24/05/27	09/06/27
57	RC | 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2	10/06/27	30/06/27
69	RC | 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)	18/06/27	30/09/27
105	RC | 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4	01/12/27	31/12/27
112	RC | H6 — inicio de marcha blanca (mes 13)	01/02/28	01/02/28
125	RC | 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	15/03/28	28/04/28
149	RC | H11 — inicio de marcha blanca (mes 19)	01/08/28	01/08/28

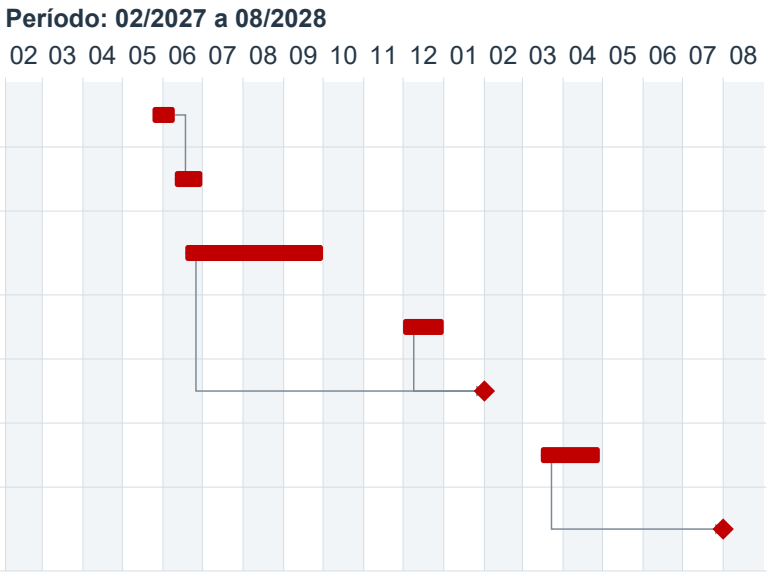

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.23 (continuación 2 de 3). Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Vista de la ruta crítica

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

1 → 22 FC desfase 0
22 → 112 CC desfase 164
33 → 69 FF desfase 0
33 → 112 CC desfase 75
34 → 69 CC desfase -37
34 → 112 CC desfase 89
35 → 112 CC desfase 122
36 → 43 FC desfase 0
43 → 57 FC desfase 0
69 → 112 CC desfase 120
105 → 112 CC desfase 25
125 → 149 CC desfase 71

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.23 (continuación 3 de 3). Vista crítica de la carta Gantt: paquetes de la ruta crítica y sus dependencias hasta H6 y H11. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

7.3.2 Carta Gantt y calendario

La carta Gantt del Formulario T-14 muestra las marchas blancas, los pasos a producción y el inicio de la Operación, sobre la estructura contractual de los 56 meses. La Tabla 7.5 ubica los doce hitos del Formulario E-25 con el paquete que entrega cada uno.

Tabla 7.5 Hitos del Formulario E-25 en el cronograma. Fuente: elaboración a partir del Formulario E-25 y (Formulario T-14).

Hito	Mes	Entregable que lo gatilla	Paquetes
H1	2	Línea base de alcance y matriz de trazabilidad	1.2.1, 1.2.4
H2	4	Arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos aprobados	2.4.1
H3	6	Infraestructura híbrida y ambientes con observabilidad	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5
H4	10	Software de la Etapa 1 con QA superado	3.8.1
H5	12	Certificación de la Etapa 1	3.8.7
H6	13	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 1	4.2.1
H8	14	Línea base y diseño de la Etapa 2	1.2.5, 2.4.2
H7	16	Paso a producción de la Etapa 1	4.2.3
H9	17	Software de la Etapa 2 con QA superado	3.9.1
H10	18	Certificación de la Etapa 2	3.9.6
H11	19	Inicio de la marcha blanca de la Etapa 2	4.3.1
H12	21	Paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final	4.3.3, 4.3.4



La tabla está ordenada por mes y no por número de hito, porque el H8 (mes 14) ocurre antes que el H7 (mes 16). Ese cruce es la expresión concreta del solapamiento: la línea base de la Etapa 2 se aprueba mientras la Etapa 1 está en su marcha blanca.

Los meses contractuales caen en meses calendario distintos según la fecha de inicio del contrato, que aún no está definida (consulta V-12). La Tabla 7.6 aplica la regla a los tres inicios que el Capítulo 3, sección 3.1.2, considera compatibles con poner la Etapa 2 en producción antes de enero de 2029, fecha desde la que rigen las condiciones de la principal cadena de supermercados.

Tabla 7.6 Meses contractuales según la fecha de inicio. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13) y (Bases Técnicas del caso, secciones 13.2 y 13.3, pp. 22–23).

Inicio	Mes 13 (H6)	Mes 16 (H7)	Meses 19 y 20	Mes 21 (H12)
Diciembre de 2026	**Diciembre de 2027**	Marzo de 2028	Junio y julio de 2028	Agosto de 2028
Febrero de 2027	Febrero de 2028	Mayo de 2028	Agosto y **septiembre** de 2028	Octubre de 2028
Marzo de 2027	Marzo de 2028	Junio de 2028	**Septiembre** y octubre de 2028	Noviembre de 2028

Ningún inicio admisible deja las dos marchas blancas completas fuera de septiembre y diciembre; el Anexo 7.A extiende el análisis a los ocho meses de inicio admisibles. Con un inicio en diciembre de 2026, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 cae en diciembre; con uno en marzo de 2027, el inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 cae en septiembre. Con febrero de 2027, en cambio, el congelamiento afecta solo el segundo mes de la marcha blanca de la Etapa 2 y no un inicio, por lo que LafroX lo adopta como supuesto de calendario del cronograma. Su costo es que las semanas de cierre de esa marcha blanca coinciden con el peak de septiembre, que la sección 7.3.5 trata. Dentro de un mes de congelamiento no se inicia ninguna ola ni se despliega ningún cambio, y la marcha blanca continúa en convivencia, con medición diaria.


La Figura 7.24 presenta la carta de los 56 meses con ese supuesto de inicio, basada en la programación en GanttProject: los períodos contractuales, las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción del 5 de mayo y del 5 de octubre de 2028 (cuarto día hábil de cada mes), el inicio de la Operación y los hitos H1 a H12.



Carta de los 56 meses

Lámina 1 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
0	Etapa 1 · Desarrollo (meses 1 a 12)	01/02/27	31/01/28
1	H1 — acta del CLIENTE (mes 2)	23/03/27	23/03/27
2	H2 — acta del CLIENTE (mes 4)	13/05/27	13/05/27
3	H3 — acta del CLIENTE (mes 6)	06/07/27	06/07/27
4	H4 — acta del CLIENTE (mes 10)	08/11/27	08/11/27
5	H5 — acta del CLIENTE (mes 12)	03/01/28	03/01/28
6	Etapa 1 · Marcha blanca (meses 13 a 15; 4.2.1)	01/02/28	28/04/28
7	H6 — inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 (mes 13)	01/02/28	01/02/28
8	Etapa 1 · Paso a producción (mes 16)	05/05/28	05/05/28

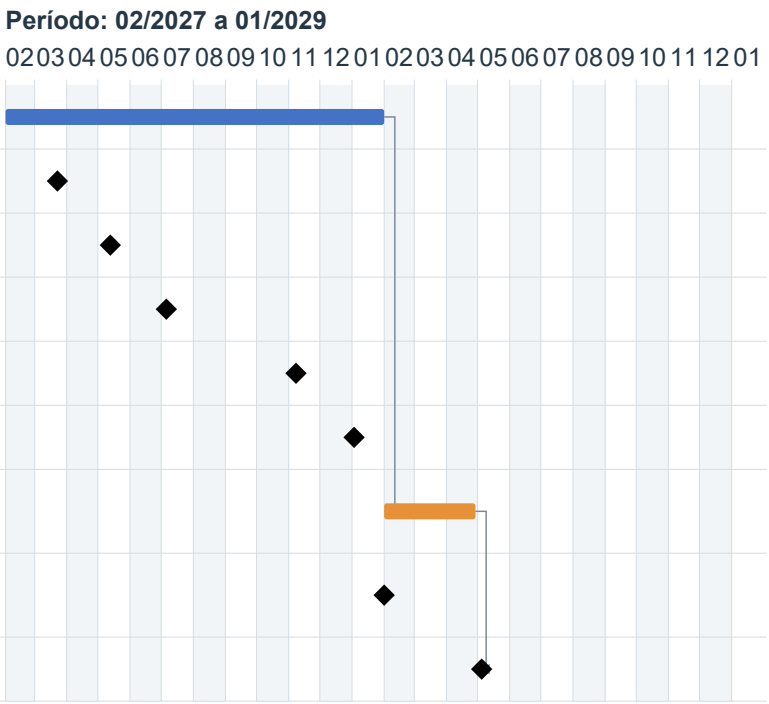


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.24 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Carta de los 56 meses

Lámina 2 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
9	Etapa 1 · Estabilización (4.2.2)	05/05/28	29/09/28
10	H7 — acta del CLIENTE (mes 16)	29/05/28	29/05/28
11	Etapa 2 · Desarrollo (meses 13 a 18)	01/02/28	31/07/28
12	H8 — acta del CLIENTE (mes 14)	13/03/28	13/03/28
13	H9 — acta del CLIENTE (mes 17)	01/06/28	01/06/28
14	H10 — acta del CLIENTE (mes 18)	12/07/28	12/07/28
15	Etapa 2 · Marcha blanca (meses 19 y 20; 4.3.1)	01/08/28	29/09/28
16	H11 — inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 (mes 19)	01/08/28	01/08/28

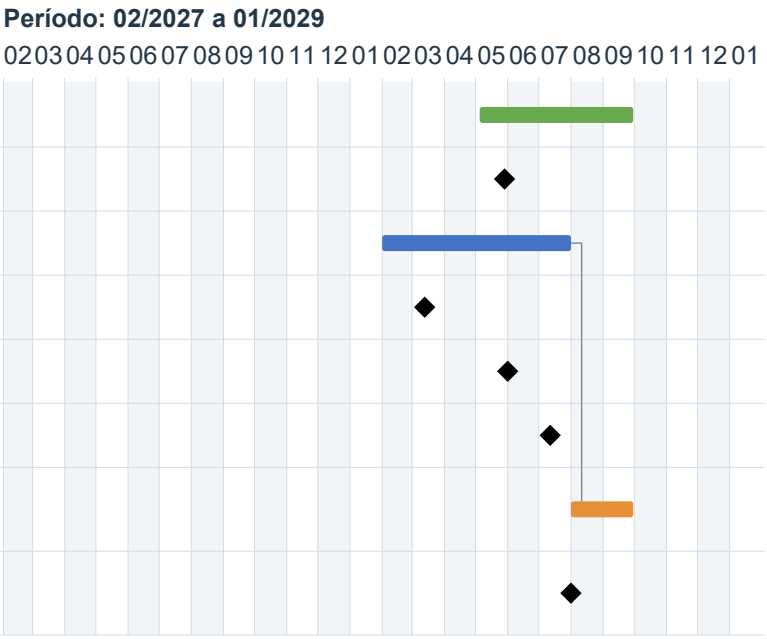


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.24 (continuación 2 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Carta de los 56 meses

Lámina 3 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
17	Etapa 2 · Paso a producción e inicio de la Operación (mes 21)	05/10/28	05/10/28
18	Etapa 2 · Estabilización (4.3.2)	05/10/28	30/11/28
19	H12 — acta del CLIENTE (mes 21)	25/10/28	25/10/28
20	Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56)	05/10/28	30/09/31

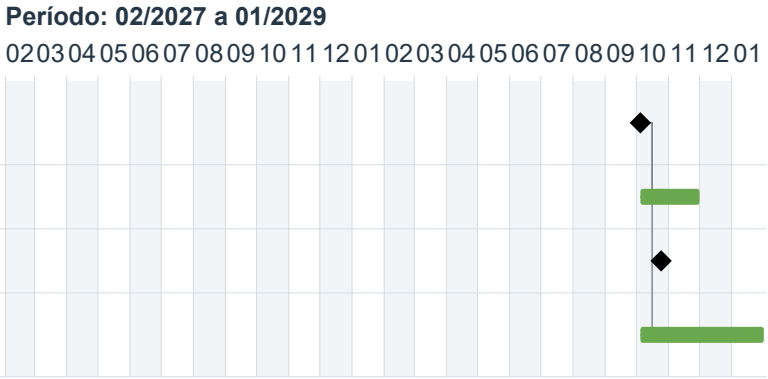


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.24 (continuación 3 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Carta de los 56 meses

Lámina 4 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
20	Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56)	05/10/28	30/09/31



RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.


Figura 7.24 (continuación 4 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Media firma: Alex Aravena

Carta de los 56 meses

Lámina 5 de 5 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
20	Operación y soporte con ambos alcances (meses 21 a 56)	05/10/28	30/09/31



RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.24 (continuación 5 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Carta de los 56 meses

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

0 → 6 FC desfase 0
6 → 8 FC desfase 0
8 → 9 FC desfase 0
11 → 15 FC desfase 0
15 → 17 FC desfase 0
17 → 18 FC desfase 0
17 → 20 FC desfase 0


Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.24 (continuación 6 de 6). Carta Gantt de los 56 meses por período contractual, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13 y Formulario E-25) y (Formulario T-14).

Las Figuras 7.25 a 7.31 detallan, en siete partes, la implementación de las Etapas 1 y 2: 155 filas ordenadas por fecha de inicio, desde febrero de 2027 hasta la estabilización de la Etapa 2, con las dependencias entre paquetes visibles. Cada fila es un paquete con entregable, un grupo de paquetes que comparten fechas o un hito, separado en la entrega del expediente y el acta del CLIENTE; el prefijo RC marca la ruta crítica. Ambas cartas están también en el Formulario T-14, sección 3.

Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

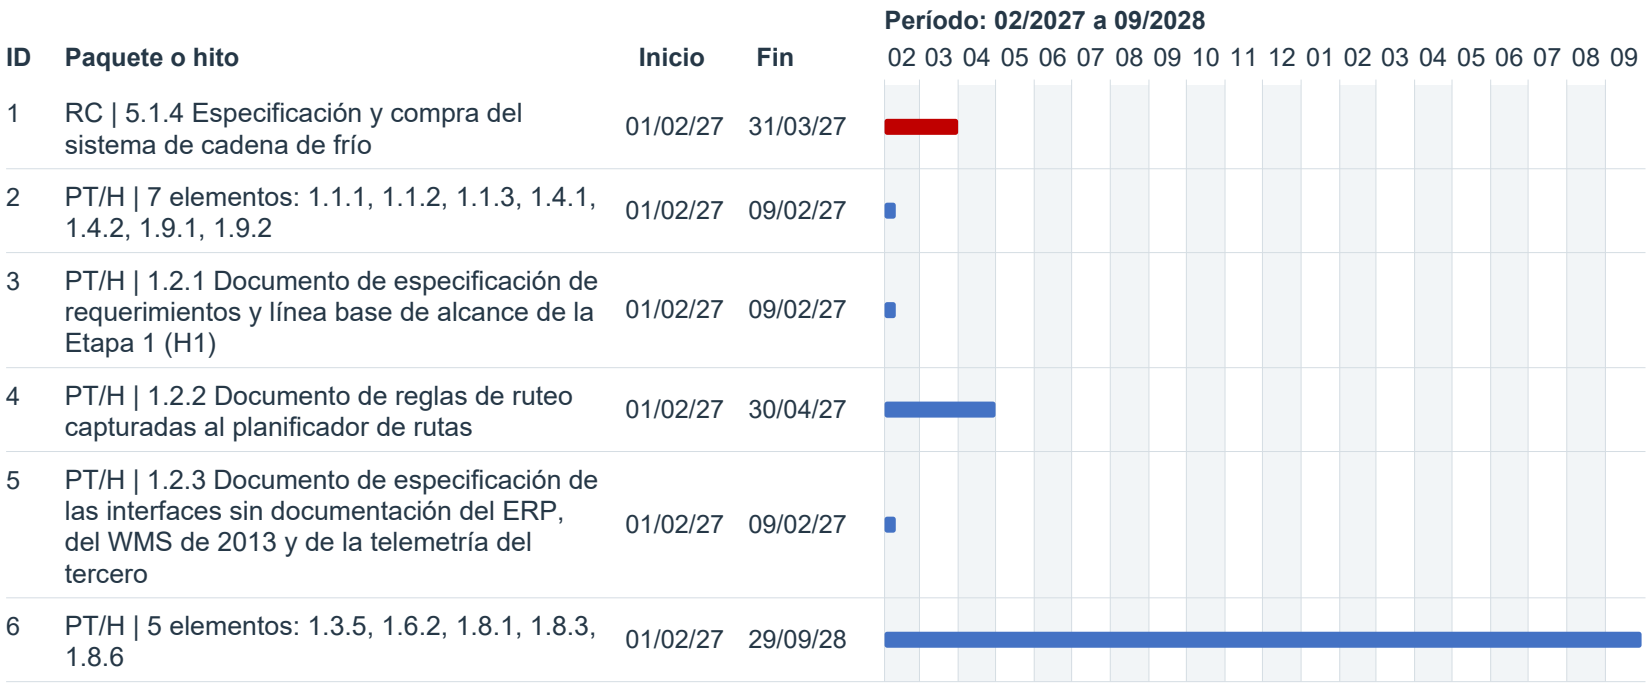


ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
1	RC | 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío	01/02/27	31/03/27
2	PT/H | 7 elementos: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.9.1, 1.9.2	01/02/27	09/02/27
3	PT/H | 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	01/02/27	09/02/27
4	PT/H | 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas	01/02/27	30/04/27
5	PT/H | 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero	01/02/27	09/02/27
6	PT/H | 5 elementos: 1.3.5, 1.6.2, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.6	01/02/27	29/09/28

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.25 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

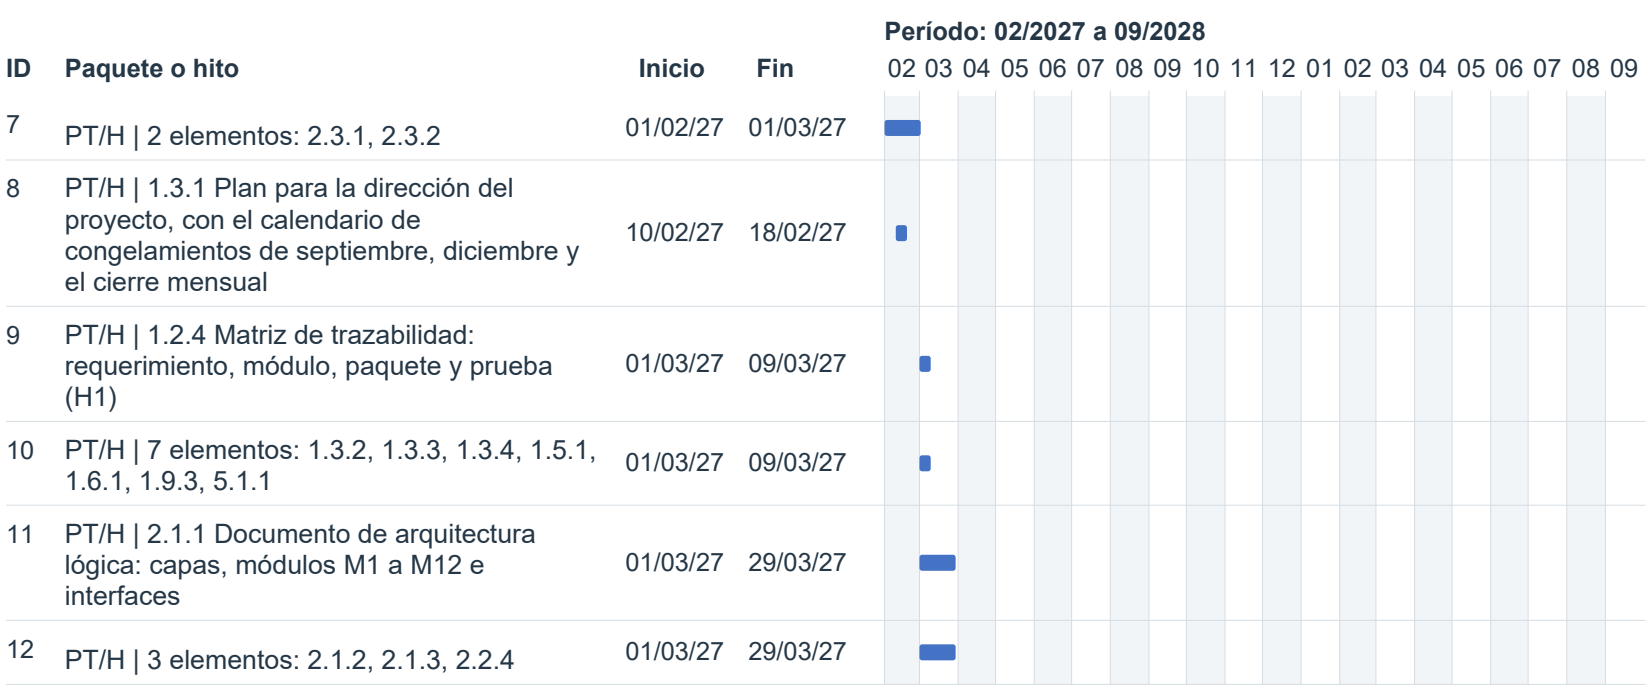


ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
7	PT/H | 2 elementos: 2.3.1, 2.3.2	01/02/27	01/03/27
8	PT/H | 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual	10/02/27	18/02/27
9	PT/H | 1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)	01/03/27	09/03/27
10	PT/H | 7 elementos: 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.9.3, 5.1.1	01/03/27	09/03/27
11	PT/H | 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces	01/03/27	29/03/27
12	PT/H | 3 elementos: 2.1.2, 2.1.3, 2.2.4	01/03/27	29/03/27

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.25 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

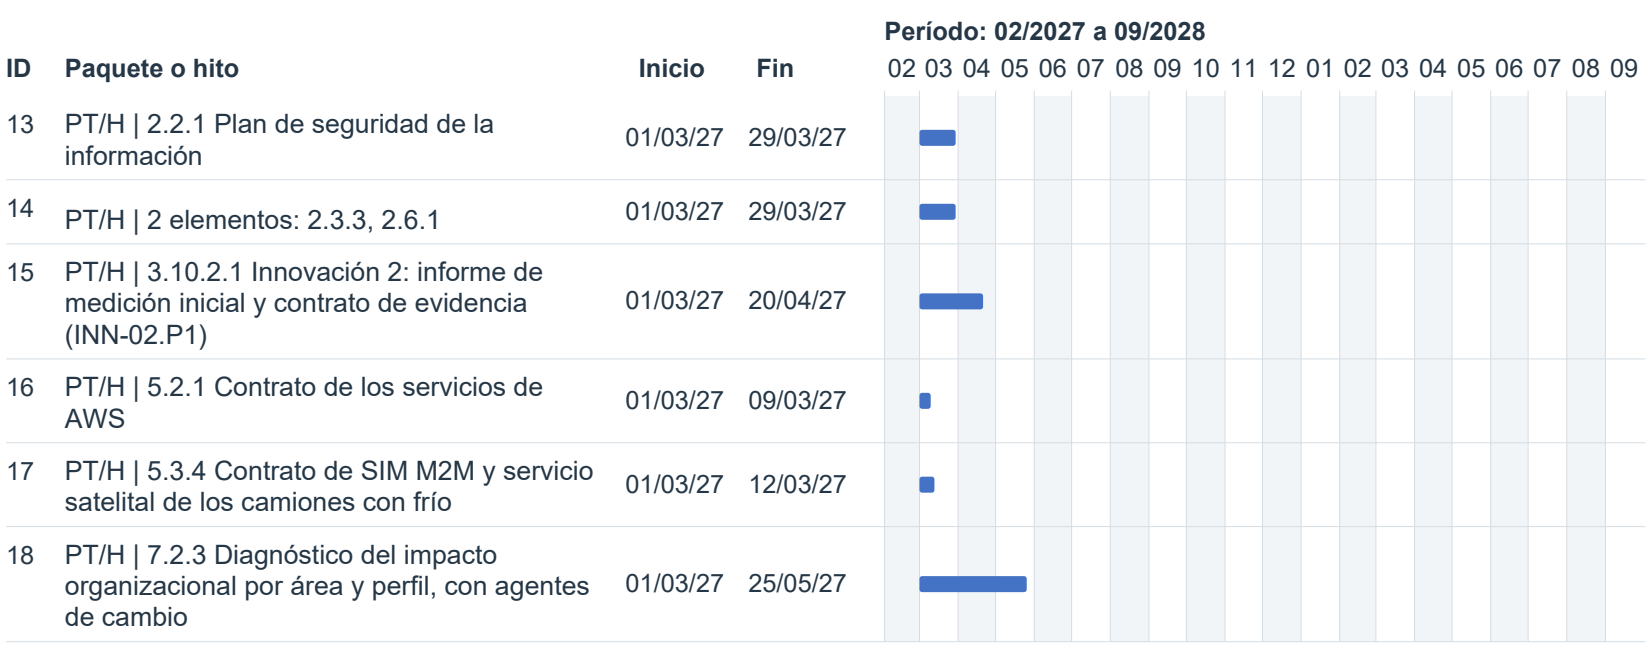

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
13	PT/H | 2.2.1 Plan de seguridad de la información	01/03/27	29/03/27
14	PT/H | 2 elementos: 2.3.3, 2.6.1	01/03/27	29/03/27
15	PT/H | 3.10.2.1 Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)	01/03/27	20/04/27
16	PT/H | 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS	01/03/27	09/03/27
17	PT/H | 5.3.4 Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío	01/03/27	12/03/27
18	PT/H | 7.2.3 Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio	01/03/27	25/05/27


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.25 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
19	PT/H | 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde	02/03/27	10/03/27
20	PT/H | H1 — entrega del expediente	09/03/27	09/03/27
21	PT/H | H1 — acta del CLIENTE (límite: mes 2)	23/03/27	23/03/27
22	RC | 2.4.3 Validación del diseño del kit en banco de pruebas	01/04/27	30/04/27
23	PT/H | 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)	01/04/27	09/04/27

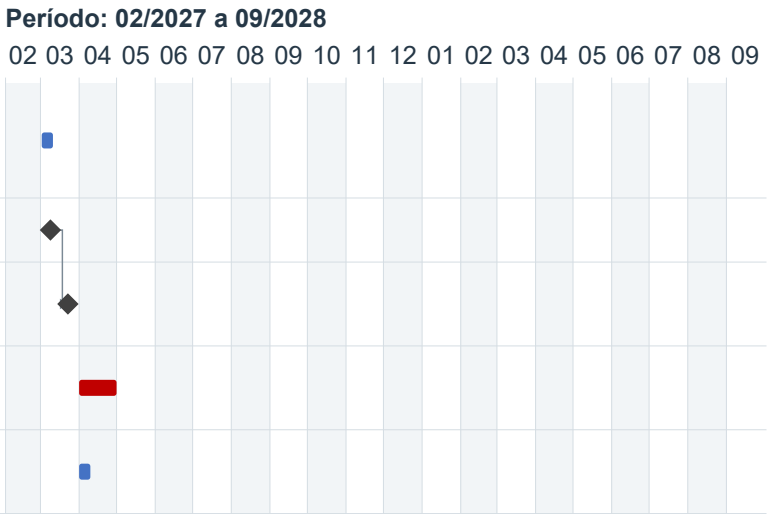

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.25 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

1 → 22 FC desfase 0
1 → 17 CC desfase 0
3 → 11 FF desfase 0
3 → 20 FC desfase -1
7 → 19 FC desfase 0
9 → 20 FC desfase -1
17 → 22 FC desfase 0
20 → 21 FC desfase 10
21 → 11 FF desfase 0


Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.25 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 1 de 7 (filas 1 a 23 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
24	PT/H | 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio	01/04/27	30/11/27
25	PT/H | 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas	01/04/27	16/04/27
26	PT/H | 2 elementos: 2.5.1, 2.5.2	01/04/27	29/04/27
27	PT/H | 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE	01/04/27	29/04/27
28	PT/H | 2 elementos: 3.10.2.2, 3.10.3.1	01/04/27	09/06/27
29	PT/H | 4 elementos: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4	01/04/27	20/04/27

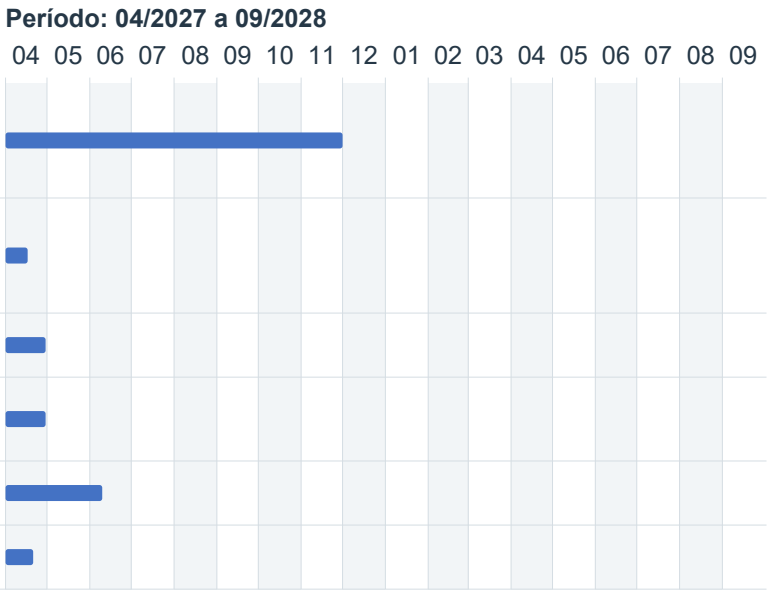


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.26 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
30	PT/H | 2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)	19/04/27	29/04/27
31	PT/H | H2 — entrega del expediente	29/04/27	29/04/27
32	RC | 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica	03/05/27	31/05/27
33	RC | 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código	03/05/27	31/05/27
34	RC | 4 elementos: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5	03/05/27	31/05/27
35	RC | 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica	03/05/27	31/05/27
36	RC | 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala	03/05/27	20/05/27

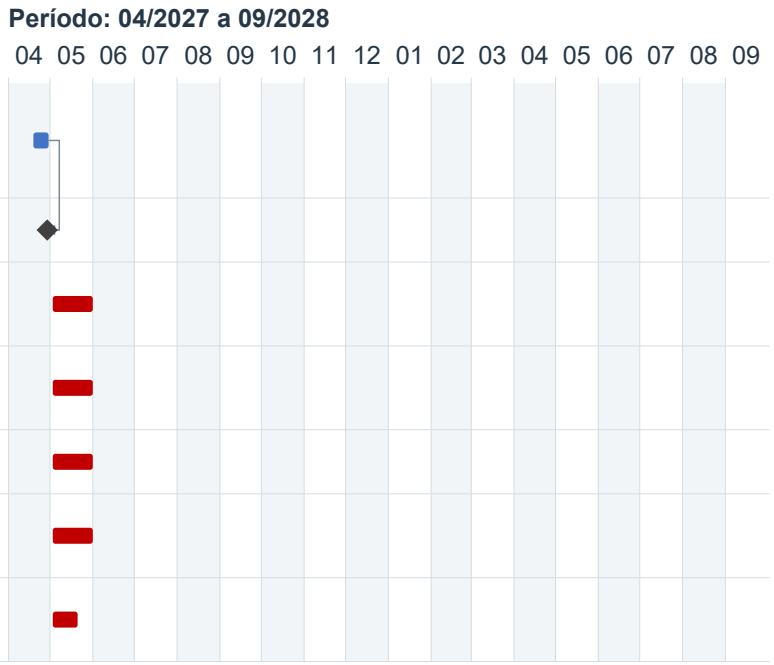


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.26 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
37	PT/H | 2.4.4 Mapeo térmico por tipo de carrocería	03/05/27	28/05/27
38	PT/H | 2 elementos: 3.11.3, 3.11.4	03/05/27	29/09/28
39	PT/H | 5 elementos: 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	03/05/27	11/05/27
40	PT/H | 6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes	03/05/27	20/05/27
41	PT/H | 6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo	03/05/27	20/05/27
42	PT/H | H2 — acta del CLIENTE (límite: mes 4)	13/05/27	13/05/27

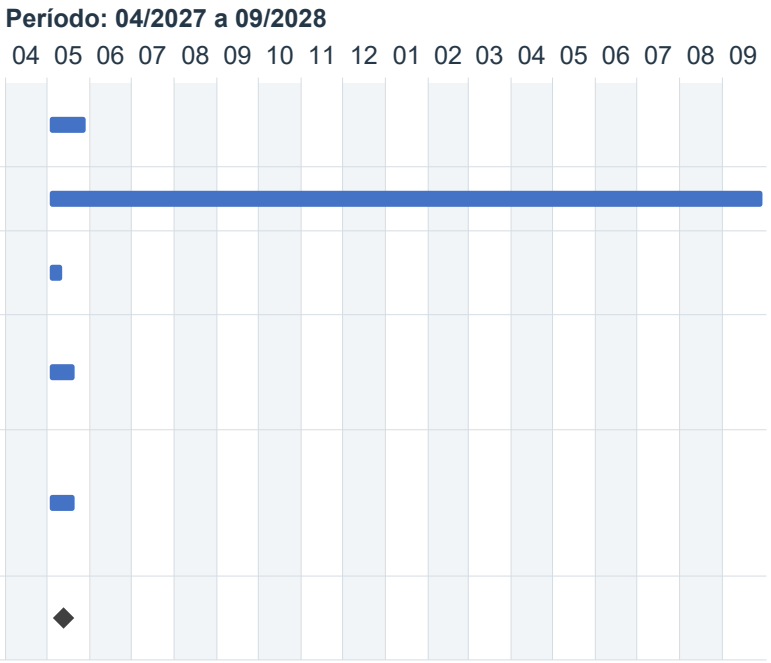


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.26 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
43	RC | 2 elementos: 6.3.1, 6.3.2	24/05/27	09/06/27
44	PT/H | 3 elementos: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	01/06/27	18/06/27
45	PT/H | 3.1.5 Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)	01/06/27	18/06/27

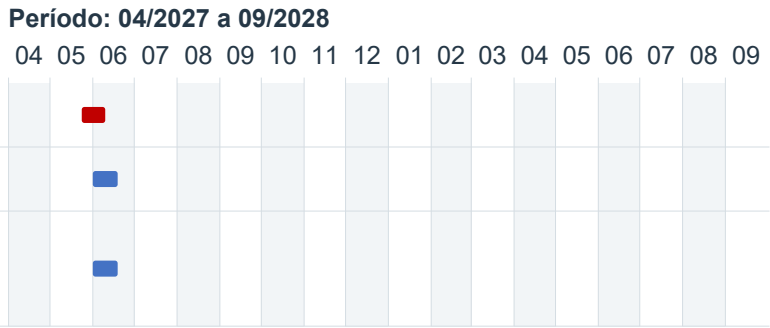

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.26 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 2 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.


11	→ 30	FC	desfase 0
12	→ 30	FC	desfase 0
13	→ 30	FC	desfase 0
16	→ 34	FC	desfase 0
16	→ 35	FC	desfase 0
19	→ 29	FC	desfase 0
19	→ 36	FC	desfase 0
22	→ 37	FC	desfase 0
25	→ 30	FC	desfase 0
29	→ 36	FC	desfase 0
30	→ 31	FC	desfase -1
31	→ 42	FC	desfase 10
34	→ 44	FC	desfase 0
36	→ 43	FC	desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.26 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 2 de 7 (filas 24 a 45 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

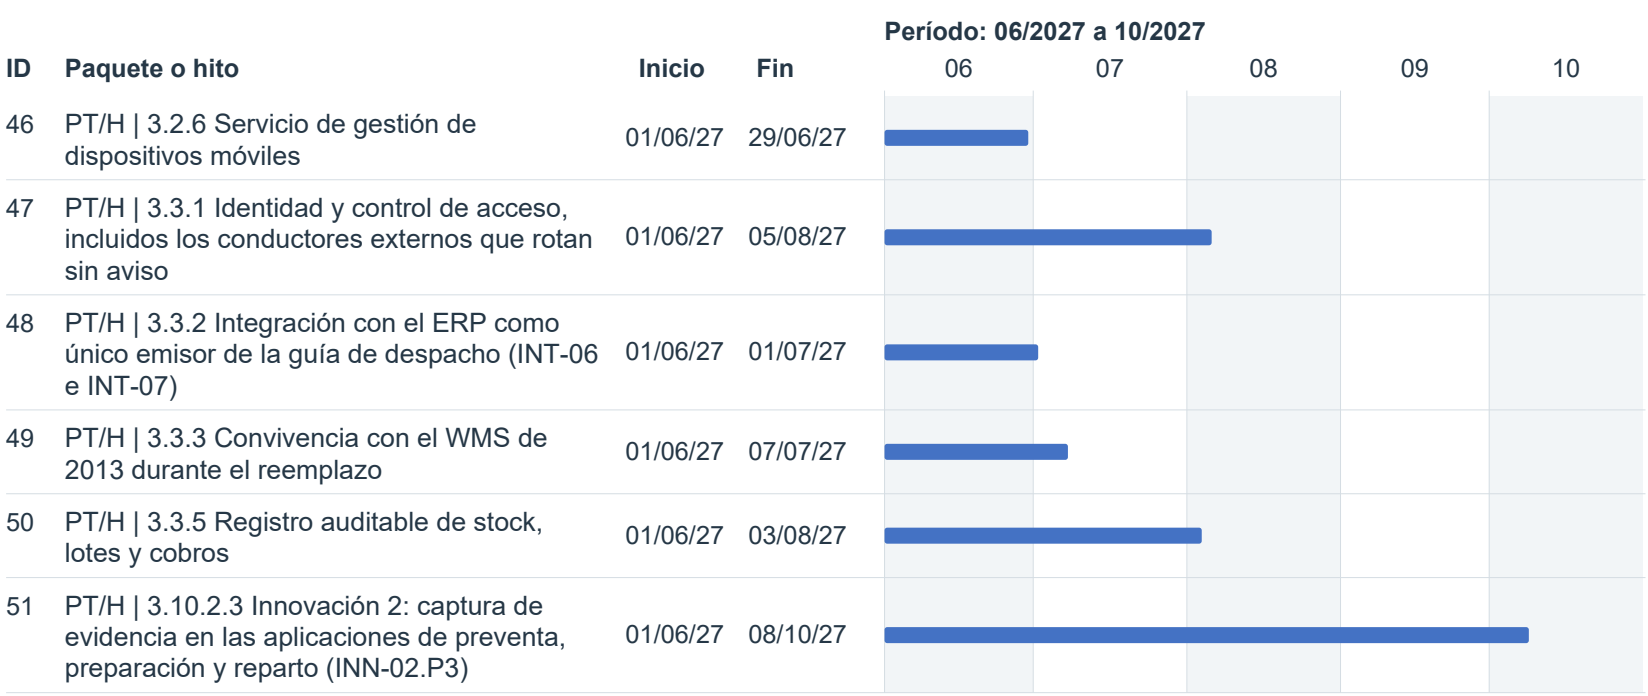


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.27 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
52	PT/H | 5.1.3 Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX	01/06/27	09/06/27
53	PT/H | 6.4.1 Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado	01/06/27	18/06/27
54	PT/H | 3.3.6 Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD	07/06/27	03/08/27
55	PT/H | 3.10.3.2 Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)	07/06/27	20/09/27
56	PT/H | 6.4.2 Hardware de videovigilancia instalado	07/06/27	24/06/27
57	RC | 2 elementos: 6.6.1, 6.6.2	10/06/27	30/06/27

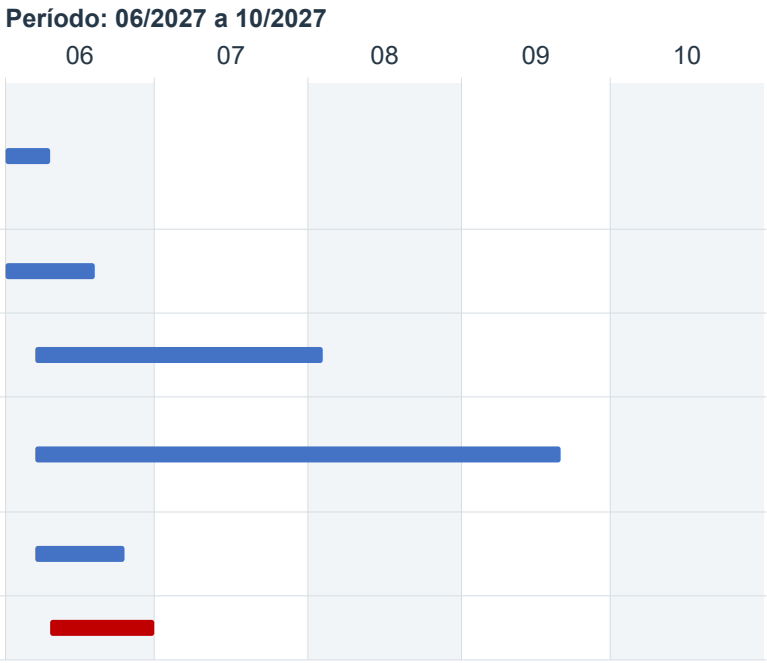


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.27 (continuación 2 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
58	PT/H | 3.3.4 Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)	10/06/27	12/07/27
59	PT/H | 3.4.1 Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)	10/06/27	10/08/27
60	PT/H | 3.4.2 Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)	10/06/27	11/08/27
61	PT/H | 3.4.10 Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)	10/06/27	04/10/27
62	PT/H | 6.6.3 Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada	10/06/27	18/06/27
63	PT/H | 3.4.3 Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)	14/06/27	18/08/27

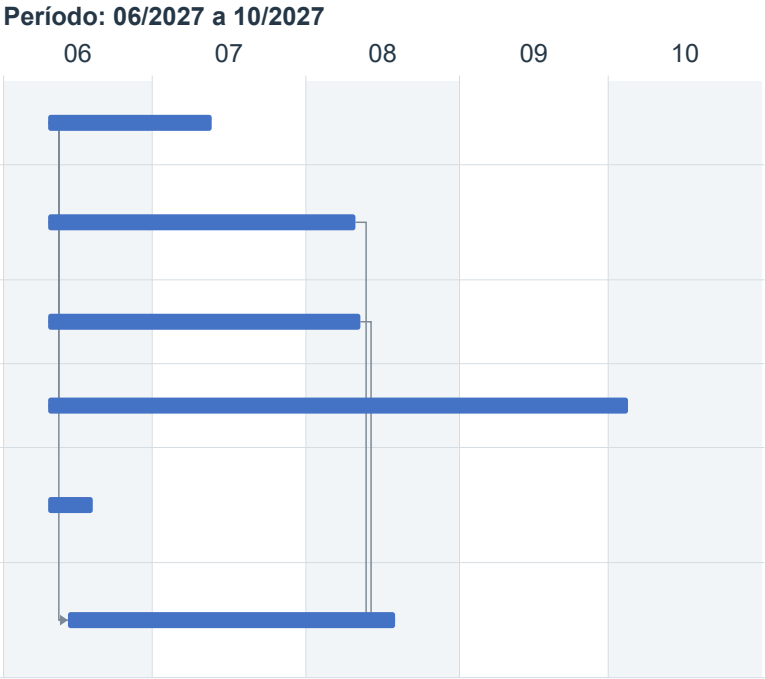


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.27 (continuación 3 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
64	PT/H | 3.4.4 Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)	14/06/27	29/09/27
65	PT/H | 3.4.5 Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12)	14/06/27	30/08/27
66	PT/H | 3.4.6 Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)	16/06/27	17/08/27
67	PT/H | 3.4.7 Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)	16/06/27	08/09/27

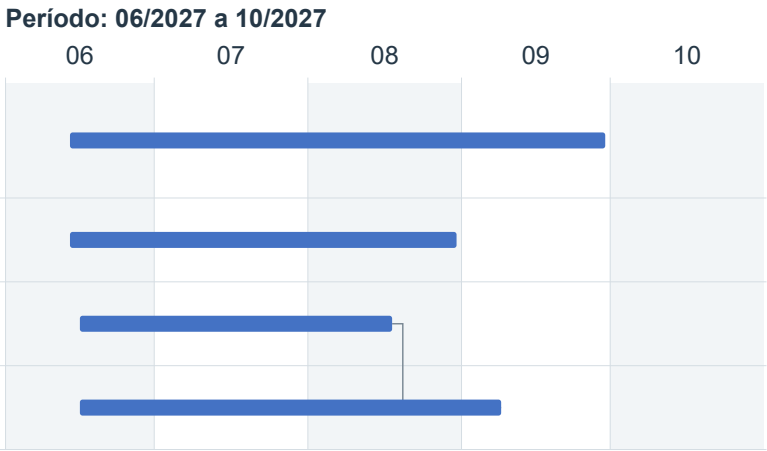

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.27 (continuación 4 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

4 → 67 FC desfase 0
5 → 48 FC desfase 0
13 → 47 FC desfase 0
16 → 46 FC desfase 0
22 → 64 FC desfase 0
22 → 65 FC desfase 0
27 → 59 FC desfase 0
27 → 60 FC desfase 0
27 → 63 FC desfase 0
27 → 64 FC desfase 0
27 → 65 FC desfase 0
27 → 66 FC desfase 0
27 → 67 FC desfase 0
27 → 61 FC desfase 0
30 → 59 FC desfase 0
30 → 60 FC desfase 0
30 → 63 FC desfase 0
30 → 64 FC desfase 0
30 → 65 FC desfase 0
30 → 66 FC desfase 0
30 → 67 FC desfase 0
30 → 61 FC desfase 0
33 → 59 FF desfase 0
33 → 60 FF desfase 0
33 → 63 FF desfase 0
33 → 64 FF desfase 0
33 → 65 FF desfase 0
33 → 66 FF desfase 0
33 → 67 FF desfase 0
33 → 61 FF desfase 0
35 → 65 FC desfase 0
37 → 64 FC desfase 0
37 → 65 FC desfase 0
41 → 57 FC desfase 0
41 → 62 FC desfase 0
42 → 59 FC desfase 0
42 → 60 FC desfase 0
42 → 63 FC desfase 0
42 → 64 FC desfase 0
42 → 65 FC desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.27 (continuación 5 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

42 → 66	FC	desfase 0	45 → 61	FF	desfase 0
42 → 67	FC	desfase 0	47 → 59	CC	desfase 0
42 → 61	FC	desfase 0	47 → 60	CC	desfase 0
43 → 57	FC	desfase 0	47 → 63	CC	desfase 0
43 → 62	FC	desfase 0	47 → 64	CC	desfase 0
44 → 59	FF	desfase 0	47 → 65	CC	desfase 0
44 → 60	FF	desfase 0	47 → 66	CC	desfase 0
44 → 63	FF	desfase 0	47 → 67	CC	desfase 0
44 → 64	FF	desfase 0	47 → 61	CC	desfase 0
44 → 65	FF	desfase 0	48 → 59	CC	desfase 0
44 → 66	FF	desfase 0	48 → 60	CC	desfase 0
44 → 67	FF	desfase 0	48 → 63	CC	desfase 0
44 → 61	FF	desfase 0	48 → 64	CC	desfase 0
45 → 59	FF	desfase 0	48 → 65	CC	desfase 0
45 → 60	FF	desfase 0	48 → 66	CC	desfase 0
45 → 63	FF	desfase 0	48 → 67	CC	desfase 0
45 → 64	FF	desfase 0	48 → 61	CC	desfase 0
45 → 65	FF	desfase 0	49 → 59	CC	desfase 0
45 → 66	FF	desfase 0	49 → 60	CC	desfase 0
45 → 67	FF	desfase 0	49 → 63	CC	desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.27 (continuación 6 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 3 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

49 → 64	CC	desfase 0	
49 → 65	CC	desfase 0	
49 → 66	CC	desfase 0	
49 → 67	CC	desfase 0	
49 → 61	CC	desfase 0	
50 → 59	CC	desfase 0	
50 → 60	CC	desfase 0	
50 → 63	CC	desfase 0	
50 → 64	CC	desfase 0	
50 → 65	CC	desfase 0	
50 → 66	CC	desfase 0	
50 → 67	CC	desfase 0	
50 → 61	CC	desfase 0	
54 → 59	CC	desfase 0	
54 → 60	CC	desfase 0	
54 → 63	CC	desfase 0	
54 → 64	CC	desfase 0	
54 → 65	CC	desfase 0	
54 → 66	CC	desfase 0	
54 → 67	CC	desfase 0	
54 → 61	CC	desfase 0	
58 → 59	CC	desfase 0	
58 → 60	CC	desfase 0	
58 → 63	CC	desfase 0	
58 → 64	CC	desfase 0	
58 → 65	CC	desfase 0	
58 → 66	CC	desfase 0	
58 → 67	CC	desfase 0	
58 → 61	CC	desfase 0	
59 → 63	FF	desfase 2	
59 → 64	FF	desfase 2	
60 → 63	FF	desfase 2	
60 → 64	FF	desfase 2	
60 → 66	CC	desfase 0	
63 → 67	FF	desfase 2	
66 → 67	FF	desfase 2	
68 → 61	FF	desfase 2	


Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.27 (continuación 7 de 7). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 3 de 7 (filas 46 a 67 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
68	PT/H | 3.4.8 Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto)	16/06/27	09/09/27
69	RC | 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)	18/06/27	30/09/27
70	PT/H | H3 — entrega del expediente	18/06/27	18/06/27
71	PT/H | 6.4.3 Recinto de custodia de respaldos habilitado	22/06/27	09/07/27
72	PT/H | 2 elementos: 1.5.2, 3.11.5	01/07/27	29/09/28
73	PT/H | 3 elementos: 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4	01/07/27	02/08/27
74	PT/H | 6.2.2 Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built	01/07/27	20/07/27
75	PT/H | H3 — acta del CLIENTE (límite: mes 6)	06/07/27	06/07/27

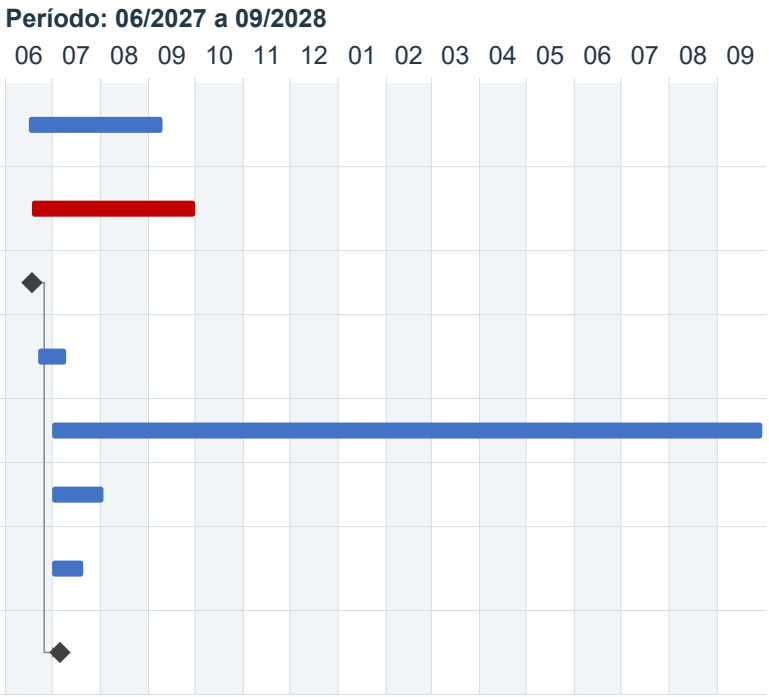


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.28 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
76	PT/H | 3.6.1 Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores	02/08/27	01/09/27
77	PT/H | 3.10.1.1 Innovación 1: documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1)	02/08/27	08/10/27
78	PT/H | 5.4.4 Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente	02/08/27	10/08/27
79	PT/H | 6.2.3 Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción	02/08/27	19/08/27
80	PT/H | 3.7.1 Informe de perfilamiento y datos saneados	04/08/27	01/10/27
81	PT/H | 6.5.4 Kit de cadena de frío instalado y recibido en los 28 camiones con frío	01/09/27	14/01/28

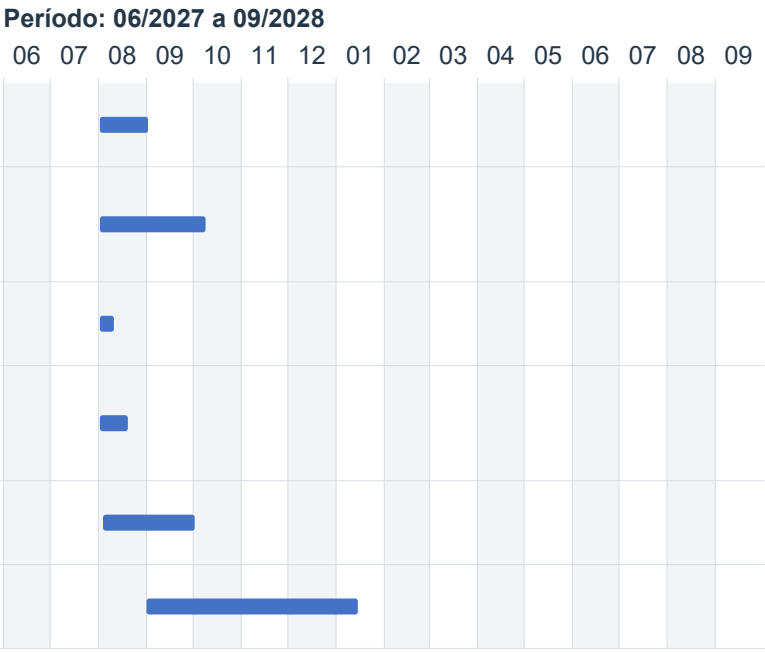


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.28 (continuación 2 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
82	PT/H | 7.2.4 Procedimientos operativos rediseñados, contingencia de frío y ruptura confirmada	01/09/27	29/09/28
83	PT/H | 3.4.11 Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica)	02/09/27	27/09/27
84	PT/H | Cuatro kits de frío recibidos para el piloto	30/09/27	30/09/27
85	PT/H | 3 elementos: 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.3.3	01/10/27	19/11/27
86	PT/H | 2 elementos: 5.4.1, 5.4.2	01/10/27	12/10/27
87	PT/H | 6.3.4 Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma	01/10/27	20/10/27

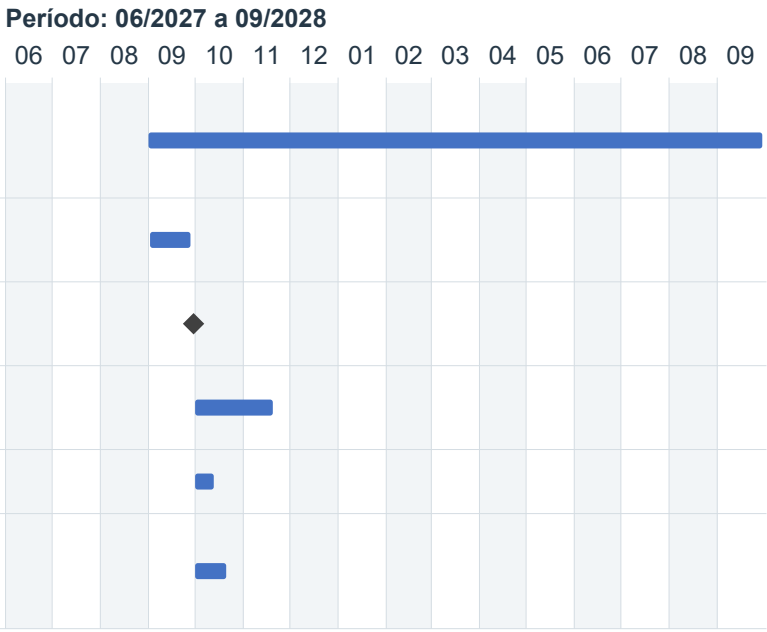


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.28 (continuación 3 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
88	PT/H | 3.7.2 Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones	04/10/27	03/11/27
89	PT/H | 3.8.1 Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)	05/10/27	22/10/27

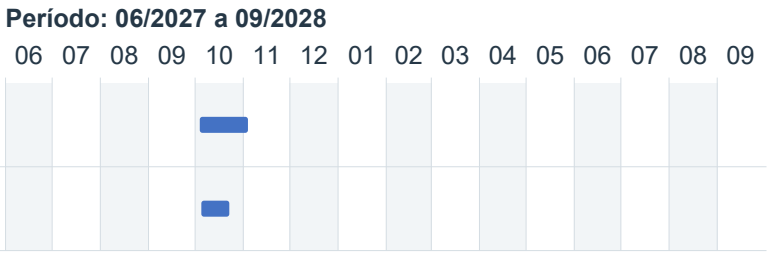

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.28 (continuación 4 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

1 → 81 FC desfase 0	45 → 69 FF desfase 0
22 → 81 FC desfase 0	45 → 83 FF desfase 0
27 → 68 FC desfase 0	45 → 70 FC desfase -1
27 → 69 FC desfase 0	47 → 68 CC desfase 0
27 → 83 FC desfase 0	47 → 69 CC desfase 0
30 → 68 FC desfase 0	47 → 83 CC desfase 0
30 → 69 FC desfase 0	48 → 68 CC desfase 0
30 → 83 FC desfase 0	48 → 69 CC desfase 0
33 → 68 FF desfase 0	48 → 83 CC desfase 0
33 → 69 FF desfase 0	49 → 68 CC desfase 0
33 → 83 FF desfase 0	49 → 69 CC desfase 0
37 → 81 FC desfase 0	49 → 83 CC desfase 0
42 → 68 FC desfase 0	50 → 68 CC desfase 0
42 → 69 FC desfase 0	50 → 69 CC desfase 0
42 → 83 FC desfase 0	50 → 83 CC desfase 0
44 → 68 FF desfase 0	54 → 68 CC desfase 0
44 → 69 FF desfase 0	54 → 69 CC desfase 0
44 → 83 FF desfase 0	54 → 83 CC desfase 0
44 → 70 FC desfase -1	58 → 68 CC desfase 0
45 → 68 FF desfase 0	58 → 69 CC desfase 0

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.28 (continuación 5 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 4 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

58 → 83 CC desfase 0
59 → 89 FC desfase 0
60 → 89 FC desfase 0
61 → 89 FC desfase 0
62 → 70 FC desfase -1
63 → 68 FF desfase 2
63 → 89 FC desfase 0
64 → 89 FC desfase 0
65 → 89 FC desfase 0
66 → 68 FF desfase 2
66 → 89 FC desfase 0
67 → 89 FC desfase 0
68 → 89 FC desfase 0
69 → 89 FC desfase 0
70 → 75 FC desfase 10
73 → 89 FC desfase 0
76 → 89 FC desfase 0
81 → 84 CC desfase 0
83 → 89 FC desfase 0


Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.28 (continuación 6 de 6). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 4 de 7 (filas 68 a 89 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
90	PT/H | 6.5.1 Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados	06/10/27	14/01/28
91	PT/H | 6.5.3 Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción	06/10/27	25/11/27
92	PT/H | 6.5.6 Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas	06/10/27	14/01/28
93	PT/H | H4 — entrega del expediente	22/10/27	22/10/27
94	PT/H | 2 elementos: 3.8.2, 3.8.3	25/10/27	19/11/27
95	PT/H | 4 elementos: 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8	25/10/27	11/11/27
96	PT/H | 3.11.2 Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño	02/11/27	29/09/28

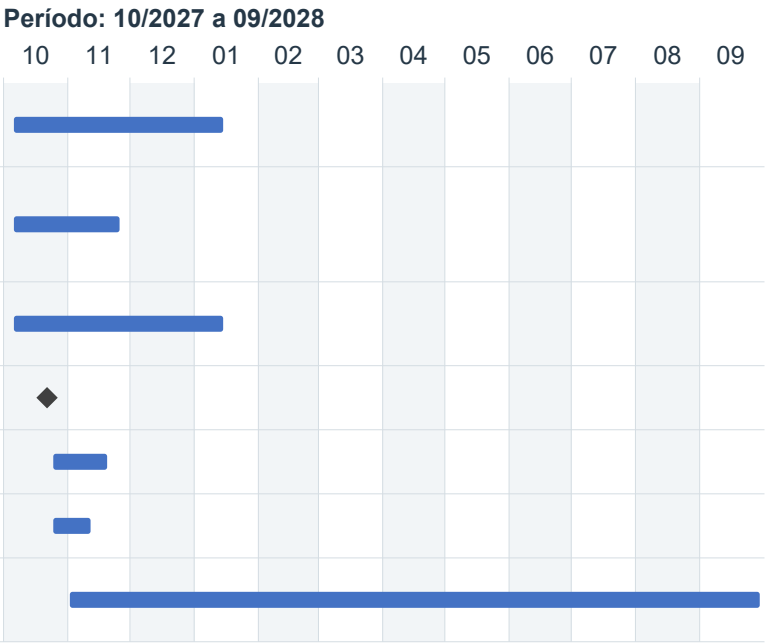


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.29 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
97	PT/H | 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking	02/11/27	10/11/27
98	PT/H | 2 elementos: 7.1.1, 7.1.6	02/11/27	24/12/27
99	PT/H | 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales	02/11/27	31/07/28
100	PT/H | 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía	02/11/27	31/05/28
101	PT/H | 2 elementos: 6.5.2, 6.5.5	04/11/27	14/01/28
102	PT/H | H4 — acta del CLIENTE (límite: mes 10)	08/11/27	08/11/27
103	PT/H | 4.1.4 Piloto de cadena de frío en cuatro camiones	09/11/27	20/12/27

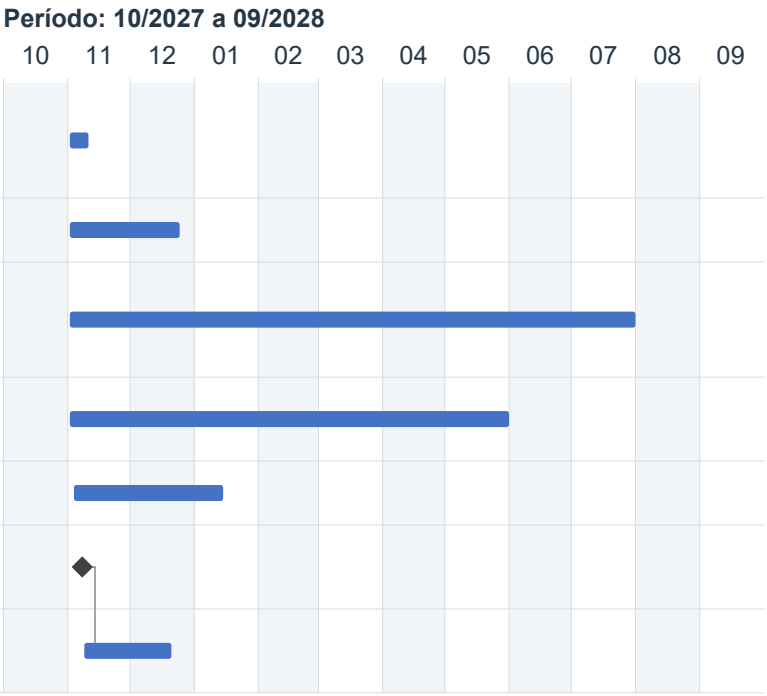


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.29 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
104	PT/H | 3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)	22/11/27	01/12/27
105	RC | 2 elementos: 3.7.3, 3.7.4	01/12/27	31/12/27
106	PT/H | 3 elementos: 3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4	01/12/27	20/03/28
107	PT/H | 4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP	01/12/27	10/12/27
108	PT/H | 7.1.3 Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo	01/12/27	29/09/28
109	PT/H | H5 — entrega del expediente	01/12/27	01/12/27
110	PT/H | 3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento	03/01/28	27/01/28

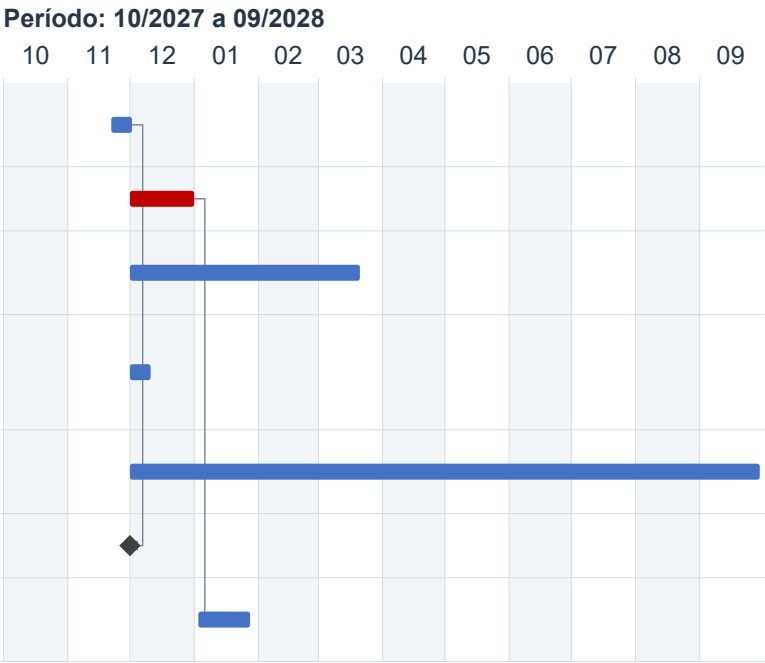


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.29 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID



RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.29 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 5 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

17 → 103 FC desfase 0
22 → 103 FC desfase 0
37 → 103 FC desfase 0
46 → 90 FC desfase 0
64 → 103 FC desfase 0
65 → 103 FC desfase 0
80 → 110 FF desfase 3
84 → 103 FC desfase 0
88 → 110 FF desfase 3
89 → 94 FC desfase 0
89 → 95 FC desfase 0
89 → 103 FC desfase 0
89 → 93 FC desfase -1
93 → 102 FC desfase 10
94 → 104 FC desfase 0
95 → 104 FC desfase 0
102 → 103 FC desfase 0
104 → 109 FC desfase -1
105 → 110 FF desfase 3
109 → 111 FC desfase 10

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.29 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 5 de 7 (filas 90 a 111 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID



ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
112	RC | H6 — inicio de marcha blanca (mes 13)	01/02/28	01/02/28
113	PT/H | 1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)	01/02/28	09/02/28
114	PT/H | 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas	01/02/28	16/02/28
115	PT/H | 3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)	01/02/28	04/07/28
116	PT/H | 3.10.4.1 Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)	01/02/28	21/03/28
117	PT/H | 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)	01/02/28	28/04/28


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.30 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
118	PT/H | 7.2.5 Medición de la adopción y plan de acción correctiva	01/02/28	31/10/28
119	PT/H | 7.3.1 Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)	01/02/28	24/03/28
120	PT/H | 2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)	17/02/28	28/02/28
121	PT/H | H8 — entrega del expediente	28/02/28	28/02/28
122	PT/H | Inicio de la ola 3 de reparto	29/02/28	29/02/28
123	PT/H | 3.10.4.2 Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)	01/03/28	19/04/28
124	PT/H | H8 — acta del CLIENTE (límite: mes 14)	13/03/28	13/03/28

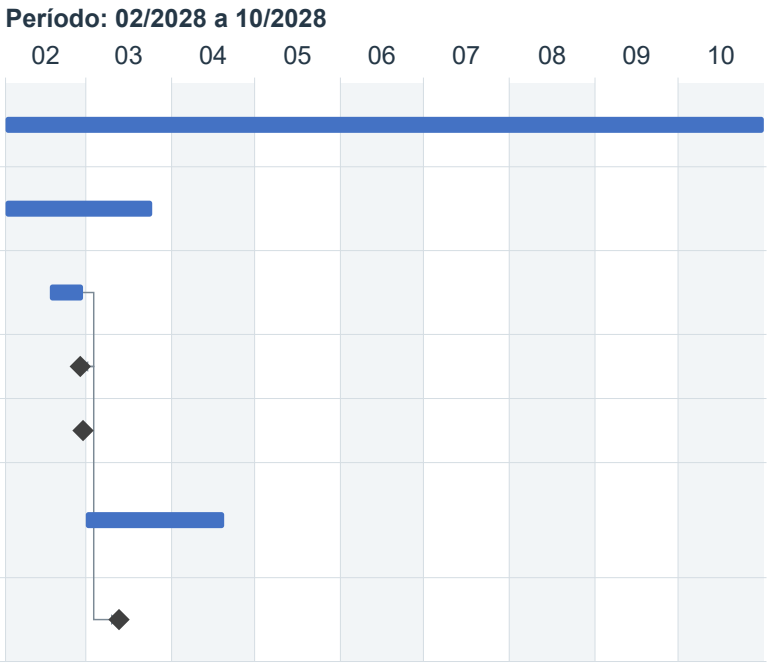


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.30 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
125	RC | 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	15/03/28	28/04/28
126	PT/H | 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación	03/04/28	11/04/28
127	PT/H | 3.10.4.3 Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)	03/04/28	09/06/28
128	PT/H | 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad	03/04/28	31/10/28
129	PT/H | 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE	03/04/28	29/09/28
130	PT/H | 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)	02/05/28	18/05/28

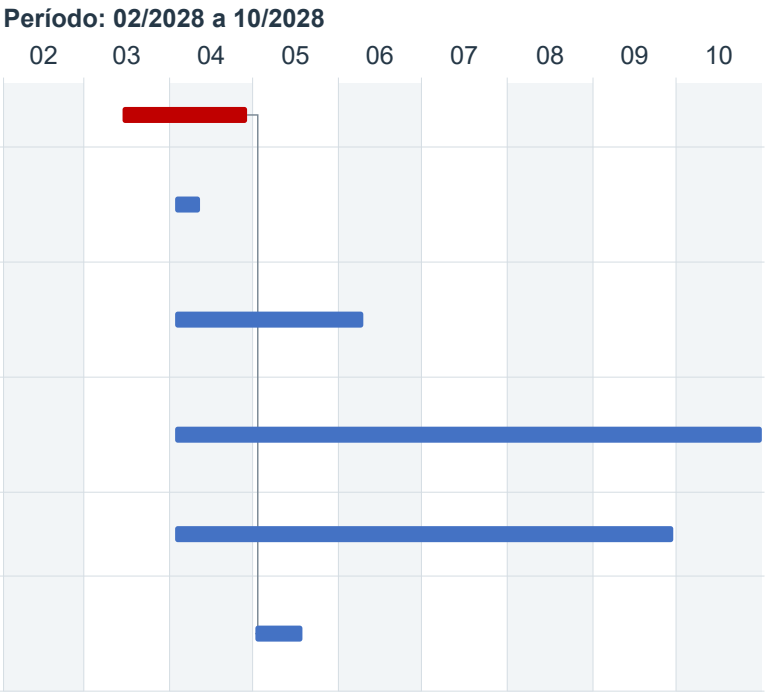


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.30 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
131	PT/H | 4.2.2 Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente	05/05/28	29/09/28
132	PT/H | 7.2.2 Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas	02/05/28	23/06/28
133	PT/H | 4.2.3 Acta de aceptación de la Etapa 1 (H7)	05/05/28	15/05/28

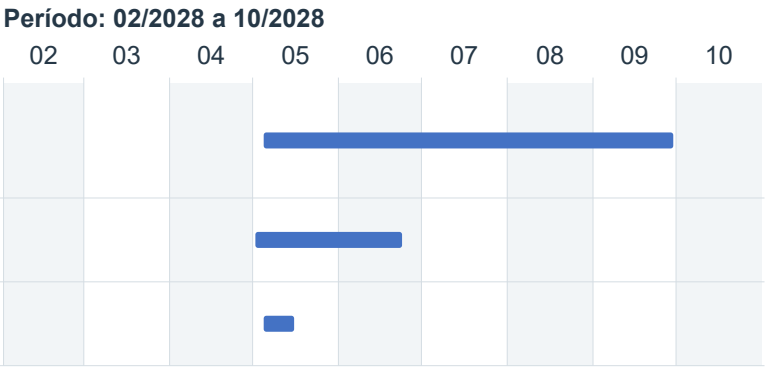

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.30 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

81 → 122 FC desfase -1
86 → 122 FC desfase -1
97 → 117 FC desfase 0
103 → 122 FC desfase -1
107 → 117 FC desfase 0
110 → 117 FC desfase 0
111 → 117 FC desfase 0
113 → 120 FC desfase 0
113 → 125 FC desfase 0
113 → 121 FC desfase -1
114 → 120 FC desfase 0
117 → 133 FC desfase 0
117 → 112 CC desfase 0
119 → 133 FC desfase 0
120 → 125 FC desfase 0
120 → 121 FC desfase -1
121 → 124 FC desfase 10
124 → 125 FC desfase 0
125 → 130 FC desfase 0


Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.30 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 6 de 7 (filas 112 a 133 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
134	PT/H | H7 — entrega del expediente	15/05/28	15/05/28
135	PT/H | H9 — entrega del expediente	18/05/28	18/05/28
136	PT/H | 3 elementos: 3.9.3, 3.9.4, 3.9.7	19/05/28	01/06/28
137	PT/H | 3.9.5 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente	19/05/28	26/05/28
138	RC | H7 — acta del CLIENTE (límite: mes 16)	29/05/28	29/05/28
139	PT/H | 3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)	01/06/28	23/08/28
140	PT/H | 4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00	01/06/28	09/06/28

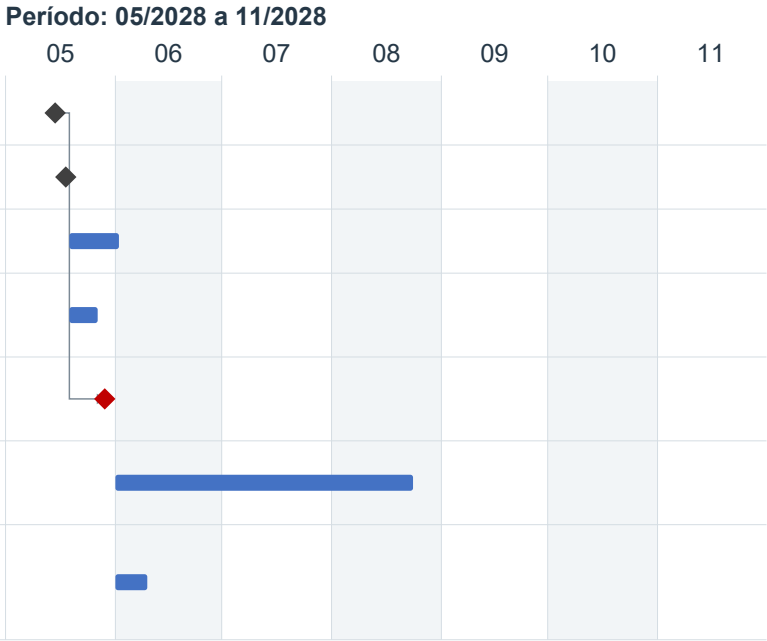


RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.31 Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 2 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
141	PT/H | 5.4.3 Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)	01/06/28	09/06/28
142	PT/H | H9 — acta del CLIENTE (límite: mes 17)	01/06/28	01/06/28
143	PT/H | 3.9.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas	02/06/28	15/06/28
144	PT/H | 3.9.6 Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)	16/06/28	28/06/28
145	PT/H | H10 — entrega del expediente	28/06/28	28/06/28
146	PT/H | 3.10.4.4 Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)	03/07/28	29/09/28

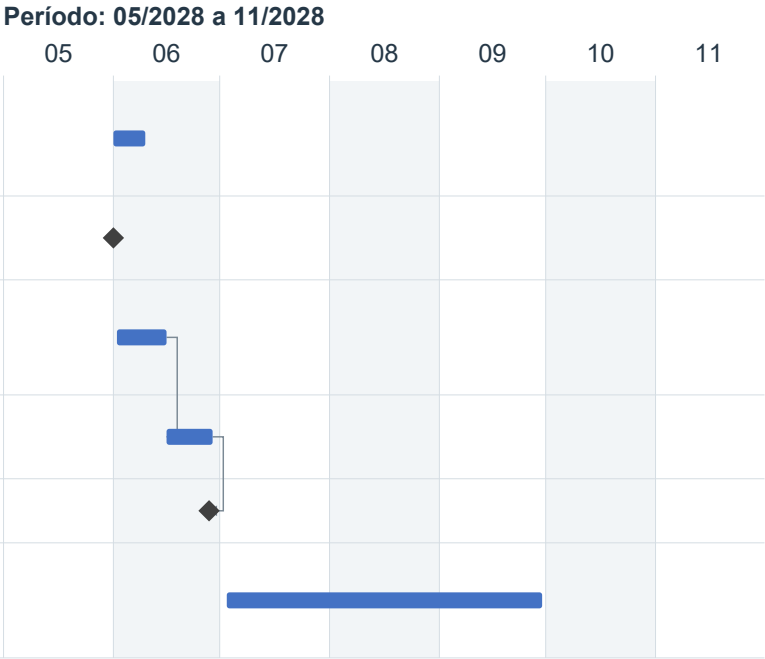

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.31 (continuación 2 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Media firma: Alex Aravena

Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
147	PT/H | 7.3.2 Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)	03/07/28	25/07/28
148	PT/H | H10 — acta del CLIENTE (límite: mes 18)	12/07/28	12/07/28
149	RC | H11 — inicio de marcha blanca (mes 19)	01/08/28	01/08/28
150	PT/H | 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)	01/08/28	29/09/28
151	PT/H | 4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)	13/09/28	25/09/28
152	PT/H | 4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas	05/10/28	30/11/28




RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.31 (continuación 3 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Lámina 4 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
153	PT/H | 4.3.3 Acta de aceptación final de la implementación (H12)	02/10/28	11/10/28
154	PT/H | H12 — entrega del expediente	11/10/28	11/10/28
155	RC | H12 — acta del CLIENTE (límite: mes 21)	25/10/28	25/10/28

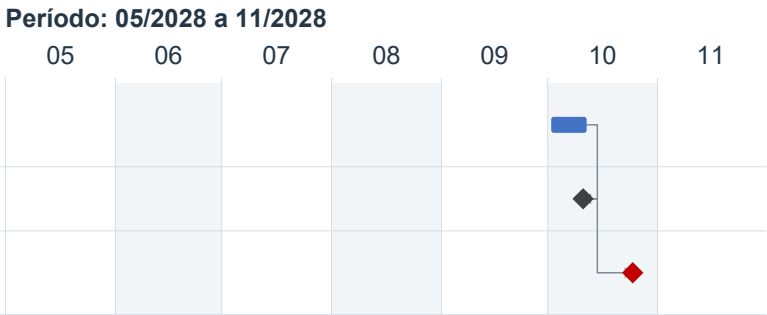

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.
Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.

Figura 7.31 (continuación 4 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

Gantt de implementación · tramo 7 de 7

Dependencias · ID de origen → ID de destino; tipo y desfase

CC: comienzo-comienzo; FC: fin-comienzo; FF: fin-fin; CF: comienzo-fin.

115 → 150 FC desfase 0
129 → 153 FC desfase 0
130 → 143 FC desfase 0
130 → 136 FC desfase 0
130 → 137 FC desfase 0
130 → 144 FC desfase 0
130 → 135 FC desfase -1
133 → 134 FC desfase -1
134 → 138 FC desfase 10
135 → 142 FC desfase 10
136 → 144 FC desfase 0
137 → 144 FC desfase 0
140 → 150 FC desfase 0
143 → 144 FC desfase 0
144 → 145 FC desfase -1
145 → 148 FC desfase 10
147 → 153 FC desfase 0
148 → 150 FC desfase 0
150 → 153 FC desfase 0
150 → 149 CC desfase 0
151 → 153 FC desfase 0
151 → 154 FC desfase -1
153 → 154 FC desfase -1
154 → 155 FC desfase 10

Los ID permiten seguir los vínculos entre láminas. Desfases en días hábiles.

Figura 7.31 (continuación 5 de 5). Carta Gantt resumida de las Etapas 1 y 2 con dependencias visibles, parte 7 de 7 (filas 134 a 155 de 155), con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración gráfica a partir de la programación en GanttProject y de (Formulario T-14).

La carta muestra los periodos fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) mes a mes: el mes 16 es mayo de 2028 y el mes 21, octubre de 2028. La marcha blanca de la Etapa 1 (4.2.1) comienza con el H6 el 1 de febrero de 2028, y la de la Etapa 2 (4.3.1), con el H11 el 1 de agosto de 2028; como anticipa la Tabla 7.6, esta última ocupa septiembre. Cada etapa pasa a producción el primer día hábil de su mes posterior a los tres días de cierre comercial y contable, habilitada por el acta de cierre de su marcha blanca: el 5 de mayo de 2028 la Etapa 1 y el 5 de octubre de 2028 la Etapa 2, que inicia también la Operación con ambos alcances (fechas válidas bajo el supuesto de inicio en febrero de 2027). Las actas de aceptación H7 y H12 se firman después del paso a producción y dentro de su mes contractual: el 29 de mayo y el 25 de octubre de 2028. El encaje del plazo de revisión del acta de cierre se comprueba en T-15, sección 5.5: las fechas de producción son objetivos condicionados a resolver ese procedimiento, y las holguras H7/H12 no prueban su cumplimiento. La estabilización 4.3.2 comienza con el paso a producción, el 5 de octubre, y se extiende hasta el 30 de noviembre; sus cuatro semanas reforzadas, del 26 de octubre al 22 de noviembre, siguen a la firma del acta H12, igual que el archivo final 9.1.2. La operación supervisada de la Etapa 2 con datos y usuarios reales durante la marcha blanca no sustituye el paso oficial a producción ni el acta H12.

Antes de cada paso a producción, el cronograma reserva las pruebas que exige el numeral 20.1 de las Bases Técnicas Transversales (p. 35): carga y estrés a 1,5 veces el peak, resiliencia, recuperación ante desastres con conmutación real, seguridad ofensiva y accesibilidad. Además, programa dos ensayos de migración antes de la migración definitiva. En la Etapa 1 estas pruebas forman la cuenta 3.8, se ejecutan en los meses 9 y 10 y se entregan antes del H5 del mes 12; en la Etapa 2 forman la cuenta 3.9, se ejecutan en los meses 16 y 17 y se entregan antes del H10 del mes 18 (Formulario T-15, sección 5.2).

7.3.3 Plan de implantación y puesta en marcha

El piloto de cadena de frío (4.1.4) dura seis semanas en cuatro camiones, dos rurales, uno urbano y uno de transportista, entre el 9 de noviembre y el 20 de diciembre de 2027, y debe aprobarse antes de la ola de reparto. Su tramo de diciembre no interviene los sistemas vigentes del CLIENTE, porque la solución aún no está en producción y los camiones conservan sus termógrafos actuales (Caso, cap. 10, restricción 8, p. 19). Los cuatro kits piloto se reciben antes del ensayo y los 28 kits de flota quedan instalados y recibidos antes de que comience la ola 3 (6.5.4).

La implantación sigue el principio que impone el caso: nada entra en producción sin haber convivido con la forma actual de trabajar, y nada se despliega como un único evento (Caso, sección 13.3, condiciones 1 y 3, p. 23). Técnicamente, cada capacidad se publica con un despliegue azul-verde y se habilita por sitio y por ola mediante indicadores de funcionalidad (feature flags), conforme al Capítulo 4, apartado 4.2.4.1.2. Así, cada ola puede revertirse sin reinstalar y cada operación tiene un único escritor autorizado (Capítulo 4, sección 4.1.8). Ningún despliegue ocurre en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00, que no admite indisponibilidad, ni en fechas de congelamiento (Caso, Capítulo 15, RT-10.05, p. 27).

La Etapa 1 entra en tres olas, en el orden de las dependencias de datos (Capítulo 3, sección

Alex

3.4.4). La Tabla 7.7 las presenta.

Tabla 7.7 Olas de implantación de la Etapa 1. Fuente: (Subdocumento 3, sección 3.4.4), y (Formulario T-18).

Ola	Procesos	Módulos	Avance	Registro oficial
1	Datos maestros y recepción con lote	M1	Por sitio	Recepciones y lotes
2	Inventario con FEFO y preparación nocturna	M2, M5	Por sitio	Stock y preparación
3	Preventa, rutas, reparto, devoluciones y rendición	M3, M4, M6, M8, M7	Por zona comercial	Pedidos, entregas y cobros

Una ola avanza a la siguiente cuando cumple su criterio durante cuatro semanas consecutivas a volumen real: sin defectos críticos ni altos, con conciliación diaria sin diferencias no explicadas, con los indicadores de disponibilidad y tiempo de respuesta cumplidos, con los usuarios certificados y con el acta de la Contraparte Técnica (Capítulo 3, sección 3.4.4).

La programación de olas usa fechas reales y no una equivalencia de meses a 13 semanas: todos los grupos deben estar operativos antes del inicio de los 28 días finales de marcha blanca. La sección 6.1 del Formulario T-18 propone Talca/Concepción/plataformas/remanentes en semanas 5/6/7/8 para la ola de reparto, subordinadas a fechas permitidas y al límite F − 28 días. Se permite superposición por dominios sin intervenir simultáneamente el mismo proceso ni doble escritura.



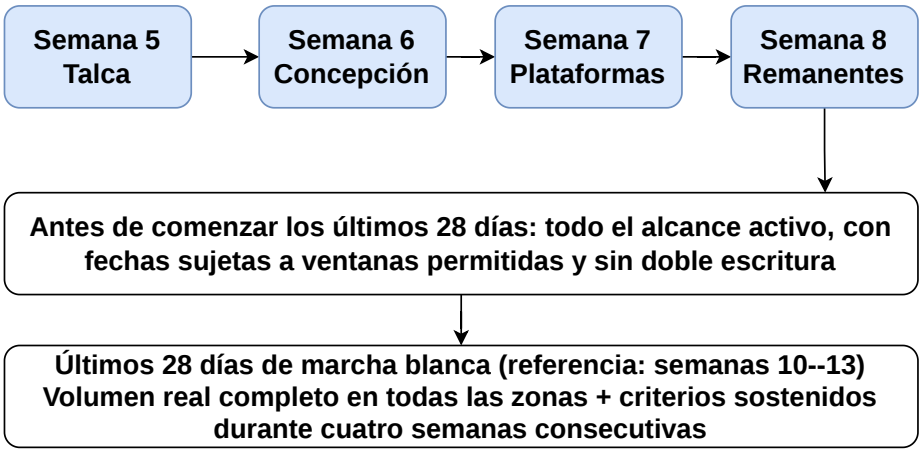


Figura 7.32 Despliegue de la ola 3 y período final de validación de la marcha blanca de la Etapa 1. Fuente: (Subdocumento 3, sección 3.4.4), y (Formulario T-18).

El avance de cada grupo exige su criterio y acompañamiento. Las cuatro semanas finales requieren todos los grupos y todo el volumen real, no una muestra. E2 habilita todas las cadenas del alcance, portales y costo de servir antes de F − 28 días y, en el ejemplo febrero 2027, antes de septiembre. La carga manual de pedidos mantiene contingencia auxiliar y no acredita intercambio electrónico ni permite excluir una cadena faltante.

La reversión tiene dos niveles, que la Tabla 7.8 distingue.

Tabla 7.8 Niveles de reversión. Fuente: (Subdocumento 3, sección 3.4.4); (Subdocumento 4, apartados 4.2.4.1.2 y 4.1.8); y (Formulario T-18).

Nivel	Qué hace	Activación y responsabilidad	Plazo
Técnico	Restitución automática de la entrega previa	Mecanismo automático; supervisión SRE	Objetivo: ≤10 minutos en Preproducción
Operacional, Etapa 1	Versión local probada, escritor único y DTE válidos	Operaciones del CLIENTE	Antes de las 05:30
Operacional, Etapa 2	Desactivación de la capacidad afectada de E2	Operaciones del CLIENTE	Fuera de 05:30–07:00

El objetivo técnico de hasta 10 minutos es una parte del ensayo de reversión; el objetivo total es de 40 minutos. La preparación de la contingencia operacional dispone de hasta 30 minutos en paralelo con la reversión técnica; la verificación y autorización de despacho dispone de hasta 10 minutos adicionales. Por tanto, el total se calcula como máx(10,30) + 10 = 40 minutos (Formulario T-18, sección 6.4). La decisión límite propuesta es a las 04:45 y la restauración operacional objetivo, a las 05:25, antes de las 05:30. El ensayo mide estos objetivos; la medición se realiza en Preproducción y fuera de la ventana de despacho. El papel sólo apoya las tareas auxiliares y no sustituye el despacho crítico. En E2, la desactivación afecta únicamente a la capacidad que falla y conserva la Etapa 1. Los cambios de indicadores de funcionalidad siguen su procedimiento autorizado, distinto del disparo técnico automático.

En el nivel técnico, el canario revierte automáticamente si el percentil 95 supera su umbral o si la entrega nueva registra más errores que la estable en la misma ventana de observación, conforme a SD4, «Liberación y reversión». SRE supervisa, valida y escala sin imponer una autorización manual al mecanismo automático. El ensayo registra señal, tiempos, tráfico restituido y conservación de transacciones. La reversión operacional se dispara con señales observables: pedidos sin sincronizar al inicio de la carga, rutas del día no disponibles o un defecto crítico en la ventana de despacho. El plazo de las 05:30 protege la salida de los 96 camiones y no es el tiempo de recuperación ante desastres. La Figura 7.33 presenta el procedimiento por rol.



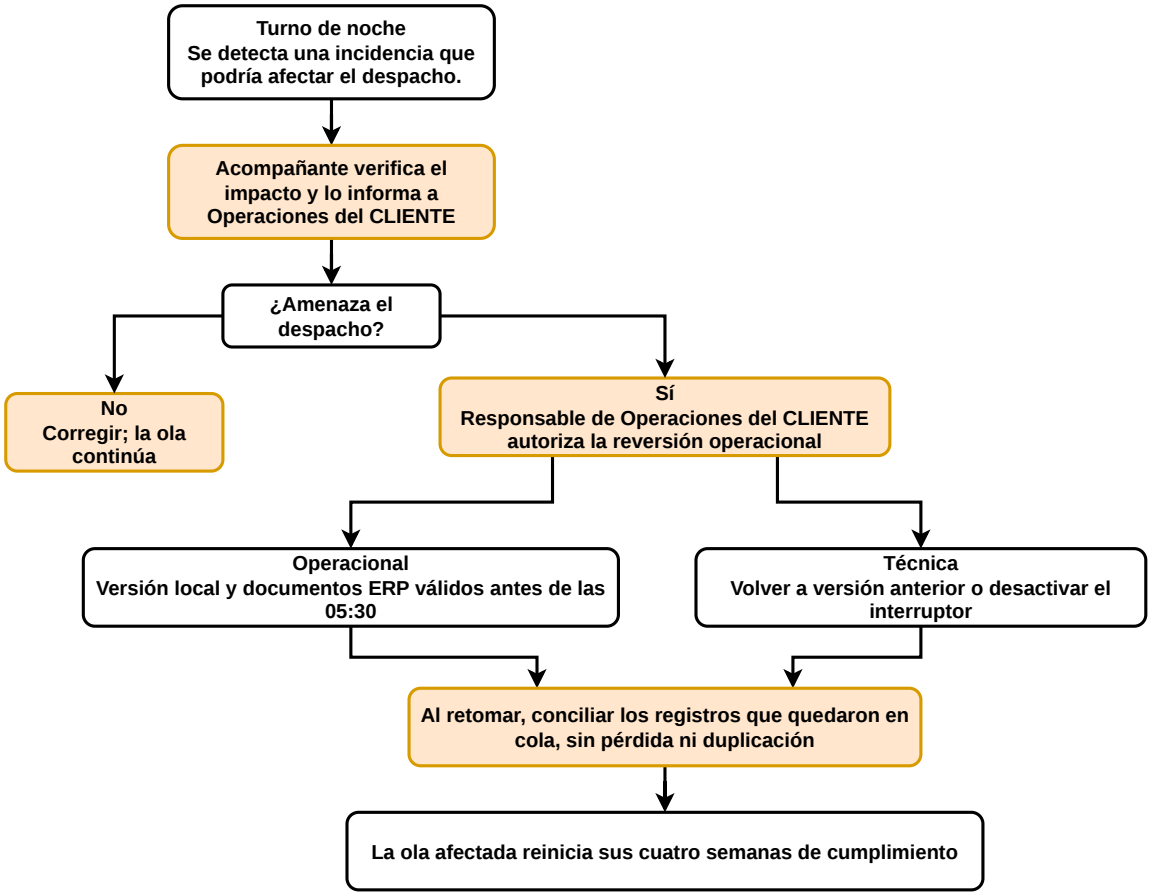


Figura 7.33 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 en la ventana de despacho. Fuente: (Formulario T-18).

La figura muestra que la decisión es del CLIENTE y se toma en el turno de noche, antes de que empiece el despacho. El ensayo debe comprobar que lo capturado permanece en cola y se concilia sin pérdida ni duplicación; no se presume por la descripción. Lo que se pierde es el avance de la ola, que reinicia su período de cuatro semanas (Caso, sección 17.6, punto 4, p. 33). La reversión se ensaya en Preproducción antes de cada corte (paquete 4.1.2), y en ese ensayo se mide el tiempo de cada nivel.

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1

La marcha blanca de la Etapa 1 son tres meses de operación supervisada con datos y usuarios reales, del mes 13 al 15. Convive con la operación vigente: en bodega, con la hoja de picking; en ruta, con la guía en papel; y en Talca, con el WMS de 2013 en solo lectura como respaldo de consulta. Cada día se concilian ambos registros, y toda diferencia se clasifica y explica antes del cierre del día (RT-20.03). La Tabla 7.9 presenta los indicadores que se miden y publican diariamente, con sus umbrales de cierre (RT-20.04).

Alex

Tabla 7.9 Indicadores diarios de la marcha blanca. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-09.01 y RT-10.05, pp. 26–27); y (Subdocumento 3, Tabla 3.5).

Indicador	Umbral	Condición Art. 17.3
Incidentes críticos y altos abiertos	0	1
Transacciones de la ola registradas en la solución	100 % del volumen real durante las 4 últimas semanas	2
Indisponibilidad en la ventana de 05:30 a 07:00	0 minutos	3
Disponibilidad de la transacción crítica	99,9 % o más	3
Tiempo de respuesta, percentil 95	Línea de preparación hasta 1 s; entrega hasta 2 s; línea de preventa hasta 1,5 s; stock y crédito hasta 2 s	3
Diferencias de conciliación sin explicar	0	4
Usuarios de la ola certificados	100 %	5

Los indicadores reproducen las condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) con umbrales que se pueden medir cada día, de modo que el cierre no depende de un juicio al final del período. El volumen comprometido es la operación real completa de cada proceso y no una muestra; con las cifras del caso (Caso, sección 14.1, p. 24), son cerca de 1.150 recepciones de proveedor y 260.000 líneas de preparación al mes, unos 31.000 pedidos al mes y alrededor de 1.400 entregas por día hábil, o 2.600 si las semanas de cierre coinciden con el peak de septiembre. El detalle por proceso está en el Formulario T-18, tabla de volúmenes reales de la sección 2.4.

La sexta condición del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) es el acta de la Contraparte Técnica. En la Etapa 1 es el acta de cierre de la marcha blanca, que la Contraparte firma tras completar la evidencia del mes 15 y que habilita el paso a producción del mes 16 (paquete 4.2.1); el H7 es el acta de aceptación posterior a ese paso. Si una condición no se cumple al término del mes 15, la marcha blanca se extiende a costo de LafroX, sin mover las fechas siguientes (BA, art. 17.3, p. 13). La Figura 7.34 resume el ciclo diario de control; las condiciones de cierre se enumeran debajo.

Alex




Figura 7.34 Ciclo diario de la marcha blanca. Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13) y (Bases Técnicas Transversales, RT-20.04, p. 35).

El ciclo de la Figura 7.34 se repite cada día: se miden los indicadores y se concilian los registros, se comparan los resultados con sus umbrales, se decide entre continuar, corregir o revertir y se publica el resultado diario. Si una incidencia amenaza de inmediato el despacho, se activa el procedimiento de reversión de la Figura 7.33 sin esperar la publicación diaria.

El cierre exige cumplir simultáneamente las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13):

1. Cero incidentes críticos o altos abiertos.
2. Volumen real completo durante las últimas cuatro semanas.
3. Sin indisponibilidad en despacho; disponibilidad y respuesta dentro de umbral.
4. Sin diferencias inexplicadas ni pedidos perdidos o duplicados.
5. 100 % de usuarios capacitados y certificados.
6. Acta de cierre de la marcha blanca firmada por la Contraparte Técnica (4.2.1), previa a producción; el acta de aceptación H7 es posterior.

Ninguna de estas condiciones compensa a otra.

La capacitación se hace en el puesto y en la ruta con las cuatro modalidades del artículo 90.2 de las Bases Administrativas (p. 45). Cada perfil se certifica antes del cierre, porque el artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13) exige que el personal del CLIENTE esté «capacitado y certificado conforme al plan de capacitación aprobado», y los usuarios administradores y el equipo técnico del CLIENTE se certifican además conforme al artículo 90.4 de las Bases Administrativas (p. 45). Los perfiles operativos, tomados del Capítulo 3, Anexo 3.I (Subdocumento 3, anexos), son hasta 180 preparadores, 120 en Talca y hasta 60 en Concepción (Capítulo 3, Anexo 3.C, S-39), con un tutor por turno y un aprendizaje en el puesto de dos horas como máximo; 62 preventistas, en su propia ruta; 84 integrantes de la tripulación propia, entre conductores y peonetas, de los cuales 42 son conductores; y cerca de 160 conductores de transportistas, que se incorporan en el andén al asignarse a una ruta.

La adopción se mide por perfil y por ola, y si una ola no alcanza la meta, no avanza y se extiende el acompañamiento. La respuesta es distinta según el grupo: el personal con veinte o treinta años en la compañía recibe acompañamiento individual y reconocimiento formal de su conocimiento, y el personal rotativo de preparación cuenta con un tutor por turno (Formulario T-18, secciones 2.7 y 2.8).

Alex

7.3.5 Marcha blanca de la Etapa 2 y convivencia

La marcha blanca de la Etapa 2 dura los meses 19 y 20 y convive con la Etapa 1 en producción. La regla central del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13) es que exista una única fuente de verdad para los datos compartidos: la Etapa 2 lee y extiende los pedidos, clientes, guías y entregas de la Etapa 1, sin copiarlos ni digitarlos de nuevo, y ningún despliegue de la Etapa 2 modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1 ni ocurre en la ventana de despacho.

La marcha blanca ocupa los meses 19 y 20. Todo el alcance de cadenas, portales y costo de servir debe estar habilitado antes de los últimos 28 días completos de evidencia; la conversión promedio de dos meses a semanas no fija una fecha contractual. Con el inicio supuesto de febrero de 2027, el mes 19 es agosto y el mes 20 es septiembre de 2028, de modo que toda habilitación ocurre en agosto, antes del congelamiento del 1 al 25 de septiembre. Las semanas de cierre se miden con el volumen del peak de Fiestas Patrias, cerca de 2.600 entregas diarias, en el primer septiembre de la Etapa 1 en producción. Durante el congelamiento se aplica continuidad previamente autorizada por el CLIENTE; la sección 6.4 del Formulario T-18 no presume que un cambio de configuración esté exento de las prohibiciones. La capacidad para ese peak se demuestra antes del H11 con la prueba de carga a 1,5 veces el peak, con ambas etapas activas (paquete 3.9.3; Formulario T-18, sección 3.1).

A los indicadores de la Tabla 7.9 se suman los propios del alcance de la Etapa 2: los pedidos de las cadenas certificadas recibidos por vía electrónica, los avisos de despacho dentro de dos minutos, las entregas con costo de servir calculado y la ausencia de degradación de los indicadores de la Etapa 1 (Formulario T-18, sección 3.3). La Figura 7.35 muestra cómo fluyen los datos entre ambas etapas.

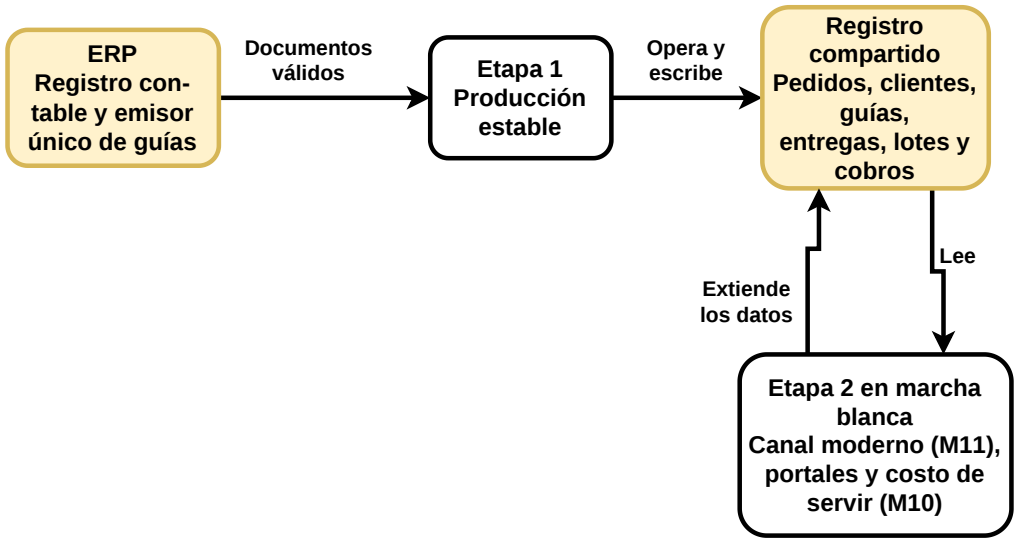


Figura 7.35 Convivencia de la Etapa 1 en producción con la Etapa 2 en marcha blanca. Fuente: (Subdocumento 4, arquitectura lógica).

Se mantiene una sola fuente de verdad y un escritor autorizado por dato. La Etapa 2 no duplica datos ni modifica las funciones estabilizadas de la Etapa 1. Lee el registro único y lo extiende con sus propios datos, de modo que no existe una doble digitación que conciliar. El ERP se mantiene como registro contable y único emisor de la guía de despacho para ambas etapas. El paso a producción del mes 21 es la aceptación final de la implementación (H12) y el inicio de la Operación con ambos alcances (BA, art. 17.2, punto 4, p. 13).

7.3.6 Estabilización y transferencia

Después de cada paso a producción hay una estabilización de cuatro semanas por ola, con atención reforzada y sin costo adicional (RT-20.06). La dotación se deriva de la operación del caso, como muestra la Tabla 7.10.

Tabla 7.10 Estabilización por ola. Fuente: (Subdocumento 3, sección 3.4.4).

Frente	Personas	Cálculo
Bodega, turno de noche	2	1 por centro de distribución
Plataformas de cross-docking	3	1 por plataforma
Calle	7	158 rutas diarias / 24 días de lunes a sábado ≈ 6,6

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Frente	Personas	Cálculo
Coordinación	1	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Las siete personas de calle permiten acompañar cada una de las 158 rutas diarias (96 camiones y 62 preventistas) al menos una vez en las cuatro semanas. Si la ola cubre una sola zona, la dotación se reduce en proporción a sus rutas, y la dotación decrece según la curva de adopción, como exige el RT-20.05.

La operación se transfiere al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE antes del mes 21, con procedimientos documentados y ensayados y con la base de conocimiento. Sigue una mentoría de seis meses (paquetes 7.1.4 y 8.5.2; RT-22.07). Quedan como servicio permanente de LafroX durante los 36 meses los que el Capítulo 3, sección 3.4.5, le asigna: el centro de operaciones, la mesa de servicio, la gestión de incidentes, la continuidad, la seguridad y el mantenimiento.

7.3.7 Momento de los resultados comprometidos

El Caso logística exige indicar en qué momento del cronograma se alcanza cada resultado de aceptación (Capítulo 18, p. 34). La Tabla 7.11 agrupa los dieciséis resultados por momento; el detalle por resultado está en el Anexo 7.C.

Tabla 7.11 Momento de los resultados de aceptación del caso. Fuente: (Bases Técnicas del caso, Capítulo 18, pp. 34–35); (Subdocumento 3, Anexo 3.J); y (Subdocumento 7, Anexo 7.C).

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Marcha blanca de la Etapa 1 (meses 13 a 15)	R18-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 y 16	12	H7 (mes 16)
Marcha blanca de la Etapa 2 (meses 19 y 20)	R18-11 y 13	2	H12 (mes 21)
Tramos durante el contrato	R18-04: OTIF de 90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y 95 % en el mes 32	1	Revisión mensual en comité

continúa en la página siguiente



Tabla 7.11 — continuación

Momento	Resultados	Cant.	Aceptación
Provisional y final	R18-12: provisional en la marcha blanca de la Etapa 1 y final tras 12 meses de operación	1	H7 y operación

Doce de los dieciséis resultados se aceptan en la marcha blanca de la Etapa 1. Otros dos también se verifican allí: R18-04, con su tramo del mes 15, y R18-12, de forma provisional. Son catorce resultados con verificaciones en ese período, conforme al Anexo 7.C y al Formulario T-18. Por eso el volumen real y la certificación de usuarios de ese período son la principal concentración de riesgo de aceptación del proyecto, y por eso el plan dedica a esa marcha blanca su mayor dotación de acompañamiento.

Las innovaciones también tienen su momento en el cronograma (BA, art. 29, punto 4, p. 19), como resume la Tabla 7.12.

Tabla 7.12 Innovaciones en el cronograma. Fuente: (Subdocumento 7, Anexo 7.D).

Innovación	Paquetes de la EDT	Meses	Hito
1 · Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	3.10.1.1 a 3.10.1.4	7 a 15	Límite contractual del H4, H5 y marcha blanca E1
2 · Reproducción de incidentes de terreno	3.10.2.1 a 3.10.2.4; 8.3.1	2 a 15; 21 a 56	H4 y marcha blanca E1
3 · Vida útil remanente por historia térmica del lote	3.10.3.1 a 3.10.3.4; 8.3.2	3 a 15; operación	Límite contractual del H4, H5 y marcha blanca E1
4 · Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	5.4.3; 8.3.3; 8.3.4	17 a 20; 21 a 23; 24 a 56	Hito mensual
5 · Hoja de negocio del almacenero	3.10.4.1 a 3.10.4.4; 8.3.5; 8.3.6	13 a 27	H9, H10 y H12

Tres innovaciones se validan en la marcha blanca de la Etapa 1. La innovación 5 sigue el calendario de la Etapa 2, y la innovación 4 empieza a liquidar recién desde el mes 24, después



de una línea base y tres liquidaciones en sombra. Así, ninguna innovación agrega trabajo a la cadena casi crítica de la Etapa 1 después del H4.

7.3.8 Base de planificación y recursos

El Formulario T-15, sección 4, estima las horas de los 227 paquetes con tres valores (optimista, más probable y pesimista) por clase de tamaño, y separa las curvas mensuales de implementación, soporte puente de la Etapa 1 y Operación. La cobertura del centro de operaciones, la mesa de servicio y el SOC sigue las posiciones dimensionadas en el Capítulo 4, Anexo 4-W.7 (Subdocumento 4, anexos). Con esa base, el total programado es de 220.023 HH (207.615 HH de paquetes y restauraciones previas a Operación, 9.336 HH de soporte puente de la Etapa 1 y 3.072 HH de reserva del frente de construcción y de calidad) y el máximo mensual es de 64 personas equivalentes en el mes 16, cuando el paso a producción de la Etapa 1 coincide con las pruebas de la Etapa 2. La sección 5 del mismo formulario calcula la red y el PERT sobre esa línea base, con feriados y revisiones del CLIENTE; la asignación nominal de personas se confirma antes del H1, y la curva expresa demanda, no disponibilidad acreditada. Las capacidades protegidas de la Etapa 1 no se prestan al desarrollo de la Etapa 2.


La gestión del plan sigue el Capítulo 6: la sección 6.1 fija el PMBOK adaptado, el tablero Kanban, el valor ganado y el control de cambios, y la sección 6.2 fija el proceso RUP iterativo con DevSecOps. La Construcción avanza en las iteraciones definidas en la sección 6.2, con revisión semanal de avance y bloqueos y una demostración de incremento verificable al cierre de cada iteración; una demostración no implica un paso a producción. El Jefe de Proyecto registra la capacidad y los criterios de terminado antes de seleccionar el trabajo de cada iteración, y los cambios se aprueban según la sección 6.1.4.

El cronograma rector usa meses contractuales 1 a 56. El Anexo 7.A traduce esos meses a fechas con un inicio supuesto en febrero de 2027; cuando el CLIENTE confirme la fecha de inicio (consulta V-12), se recalculan los meses calendario y los congelamientos antes de aprobar cada corte. La revisión de parámetros de la Innovación 3 (paquete 8.3.2) se ejecuta en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56.

El Formulario T-18, sección 6, define la cobertura por ola de M9, M12 y M10, propone Talca como sitio piloto, ordena las olas por sitio, por rutas y por certificación de cadenas, declara la estabilización de la Etapa 2 y el soporte de la Etapa 1 en los meses 16 a 20, y fija un objetivo de 40 minutos para el ensayo de reversión. El corte exige un ensayo con volumen real y la contingencia tributaria; el respaldo manual por sí solo no sustituye ese ensayo para los 96 despachos. El WMS queda en modo de solo lectura conforme al supuesto S-14.

El Anexo 7.F traslada al Capítulo 8 los supuestos, disparadores, responsables y paquetes de la planificación. La prueba de precio verifica que se conserve el acordado al capturar el pedido (Subdocumento 2, Anexo 2.2, S-09; RF-03.11 y RF-03.12). La coordinación de reserva y retención se verifica antes del H4 con AL-STOCK-01 y AL-ACT-01; los paquetes 3.8.4 y 3.9.3 comprueban carga y drenaje.

El Formulario T-18, sección 6.5, especifica las condiciones técnicas de estas verificaciones y sus referencias al Subdocumento 4. La recuperación se demuestra con AL-DR-01 antes del



H5 y del H10 y, después, dos veces al año durante la Operación (Bases Técnicas Transversales, cap. 7, RT-07.07, p. 17). El calendario y la asignación del equipo de cada campaña se completan conforme al programa de pruebas, sin alterar sus criterios de aceptación.



Referencias

Las fuentes citadas en este subdocumento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla siguiente presenta la declaración de uso de inteligencia artificial. La última columna identifica a la persona responsable y los aspectos revisados en cada sección.

La Tabla 7.13 presenta declaración de uso de IA.



Tabla 7.13 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración a partir de registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Code	Síntesis de las Bases y los capítulos de la oferta	Alto	Ninguno	Leandro Chamorro: contrastó el alcance y las referencias a los capítulos con las Bases y la oferta.
7.1 EDT	Claude Code; Codex	Redacción, conteos y ajuste de las figuras de la EDT	Alto	Medio	Leandro Chamorro: comprobó la jerarquía, los conteos y la correspondencia entre paquetes y figuras.
7.2 Plan de trabajo	Claude Code; Codex	Secuenciamiento, dependencias y frentes de trabajo	Alto	Medio	Leandro Chamorro: revisó el orden de actividades, sus dependencias y la coherencia de los frentes.
7.3 Cronograma e implantación	Claude Code; Codex	Calendario, Gantt, CPM/PERT y esquemas de implantación	Alto	Medio	Leandro Chamorro: verificó hitos, duraciones y ruta crítica frente al Gantt y las etapas de implantación.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.13 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexos 7.A a 7.F	Claude Code; Codex	Calendario contractual, dependencias, aceptación, innovaciones, trazabilidad y supuestos de riesgos	Alto	Ninguno	Tomás Pérez: revisó la correspondencia de los seis anexos con la EDT, el calendario, los hitos y las dependencias declaradas.
Formulario T-14	Claude Code; Codex	Diccionario de la EDT, ventanas y cartas Gantt	Alto	Medio	Patricio Henríquez: cotejó paquetes y criterios del diccionario con sus ventanas y la carta Gantt.
Formulario T-15	Claude Code; Codex	HH, nivelación, actividades de 8 a 80 horas, PERT y frentes	Alto	Medio	Maximiliano Miño: revisó las estimaciones de HH, la nivelación, las actividades, el PERT y los frentes de trabajo.
Formulario T-18	Claude Code; Codex	Plan de olas, marcha blanca, estabilización y reversión	Alto	Medio	Leandro Chamorro: contrastó las olas y los criterios de marcha blanca, estabilización y reversión con el cronograma.
