
Gantt de implementación · tramo 1 de 7

Lámina 1 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
1	RC | 5.1.4 Especificación y compra del sistema de cadena de frío	01/02/27	31/03/27
2	PT/H | 7 elementos: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.9.1, 1.9.2	01/02/27	09/02/27
3	PT/H | 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	01/02/27	09/02/27
4	PT/H | 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas	01/02/27	30/04/27
5	PT/H | 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero	01/02/27	09/02/27
6	PT/H | 5 elementos: 1.3.5, 1.6.2, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.6	01/02/27	29/09/28

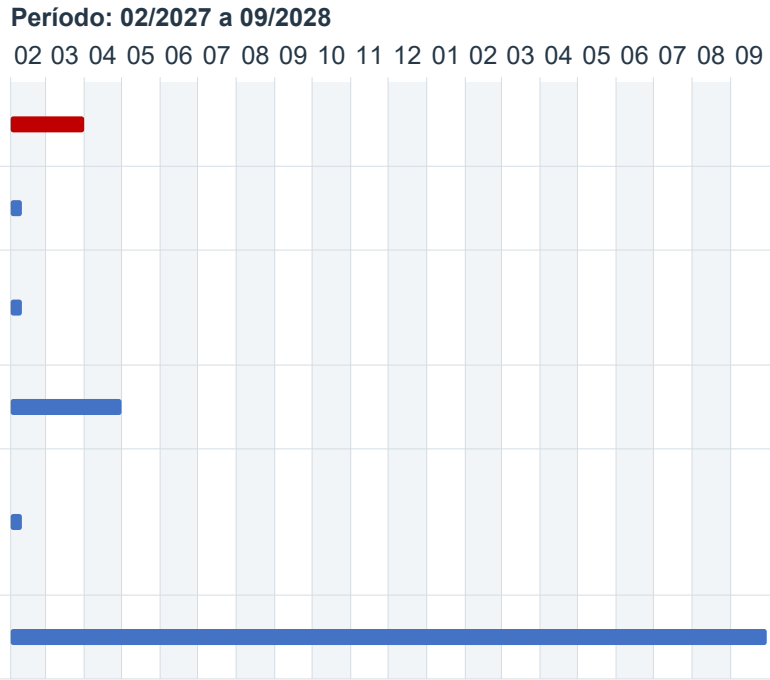

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.

Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.
