
Gantt de implementación · tramo 6 de 7

Lámina 3 de 4 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Paquete o hito	Inicio	Fin
125	RC | 4 elementos: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	15/03/28	28/04/28
126	PT/H | 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación	03/04/28	11/04/28
127	PT/H | 3.10.4.3 Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)	03/04/28	09/06/28
128	PT/H | 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad	03/04/28	31/10/28
129	PT/H | 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE	03/04/28	29/09/28
130	PT/H | 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)	02/05/28	18/05/28

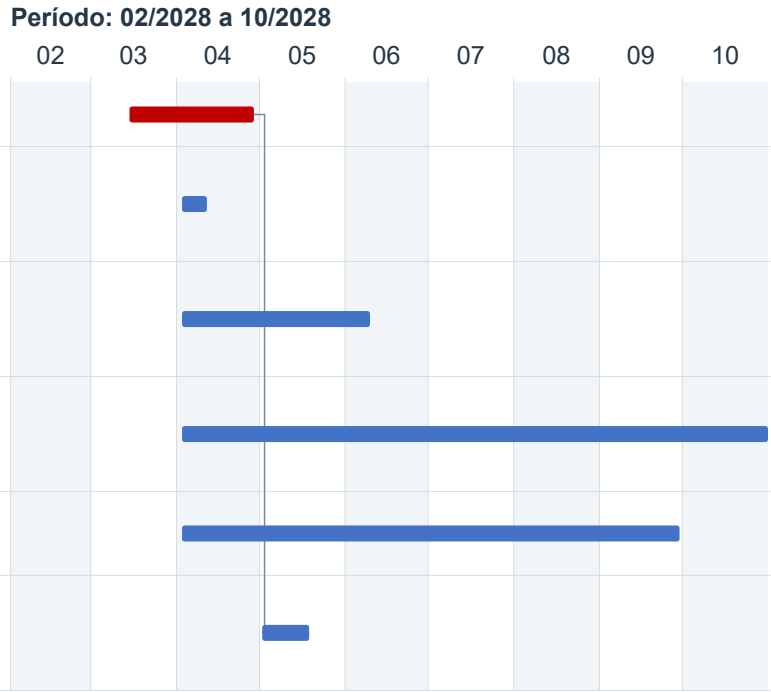

RC: ruta crítica marcada en la fuente. PT/H: demás paquetes e hitos.

Barras: fechas fuente. Conectores fuera de lámina: consultar relaciones por ID.
